

ОТЧЕТ
об экспертно-аналитическом мероприятии
«Аудит соблюдения требований законодательства
о контрактной системе в сфере закупок заказчиками
Приморского края при применении штрафных санкций
в ходе исполнения контрактов (выборочно) на создание
дополнительных мест для детей в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования»
за 2021 год и истекший период 2022 года»
(утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Приморского края,
протокол от 30.11.2022 № 23)

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 1.19 Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2022 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края от 29.11.2021 № 36-П, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края от 21.06.2022 № 21 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия в министерстве образования Приморского края, министерстве строительства Приморского края и муниципальных образованиях Приморского края (по отдельному списку)».

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: средства бюджета Приморского края, использованные на осуществление закупок по созданию дополнительных мест для детей в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

3. Цель экспертно-аналитического мероприятия:
провести анализ и оценить результаты закупок на соблюдение принципа ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок, установленных статьей 12 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Объекты экспертно-аналитического мероприятия:

министерство образования Приморского края,
министерство строительства Приморского края,
муниципальные образования Приморского края:
Администрация Владивостокского городского округа;
Администрация Артемовского городского округа;
Администрация Надеждинского муниципального района;
Администрация Шкотовского муниципального района;
Администрация Чугуевского муниципального округа.

5. Исследуемый период: 2021 год и истекший период 2022 года.

6. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 21.06.2022 по 30.11.2022, в том числе с выездом на объекты: 20.10.2022 в

«Детский сад на 120 мест по адресу с. Чугуевка, ул. Школьная»; 26.10.2022 в г. Артем «Детский сад на 230 мест, ул. Кирова 99», «Детский сад-ясли на 152 места с. Вольно-Надеждинское» и «Детский сад № 31» на 120 мест п. Новый», «Детский сад на 150 мест в п. Новонежино Шкотовского МР», 02.11.2022 в «ДОУ на 240 мест в районе б. Патрокл № 1», «ДОУ на 240 мест в районе б. Патрокл № 2», «Детский сад по ул. Крыгина д. 84» г. Владивостока.

7. Результаты экспертно-аналитического мероприятия.

7.1 Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих цели, условия, порядок предоставления и расходования субсидий, выделяемых из краевого бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

Постановлением Администрации Приморского края от 16.12.2019 № 848-па утверждена государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы (далее – ГП «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы), в состав которой включена подпрограмма № 6 «Реализация национальных проектов «Демография» и «Образование» (далее – подпрограмма № 6).

Реализация подпрограммы № 6 обеспечивается ответственным исполнителем – министерством образования Приморского края, министерство строительства Приморского края является соисполнителем подпрограммы № 6.

Одним из основных приоритетных направлений в развитии дошкольного образования до 2027 года, предусмотренных ГП «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы, является увеличение доступности дошкольного образования для детей, ликвидация очереди на получение мест в дошкольных организациях через комплексное развитие сети образовательных организаций путем: строительства новых детских садов, реконструкции и капитального ремонта имеющихся в Приморском крае, открытия негосударственных, семейных детских садов.

Механизм реализации подпрограммы № 6 осуществляется, в том числе посредством предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (пункт 5.7 раздела V ГП «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы).

Цели, условия предоставления и расходования субсидий предусмотрены Порядком предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по

образовательным программам дошкольного воспитания – Приложение № 12.1 к ГП «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы (далее – Порядок).

Пунктом 6.7. Приложения № 6 ГП «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы в рамках мероприятия № 6.7 Основное мероприятие «Федеральный проект «Содействие занятости» подпрограммы № 6 (с изменениями от 25.05.2022), предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного воспитания за счет средств федерального бюджета на 2021 год в сумме 1 085 533,80 тыс. рублей, на 2022 год – 305 235,47 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета на 2021 год – 824 522,11 тыс. рублей, на 2022 год – 293 142,27 тыс. рублей.

Согласно пункту 8 Порядка предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключенного между министерством образования Приморского края (министерством строительства Приморского края по вновь начинаемым объектам строительства) и муниципальным образованием в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной министерством финансов Российской Федерации (далее – соглашение). Так, в проверяемом периоде с муниципальными образованиями заключены соглашения, указанные в таблице.

Наименование муниципального образования	Наименование объекта	Реквизиты Соглашений, заключенных с Министерством образования Приморского края			
		2021	Распределено (тыс. рублей)/ КБ/МБ	2022	Распределено (тыс. рублей)/ КБ/МБ
1. Администрация Владивостокского ГО	Объект капитального строительства ДОУ на 240 мест в районе б. Патрокл № 1	1. Дополнительное соглашение от 23.12.2021 № 05701000-1-2019-012/5 (основное соглашение от 14.11.2019 № 05701000-1-2019-012)	0,00 тыс. рублей/0,00 тыс. рублей;	Не заключались	0,00
		2. Дополнительное соглашение от 23.12.2021 № 5/4стрд (основное соглашение от 15.01.2021 № 4стрд)	280 927,93 тыс. рублей/2 837,65 тыс. рублей		
	Объект капитального строительства ДОУ на 240 мест в районе б. Патрокл № 2	1. Дополнительное соглашение от 23.12.2021 № 05701000-1-2019-012/5 (основное соглашение от 14.11.2019 № 05701000-1-2019-012)	0,00 тыс. рублей/0,00 тыс. рублей;		
		2. Дополнительное соглашение от 15.03.2021 № 4ИМБТ/2	43 600,91 тыс.		
	Объект капитального строительства Детский сад по ул. Крыгина, д. 84, на 120 мест	1. Дополнительное соглашение от 10.08.2021 № 4ИМБТ/1 (основное соглашение от 15.03.2021 № 4ИМБТ)	81 219,49 тыс. рублей/820,40 тыс. рублей;	Дополнительное соглашение от 15.03.2022 № 4ИМБТ/2	25 789,62 тыс. рублей/260,50 тыс. рублей
		2. Дополнительное соглашение от 15.03.2021 № 4ИМБТ	43 600,91 тыс.		

		соглашение от 12.07.2021 № 05701000-1-2019-009/2 (основное соглашение от 07.10.2019 № 05701000-1-2019-09)	рублей/52,38 тыс. рублей		
	Детский сад № 5 на 240 мест «Снеговая Падь»	1.Дополнительное соглашение от 14.12.2020 № 12/СМР-П (основное соглашение от 06.08.2018 1-П)	118 358,60 тыс. рублей/1 195,54 тыс. рублей	Дополнительное соглашение от 11.02.2022 № 4коп/4	28 823,29 тыс. рублей/291,14 тыс. рублей
		2.Дополнительное соглашение от 11.02.2022 № 4коп/4 (основное соглашение от 16.08.2021 № 4коп)	145 889,46 тыс. рублей/1 473,63 тыс. рублей		
2. Администрация Артемовского городского округа	Объект капитального строительства Детский сад на 230 мест ул. Кирова, 99	Соглашение от 13.11.2020 № 05705000-1-2019-005, доп. соглашение от 07.12.2020 № 05705000-1-2019-005/1, доп. соглашение от 29.01.2021 № 05705000-1-2019-005/2	253 303,34	соглашение от 17.03.2022 № 2 СТР.Д	20 860,40/168,23
3. Администрация Надеждинского муниципального района	Объект капитального строительства «Детский сад-ясли на 152 места с. Вольно-Надеждинское»	1. Соглашение от 14.04.2020 № 20СТР на 2020 год; Дополнительное соглашение от 20.05.2020 № 20 стр/1 к соглашению от 14.04.2020 № 20СТР, 2. Соглашение от 02.02.2021 № 05623000-1-2019-006; Дополнительное соглашение от 20.04.2021 № 05623000-1-2019-006/1 к соглашению от 02.02.2021 № 05623000-1-2019-006; 3. Соглашение от 25.03.2021 № 20СТДР	139 461,26/94,22	дополнительное соглашение от 30.03.2022 № 20СТДР/1 к соглашению на 2021-2022 годы от 25.03.2021 № 20СТР	98 96,63/79,81
	Реконструкция МКДОУ «Детский сад № 31» на 120 мест п. Новый	1. Соглашение от 14.04.2020 на 2020 год № 20СТР Дополнительное соглашение от 20.05.2020 № 20 стр/1 к соглашению от 14.04.2020 № 20СТР, 2. Соглашение от 25.03.2021 № 20СТРД на 2021; Дополнительное соглашение от	13227,15731/322,39342	0	0

		30.03.2021 № 20СТРД/1 к Соглашению от 25.03.2021 № 20СТРД			
4. Администрация Шкотовского муниципального района	Детский сад на 150 мест в п. Новонежино Шкотовского МР	1. Соглашение от 02.02.2021 № 05657000-102019-010	131 338,47/131,47	0	0
		2. Соглашение от 06.12.2021 № 33-СТРД	15 000,00/151,51	0	0
5. Администрация Чугуевского муниципального округа	Детский сад на 120 мест по адресу с. Чугуевка, ул. Школьная	1. Соглашение от 27.01.2021 № 05555000-1-2019-005	150 466,69/15,05	1.1 Доп. Соглашение от 30.03.2022	4 381,49/22,02
		2. Соглашение от 04.03.2021 № 32 СТРД на 2021 год	19 486,992/157,15	№ СТРД/1 к соглашению от 04.03.2021 № 32 СТРД	
Артемовский ГО	Объект капитального строительства «Детский сад на 230 мест г. Артем п. Угловое, мкр. Глобус»	Реквизиты Соглашений, заключенных с Министерством строительства Приморского края			
		Соглашение от 11.08.2021 № 05705000-13-1-2019-007, доп. соглашение от 24.12.2021 № 05705000-1-2019-007/1, соглашение от 02.12.2021 № 0701-3	70000,00/564,516	Соглашение от 19.01.2022 № 0701-1, доп. соглашение от 07.02.2022 № 0701-1/1, доп. соглашение от 28.03.2022 № 0701-1/2	231967,33383/187 0,70431

7. 2. Анализ объема субсидий, выделенного из краевого бюджета и предоставленного бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

Согласно пункту 5 Порядка субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству образования Приморского края (далее – министерство) (код ГРБС 759) и министерству строительства Приморского края (код ГРБС 775) на указанные цели.

Анализ финансирования на создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, произведен на основе данных, предоставленных министерством образования Приморского края, министерством строительства Приморского края, администрациями муниципальных образований: Владивостокского ГО, Артемовского ГО, Надеждинского МР, Чугуевского МО, Шкотовского МР.

Анализ объема субсидии приведен в таблице.

Наименование муниципального образования Приморского края	Наименование объекта	Объем субсидий, предоставленный из краевого бюджета (тыс. рублей)		Объем субсидий, предоставленный из местного бюджета (тыс. руб.)		Всего субсидий (тыс. рублей)		Освоено средств краевого бюджета (тыс. рублей)	Освоено средств местного бюджета (тыс. рублей)	Всего освоено средств (тыс. рублей)
		2021	2022	2021	2022	2021	2022			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Артемовский ГО	Объект капитального строительства «Детский сад на 230 мест ул. Кирова 99»	253 262,82	20 860,40	40,52	168,23	253 303,34	21 028,63	267 674,42	206,09	267 880,51 (- 6,242,71) – что составляет 97,65 % от суммы предоставленных средств (274 331,97 тыс. рублей)
	Объект капитального строительства «Детский сад на 230 мест г. Артем п. Угловое, мкр. Глобус»	70 000,00	231 967,33	8 218,30	1 870,70	78 218,30	233 838,04	175 656,38	9 866,81	185 523,19 (100 %)
ИТОГО		323 262,82	252 827,73	8 258,82	2 038,93	331 521,64	254 866,67	443 330,80	10 072,90	453 403,70
2. Владивостокский ГО	Объект капитального строительства ДОУ на 240 мест в районе б. Патрокл №1	280 927,93	0,00	2 837,65	0,00	283 765,58	0,00	280 657,59	2 834,93	283 492,52 (-273,06) – что составляет 99,9 % от суммы предоставленных средств (283 765,58 тыс. рублей)
	Объект капитального строительства ДОУ на 240 мест районе б. Патрокл № 2	107 668,12	0,00	1 716,00	0,00	109 384,11	0,00	107 668,12	1 716,00	109 384,11 (100 %)
	Объект капитального строительства Детский сад по ул. Крыгина, д. 84.	124 820,40	25 789,62	4 091,96	8 089,68	162 791,66	33 879,30	110 554,61	3 523,13	114 077,74 (-82 593,22) что составляет 58 % от суммы предоставленных средств (196 670,96 тыс. рублей)
	Детский сад № 5 на 240 мест «Снеговая Падь»	264 248,06	28 823,29	15 524,99	3 231,79	311 828,13	32 055,08	293 071,35	18 737,15	311 808,50 (-32 074,71) что составляет 90,67 % от суммы предоставленных средств (343 883,21 тыс. рублей)
	ИТОГО	777 664,51	54 612,91	24 170,6	11 321,47	867 769,48	65 934,38	791 951,67	26 811,21	818 762,87
3. Надеждинский МР	Объект капитального строительства «Детский сад-ясли на 152 мест с. Вольно-	139 461,26	9 896,63	94,22	79,81	139 555,48	9 976,44	149 357,89	174,03	149 531,92 (100 %)

	Надеждинское» Реконструкция МКДОУ «Детский сад № 31» на 120 мест п. Новый	13 227,16	-	322,39	0	13 549,55	-	13 227,16	322,39	13 549,55 (100 %)
ИТОГО		152 688,42	9 896,63	416,61	79,81	153 105,03	9 976,44	162 585,05	496,45	163 081,47
4. Чугуев - ский МО	Детский сад на 120 мест по адресу с. Чугуевка, ул. Школьная	169 933,68	4 381,49	172,20	22,02	170 105,88	4 403,51	173 392,02	189,56	173 581,60 (-927,79 тыс. рублей) что составляет 99,47 % от суммы предоставле нных средств (174 509,39 тыс.рублей)
ИТОГО		169 933,68	4 381,49	172,20	22,02	170 105,88	4 403,51	173 392,02	189,56	173 581,60
5. Шкотов- ский МР	Детский сад на 150 мест в п. Новонежино Шкотовского МР	145 294,94	-	272,44	-	145 567,38	-	145 294,94	272,44	145 567,38 (100 %)
ИТОГО		145 294,94	-	272,44	-	145 567,38	-	145 294,94	272,44	145 567,38
ВСЕГО		1 568 844,37	321 718,76	33 290,67	13 462,23	1 668 069,41	335 181,00	1 716 554,48	37 842,56	1 754 397,02

За 2021-2022 годы из краевого бюджета перечислены субсидии муниципальным образованиям на указанные цели в сумме 1 890 563,13 тыс. рублей (2021 год – 1 568 844,37 тыс. рублей, 2022 год – 321 718,76 тыс. рублей), из них освоено 1 716 554,48 тыс. рублей, или 90,8 % от объема предоставленных субсидий (1 890 563,13 тыс. рублей).

7.3. Анализ и оценка эффективности, результативности и применения обеспечительных мер и мер ответственности по контрактам и их влияние на достижение целей осуществления закупки.

7.3.1 Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования за счет субсидий, выделяемых из краевого бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края.

Как установлено в ходе проведения мероприятия, введены в эксплуатацию:

1. Детский сад на 120 мест по адресу: Приморский край с. Чугуевка, ул. Школьная, согласно разрешению на ввод в эксплуатацию объекта № 25-702000-12-2021 30.12.2021.



Здание МБДОУ № 1 с. Чугуевка



Детская площадка

Фотографии сделаны сотрудниками Контрольно-счетной палаты
Приморского края 20.10.2022

2022-2023 учебный год в МБДОУ № 1 с. Чугуевка начат с 01.01.2022 (приказ МБДОУ № 1 с. Чугуевка от 01.09.2022 № 42-А), скомплектовано 5 групп численностью 84 человека.

2. Детский сад на 230 мест по адресу: г. Артем ул. Кирова, 99, согласно разрешению на ввод объекта в эксплуатацию № RU25-302-039-2021 30.12.2021.



Здание
МБДОУ «Детский сад № 8»



Детская площадка

Фотографии сделаны сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края 26.10.2022

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Звездочка» Артемовского городского округа (далее – МБДОУ «Детский сад № 8») создано 20.05.2022 (постановление администрации Артемовского городского округа Приморского края от 20.05.2021 № 607-па). Заведующим МБДОУ «Детский сад № 8» утверждено 12 групп численностью 231 человек.

3. Детский сад на 150 мест в п. Новонежино Шкотовского муниципального района Приморского края, 29.12.2021 согласно разрешению на ввод в эксплуатацию объекта № RU25521301-03-2021.



Здание МБДОУ «Детский сад № 4 «Березка»



Детская площадка

Фотографии сделаны сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края 26.10.2022

Деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Березка» (далее – МБДОУ

«Детский сад № 4 «Березка») пос. Новонежино Шкотовского муниципального района осуществляется с 10.02.2022 (приказ муниципального казенного учреждения «Управление образованием» Шкотовского муниципального района Приморского края от 13.01.2022 № 9/1). На 01.11.2022 численность воспитанников МБДОУ «Детский сад № 4 «Березка» составляет 93 человека и состоит из 6 групп.

4. Детский сад-ясли на 152 места в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района, согласно разрешению на ввод в эксплуатацию 15.02.2022.



Здание детского сада



Здание детского сада



Здание детского сада



Игровая площадка

Фотографии сделаны сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края 26.10.2022

Распоряжением администрации Надеждинского муниципального района от 05.04.2022 № 781-р нежилое здание детского сада-ясли в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района закреплено на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида № 19 п. Новый Надеждинского района» (далее – МБДОУ Детский сад № 19).

Приказом МБДОУ Детский сад № 19 от 28.04.2022 № 39-да предписано открыть с 01.06.2022 новое здание, расположенное по адресу: Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Анисимова, д. 90 б, общая списочная численность воспитанников, посещающих данное учреждение, по состоянию на 30.09.2022 – 139 детей (учреждение рассчитано на 152 места).

5. Детский сад общеразвивающего вида на 120 мест № 31 п. Новый Надеждинского района, ул. Молодежная, д. 12 (реконструкция), согласно разрешению на эксплуатацию № 25-50-98-2022 14.01.2022.



Здание детского сада



Здание детского сада



Здание детского сада



Игровые площадки

Фотографии сделаны сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края 26.10.2022

Согласно представленным в рамках проверки приказам «О зачислении на обучение по образовательным программам дошкольного образования» МБДОУ «Детский сад № 31», изданных в период с 14.03.2022 по 27.09.2022, данное учреждение посещают 118 детей (рассчитано на 120 мест).

6. Детский сад № 2 в жилом районе Патрокл в г. Владивостоке, расположенный по адресу г. Владивосток ул. Сочинская, 14, согласно разрешению на ввод объекта в эксплуатацию № 25-RU25304000-30-2021 30.04.2021.



Информационная табличка



Центральный вход

Фото сделаны сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края 02.11.2022

7. Детский сад № 1 в жилом районе Патрокл в г. Владивостоке, расположенный по адресу г. Владивосток, ул. Архангельская, 25, согласно разрешению на ввод объекта в эксплуатацию № 25-RU25304000-112-2021 30.12.2021.



Здание детского сада



Здание детского сада

Фото сделаны сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края 02.11.2022

Постановлением администрации г. Владивостока от 10.06.2021 № 2328 создано муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 167 г. Владивостока» путем объединения двух объектов капитального строительства «ДОУ на 240 мест в районе б. Патрокл № 1» и «ДОУ на 240 мест в районе б. Патрокл № 2». Место нахождения учреждения: 690080, г. Владивосток, ул. Сочинская, 14. Согласно пункту 1.5 Устава МБДОУ «Детский сад № 167» учреждение имеет в своем составе структурное подразделение на 240 мест, расположенное по адресу: 690080 г. Владивосток, ул. Архангельская, 25.

8. Детский сад по ул. Крыгина, д. 84 в г. Владивостоке, на 120 мест, согласно разрешению на ввод объекта в эксплуатацию № 25-RU25304000-55-2022 25.08.2022.



Здание детского сада



Беседка



Игровая площадка

Фото сделаны сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края 02.11.2022

По состоянию на 02.11.2022 в рамках выездного мероприятия сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края совместно с представителями администрации Владивостокского городского округа установлено, что несмотря на разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада по ул. Крыгина, д. 84 в г. Владивостоке, на 120 мест, и наличие акта приемки законченного строительства № 1 от 24.08.2022 (форма № КС-11), подписанного представителями исполнителя работ ООО «Транстрой» и директором МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа», строительные работы на объекте не прекращены, работниками подрядной организации ООО «Транстрой» выполняются строительные работы: в здании детского сада в некоторых помещениях частично демонтирован потолок, осуществляются работы по замене оконной рамы, монтажу двери кухонного лифта, а также демонтажу и замене плитки в помещении прачечной и т.д. Новое оборудование, находящееся в помещениях детского сада, не защищено от попадания пыли и мелкого строительного мусора.

На прилегающей территории находятся складированные строительные материалы и строительный мусор, фасадное покрытие здания детского сада с видимыми дефектами, частично демонтирован пол в уличных беседках, не обустроены пешеходные дорожки, а также выход с территории детского сада с западной стороны.

Фактически детский сад не эксплуатируется, приказ уполномоченного органа местного самоуправления о начале функционирования учреждения (по завершении строительства), штатное расписание, список детей, посещающих данное учреждения, приказы об организации деятельности учреждения соответственно не были предоставлены.



Строительный материал на территории



Дефекты полового покрытия в беседке



Помещения детского сада



Фасадное покрытие здания детского сада



Территория детского сада

Фотографии сделаны сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края
02.11.2022

Таким образом, в ходе мероприятия установлено, что введены в эксплуатацию объекты капитального строительства, позволяющие принять 1372 ребенка, то есть результат использования субсидий достигнут.

7.3.2. Анализ и оценка результатов закупок на соблюдение принципа ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок, установленных статьей 12 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В ходе проведения анализа закупок использована информация и документы, предоставленные по запросам Контрольно-счетной палаты Приморского края объектами мероприятия, а также использована информация официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт, ЕИС).

В статье 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) определено, что исполнение контракта представляет собой комплекс мер, в том числе приемку товара (работ, услуг), проведение экспертизы, оплату товара (работ, услуг), применение мер ответственности и совершение иных действий в случае нарушения одной из сторон условий контракта.

В рамках аудита в сфере закупок проведена проверка 83 исполненных контрактов на сумму 1 466 128,29 тыс. рублей. Количество контрактов с нарушениями – 49, на сумму 303 537,41 тыс. рублей. Общее количество нарушений законодательства о контрактной системе – 86 (процедурные нарушения).

При проведении анализа и оценки эффективности, результативности и применения обеспечительных мер и мер ответственности по контрактам и их влияние на достижение целей осуществления закупки установлено, что в проверяемом периоде Заказчиками осуществлено 29 случаев применения мер ответственности (пени и штрафов) в отношении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, на общую сумму 10 461,96 тыс. рублей.

По результатам предъявленных Заказчиками требований об уплате неустоек поставщиками (подрядчиками, исполнителями) было оплачено 3 125,88 тыс. рублей (29,88 %).

В ходе выборочной проверки контрактов установлено, следующее.

I. Объект капитального строительства «Детский сад на 120 мест по адресу: Приморский край, с. Чугуевка, ул. Школьная» (Администрация Чугуевского муниципального округа (далее – Учреждение, Заказчик))

1. Контракт от 12.05.2020 № 0120300016620000066_88488 (реестровый номер контракта 3253400004020000059) на выполнение работ по строительству объекта «Детский сад на 120 мест по адресу: Приморский край, с. Чугуевка, ул. Школьная» заключенный с ООО «Трак-Сервис» на сумму 187590,13 тыс. рублей (дополнительное соглашение от 24.12.2021 № 3). Срок выполнения работ: с момента заключения Контракта до 31.10.2021 (включительно) (дополнительное соглашение от 30.07.2021 № 2).

Работы по строительству выполнены с нарушением срока, согласно контракту, работы необходимо было выполнить до 31.11.2021, выполнены работы 27.06.2022, просрочка составила 239 календарных дней. В адрес подрядчика ООО «Трак-Сервис» направлены требования об уплате пени от 24.12.2021 № 4685/06 в размере 464,23 тыс. рублей, от 24.07.2022 № 2204/06 в размере 257,93 тыс. рублей.

Согласно платежным поручениям от 24.12.2021 № 1852, от 24.12.2021 № 1851, от 24.12.2021 № 1837, от 07.07.2022 № 2566 пеня оплачена подрядчиком в размере 722,16 тыс. рублей (100 %).

2. Контракт от 17.05.2021 № 0120300016621000050_88488 (реестровый номер контракта 3253400004021000020) на поставку оборудования для вновь строящегося объекта «Детский сад на 120 мест по адресу: Приморский край с. Чугуевка ул. Школьная», заключенный с ООО «ЛогистикУрал» на сумму 247,22 тыс. рублей. Срок поставки товара до 15.06.2021.

Заказчиком были применены меры ответственности по контракту от 17.05.2021 № 0120300016621000050_88488 к Поставщику. Согласно пункту 2.1 контракта от 17.05.2021 № 0120300016621000050_88488 поставка товара должна быть осуществлена в срок до 15.06.2021, акт приема-передачи товара от 14.07.2021 №1 подписан Заказчиком 20.07.2021, просрочка составила 29 календарных дней.

Заказчиком в адрес Поставщика направлена Претензия от 28.06.2021 № 2194/06. Размер пени был рассчитан по состоянию на 28.06.2021 $(247,22 * 13 \text{ (дней)} * 1/300 * 5,50\% = 0,589 \text{ тыс. рублей})$.

Пеня оплачена Поставщиком в размере 0,589 тыс. рублей (платежное поручение от 16.07.2021 № 1464).

За период с 29.06.2021 по 13.07.2021 ($247,22 * 15 \text{ (дней)} * 1/300 * 7,5\% = 0,927$ тыс. рублей) требование об уплате неустойки в виде пени Заказчиком направлено Подрядчику 12.10.2022 (претензия от 12.10.2022 № 3902/06). На 17.10.2022 пеня Подрядчиком не оплачена.

Обеспечительные меры по контракту к Поставщику не применялись.

3. Контракт от 16.06.2021 № 0120300016621000070_88488 (реестровый номер контракта 3253400004021000031) на поставку оборудования для вновь строящегося объекта «Детский сад на 120 мест по адресу: Приморский край с. Чугуевка ул. Школьная», заключенного с ООО «Торговое оборудование» на сумму 239,44 тыс. рублей. Срок поставки товара до 15.07.2021.

По контракту невозможно установить, проводилась ли Заказчиком экспертиза товара в соответствии с требованиями части 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, так как в акте приема-передачи товара не отражена данная информация.

4. Контракт от 21.06.2021 № 0120300016621000072_88488 (реестровый номер контракта 3253400004021000033) на поставку оборудования для вновь строящегося объекта «Детский сад на 120 мест по адресу: Приморский край с. Чугуевка ул. Школьная» заключенного с ООО «Офир» на сумму 1 794,99 тыс. рублей. Срок поставки товара до 15.07.2021.

Акт приема-передачи товара подписан сторонами 10.12.2021, в реестр контрактов направлен 20.12.2021. Обязательства исполнены Поставщиком с нарушением установленного контрактом срока, просрочка составила 147 рабочих дней.

Из предоставленной Учреждением информации следует, что Учреждением проводилась претензионно-исковая работа.

Претензия об уплате штрафных санкций в размере 60,28 тыс. рублей направлена в адрес ООО «Офир» 16.12.2020.

ООО «Офир» в добровольном порядке не уплачена неустойка по контракту, в связи с чем Учреждение обратилось с исковыми требованиями в Арбитражный суд Приморского края.

Решением Арбитражного суда Приморского края от 21.06.2022 по делу № А 51-3141/2022 в иске отказано, так как в силу положений подпункта «а» пункта 3, подпункта «а» пункта 5 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных Поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783, являлось обязанностью истца как Заказчика.

В нарушение пункта 10 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчик не включил информацию о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением стороной контракта обязательств, предусмотренных контрактом от 21.06.2021 № 0120300016621000072_88488 (реестровый номер контракта 3253400004021000033) в реестр контрактов.

5. Контракт от 16.08.2021 № 0120300016621000096_88488 (реестровый номер контракта 3253400004021000051) на поставку мебели в рамках

инвестиционного проекта для вновь строящегося объекта «Детский сад на 120 мест по адресу: Приморский край с. Чугуевка ул. Школьная» заключенного ООО «ПриМФ-мебель» на сумму 2 488,14 тыс. рублей. Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента заключения Контракта (15.09.2021).

При проверке сроков оплаты товара Заказчиком, установлено, что контракт от 16.08.2021 № 0120300016621000096_88488 заключен Заказчиком не в соответствии с условиями, предусмотренными извещением об осуществлении закупки, что свидетельствует о нарушении Заказчиком части 1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

Пунктом 3.5. Проекта контракта (извещение о проведении электронного аукциона от 19.07.2021 № 0120300016621000096) установлено, что оплата поставленного по настоящему Контракту товара осуществляется Заказчиком по факту поставки всей партии Товара в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании счета (счета-фактуры), товарной накладной (УПД). Авансирование не предусмотрено.

При этом пункт 3.5. Контракта от 16.08.2021 № 0120300016621000096_88488 (реестровый номер контракта 3253400004021000051) изложен в иной редакции «Оплата поставленного по настоящему Контракту товара осуществляется Заказчиком по факту поставки всей партии Товара в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления денежных средств краевого бюджета и федерального бюджета на основании счета (счета-фактуры), товарной накладной (УПД). Авансирование не предусмотрено».

Таким образом срок оплаты рассчитывается не с даты подписания Заказчиком документа о приемке, а с даты поступления денежных средств краевого бюджета и федерального бюджета, что также не соответствует требованиям части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

6. Контракт от 14.09.2021 № 0120300016621000114_88488 (реестровый номер контракта 3253400004021000060) на поставку мебели в рамках инвестиционного проекта для вновь строящегося объекта «Детский сад на 120 мест по адресу: Приморский край с. Чугуевка ул. Школьная» заключенного ООО «ПриМФ-Мебель» на сумму 456,28 тыс. рублей. Срок поставки в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта (14.10.2021).

Согласно размещенной в реестре контрактов информации о стоимости исполненных обязательств, поставленный товар оплачен в размере 456,28 тыс. рублей (платежное поручение от 09.12.2021 № 746045). Согласно пункту 2.7. Контракта расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара и товарной (товарно-транспортной) накладной. Акт приема-передачи товара № 1 подписан Заказчиком 19.11.2021, следовательно, оплату необходимо было осуществить до 03.12.2021 включительно, согласно платежному поручению № 746045 платеж

произведен 09.12.2021, просрочка составила 4 рабочих дня, в результате чего нарушены условия пункта 2.7. Контракта от 14.09.2021 № 0120300016621000114_88488.

II. Объект капитального строительства «Здание детского сада на 150 мест в п. Новонежино Шкотовского муниципального района Приморского края» (Администрация Шкотовского муниципального района Приморского края, Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием «Шкотовского муниципального района Приморского края» (далее – Учреждение, Заказчик)).




Лифт



Сушильные шкафы для одежды



Интерактивная песочница

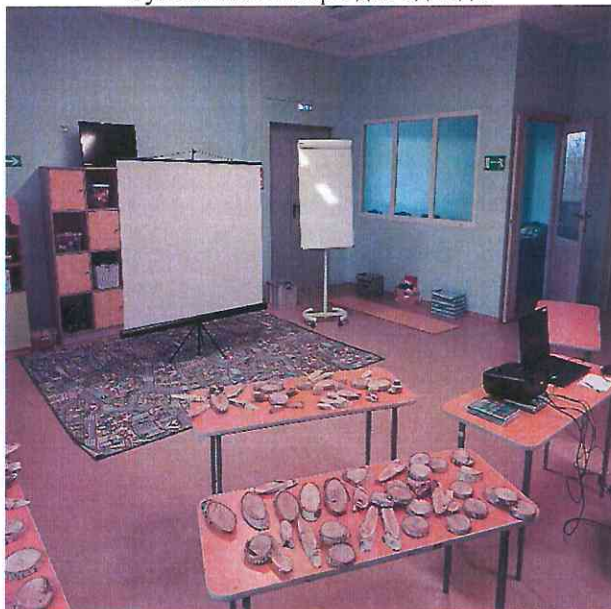

Развивающая комната

Фотографии сделаны сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края
26.10.2022

1. Контракт от 04.06.2021 № 01203000145210000200001 (реестровый номер контракта 3250301679421000002) на поставку технологического оборудования для строящегося дошкольного образовательного учреждения на 150 мест, расположенного по адресу: Приморский край Шкотовский р-он

пос. Новонежино ул. Авиаторов, 25, заключен между МКУ «Управление образованием» Шкотовского муниципального района Приморского края и ООО «Снабженец» на сумму 948,59 тыс. рублей. Срок поставки товара до 31.08.2021.

Согласно пункту 8.7.2 Контракта от 04.06.2021 № 01203000145210000200001 Заказчик обязуется оплатить поставленный Товар в течение 15 рабочих дней со дня подписания уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика Акта приема-передачи поставленного Товара (Приложение № 2), на основании предоставленного Поставщиком счета. Акт приема-передачи поставленного товара от 31.08.2021 № 1 подписан Заказчиком 05.10.2021, следовательно, оплату необходимо было осуществить до 26.10.2021 включительно, согласно платежному поручению № 300416 платеж произведен 24.12.2021, просрочка составила 41 рабочий день, в результате чего нарушены условия пункта 8.7.2 Контракта от 04.06.2021 № 01203000145210000200001.

2. Контракт от 26.07.2021 № 01203000145210000260001 (реестровый номер контракта 3250301679421000006) на поставку малых архитектурных форм для строящегося дошкольного образовательного учреждения на 150 мест, расположенного по адресу: Приморский край Шкотовский р-он пос. Новонежино ул. Авиаторов, 25, заключен между МКУ «Управление образованием» Шкотовского муниципального района Приморского края и ИП Туптин В.А. на сумму 8817,34 тыс. рублей. Срок поставки: 30.09.2021.

Согласно пункту 8.7.2 Контракта от 26.07.2021 № 01203000145210000260001 Заказчик обязуется оплатить поставленный Товар в срок, установленный постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 № 2050. Такой срок не должен превышать 10 рабочих дней со дня подписания уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика Акта приема-передачи поставленного Товара (Приложение № 2), на основании предоставленного Поставщиком счета (счета-фактуры). Акт приема-передачи поставленного товара от 30.09.2021 № 1 подписан Заказчиком 13.10.2021, следовательно, оплату необходимо было осуществить до 27.10.2021 включительно, согласно платежным поручениям № 862909, 247471 платежи произведены 12.11.2021 и 23.12.2021, соответственно просрочка составила 10 и 39 рабочих дней, в результате чего нарушены условия пункта 8.7.2 Контракта от 26.07.2021 № 01203000145210000260001.

3. Контракт от 17.04.2020 № 01203000145200000350002 (реестровый номер контракта 3250301679420000002) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Здание дошкольного образовательного учреждения в с. Новонежино на 150 мест» заключен между МКУ «Управление образованием» Шкотовского муниципального района Приморского края и ООО «Региональное предприятие механизации строительного производства» на сумму 203114,92 тыс. рублей (дополнительное соглашение от 01.12.2021 № 6). Срок поставки 30.11.2021 (дополнительное соглашение от 28.09.2021 № 5).

Акт № 1 приемки законченного строительством объекта подписан Заказчиком 15.12.2021, работы выполнены на сумму 201059,64 тыс. рублей.

Строительно-монтажные работы выполнены с нарушением срока, согласно контракту, работы необходимо было выполнить не позднее 31.11.2021, акт подписан 15.12.2021, просрочка составила 15 календарных дней. В адрес Подрядчика ООО «Региональное предприятие механизации строительного производства» 21.12.2021 направлено требование об уплате пени в размере 243,22 тыс. рублей.

За выполненные работы Заказчиком произведена оплата в размере 200 816,42 тыс. рублей с учетом вычета пени в размере 243,22 тыс. рублей.

III. Объект капитального строительства Детский сад на 230 мест г. Артем, ул. Кирова, 99 (Администрация Артемовского городского округа Приморского края, ИНН 2502012187(далее – Учреждение, Заказчик), Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и капитального ремонта г. Артема», ИНН 2502035071 (далее – Учреждение, Заказчик).

1. Контракт от 22.07.2020 № 10А/20 (реестровый номер контракта 3250203507120000019) на выполнение работ по строительству объекта «Детский сад на 230 мест по адресу: Приморский край г. Артем ул. Кирова, 99» заключен между МКУ «Управление строительства и капитального ремонта г. Артема» и ООО «Ремонтно-Строительная компания КФК» на сумму 265137,46 тыс. рублей. Сроки выполнения работ, с момента заключения Контракта до 30.11.2021 (включительно) (дополнительное соглашение от 30.06.2021 № 5).

Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, в связи с чем Заказчиком в адрес Подрядчика были направлены требования об уплате пени:

от 13.12.2021 № 1520 на сумму 25,86 тыс. рублей (платежное поручение от 14.12.2021 № 1892);

от 17.12.2021 № 1551 на сумму 53,26 тыс. рублей (платежное поручение от 21.12.2021 № 1972);

от 23.12.2021 № 1587 на сумму 116,17 тыс. рублей (платежное поручение от 24.12.2021 № 2059);

от 24.12.2021 № 1593 на сумму 156,97 тыс. рублей (платежное поручение от 24.12.2021 № 2060);

от 27.12.2021 № 1598 на сумму 23,34 тыс. рублей (платежное поручение от 27.12.2021 № 2071);

от 27.12.2021 № 1599 на сумму 23,72 тыс. рублей (платежное поручение от 27.12.2021 № 2072);

от 28.12.2021 № 1613 на сумму 13,75 тыс. рублей (платежное поручение от 29.12.2021 № 2088);

от 29.12.2021 № 1620 на сумму 5,77 тыс. рублей (платежное поручение от 29.12.2021 № 2100);

от 30.12.2021 № 1625 на сумму 42,34 тыс. рублей (платежное поручение от 30.12.2021 № 2135);

от 02.03.2022 № 160 на сумму 10,25 тыс. рублей (платежное поручение от 02.03.2022 № 208).

По результатам предъявленных Заказчиком требований об уплате неустоек Подрядчиком было оплачено 471,43 тыс. рублей (100 %).

2. Контракт от 22.03.2021 № 5А/21 (реестровый номер контракта 3250203507121000011) на проведение строительного контроля за производством работ по строительству объекта «Детский сад на 230 мест по адресу: Приморский край г. Артем ул. Кирова, 99» заключен между МКУ «Управление строительства и капитального ремонта г. Артема» и ООО «АСИММЕТРИЯ» на сумму 1 673,55 тыс. рублей. Срок оказания услуг не позднее 31.12.2021.

Акт сдачи-приемки услуг № 1, акт № 1 выполненных работ/оказанных услуг подписаны сторонами 17.03.2022 без замечаний и направлены в реестр контрактов 24.03.2022, своевременно.

При фактически оказанных услугах 31.12.2021 вышеуказанные акты подписаны только 17.03.2022, через 47 рабочих дней.

Заказчиком оказанная услуга оплачена в размере 1 673,55 тыс. рублей, согласно платежным поручениям от 24.03.2022 № 514635, от 15.04.2022 № 157876. Окончательный расчет за оказанные услуги в сумме 1 660,16 тыс. рублей (платежное поручение от 15.04.2022 № 157876) осуществлен Заказчиком несвоевременно. Согласно пункту 2.6. Контракта оплата осуществляется за фактически оказанную работу в полном объеме по окончании строительства объекта, в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта, акт подписан Заказчиком 17.03.2022, следовательно, оплату необходимо было осуществить до 31.03.2022, согласно платежному поручению № 157876 платеж произведен 15.04.2022, срок нарушен на 11 рабочих дней, в результате чего нарушены условия пункта 2.6. Контракта.

3. Контракт от 28.06.2021 № 38/52А (реестровый номер контракта 3250201218721000041) на поставку стеллажей складских металлических заключен между Администрацией Артемовского городского округа и ИП Бородавко Елена Семеновна на сумму 896,79 тыс. рублей. Срок оказания услуг не позднее 30.11.2021.

Согласно условиям контракта от 28.06.2021 № № 38/52А под датой поставки и монтажа товара стороны понимают дату подписания документов о приемке: акта-приема передачи товара, товарной накладной (пункт 6.1). Срок осуществления Заказчиком приемки товара и срок оформления результатов такой приемки составляет 3 рабочих дня с момента поставки товаров (пункт 6.3).

Товарная накладная от 14.07.2021 № 111 подписана Заказчиком 26.07.2021, следовательно, приемка товара и срок оформления результатов такой приемки необходимо было осуществить Заказчику не позднее 29.07.2021. Однако акт приема-передачи подписан сторонами только 26.11.2021, в результате чего Заказчиком нарушен порядок приемки товара и срок оформления результатов такой приемки, просрочка составила 84 рабочих дня.

Товарная накладная от 14.07.2021 № 111 направлена в реестр контрактов 13.12.2021 несвоевременно, а должна быть направлена не позднее

21.07.2021, просрочка составила 93 рабочих дня, в результате чего нарушены требования части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

При анализе товарной накладной от 14.07.2021 № 111, акта приема-передачи от 26.11.2021 установлено, что товар поставлен в ассортименте и количестве, предусмотренном в контракте.

Согласно размещенной в реестре контрактов информации о стоимости исполненных обязательств поставленный товар оплачен в размере 896,79 тыс. рублей (платежное поручение от 07.12.2021 № 63725).

Нарушение Заказчиком порядка сдачи и приемки товара в результате привело к необоснованно длительному сроку оплаты контракта.

4. Контракт от 14.07.2021 № 44/55А (реестровый номер контракта 3250201218721000046) на поставку оборудования (бытового, холодильного, прочего оборудования) на строящийся объект «Детский сад на 230 мест, расположенный по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 99» заключен между Администрацией Артемовского городского округа и ЗАО «Профессионал Сервис» на сумму 592,07 тыс. рублей. Срок поставки и монтажа товара до 30.11.2021.

Товарная накладная от 02.11.2021 № П/В/211102/1 подписана Заказчиком 30.11.2021, направлена в реестр контрактов 13.12.2021 несвоевременно, а должна быть направлена не позднее 07.12.2021, срок нарушен на 4 рабочих дня, что является нарушением требования части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

5. Контракт от 26.07.2021 № 48/65А (реестровый номер контракта 3250201218721000053) на поставку и монтаж ванн моечных на строящийся объект: «Детский сад на 230 мест, расположенный по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 99» заключен между Администрацией Артемовского городского округа и ООО «Контур ДВ» на сумму 328,09 тыс. рублей. Срок поставки и монтажа товара до 30.11.2021.

Товарная накладная от 24.11.2021 № 138 подписана Заказчиком 29.11.2021, направлена в реестр контрактов 13.12.2021 несвоевременно, должна быть направлена не позднее 06.12.2021, просрочка составила 5 рабочих дней, в результате чего нарушены требования части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

6. Контракт от 02.08.2021 № 46/58А (реестровый номер контракта 3250201218721000054) на поставку оборудования для пищеблока (печь конвекционная) на строящийся объект «Детский сад на 230 мест, расположенный по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 99» заключен между Администрацией Артемовского городского округа и ООО «Геликон» на сумму 248,89 тыс. рублей. Срок поставки и монтажа товара до 30.11.2021.

Товарная накладная от 25.11.2021 № 73 подписана Заказчиком 30.11.2021, направлена в реестр контрактов 23.12.2021 несвоевременно, должна быть направлена не позднее 07.12.2021, просрочка составила 12 рабочих дней, в результате чего нарушены требования части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

Установить, проводилась ли Заказчиком экспертиза товара не предоставляется возможным, так как в акте приема-передачи товара не

отражена информация, соответствует (не соответствует) требованиям контракта фактическое качество и количество товара (и сопутствующих услуг), выявлены (не выявлены) недостатки товаров (и сопутствующих услуг).

Согласно размещенной в реестре контрактов информации о стоимости исполненных обязательств, поставленный товар оплачен в размере 248,89 тыс. рублей (платежное поручение от 22.12.2021 № 68358). Согласно пункту 2.3. Контракта оплата осуществляется за фактически поставленный товар в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке: акта приема-передачи товара, товарной накладной. Указанные документы о приемке подписаны Заказчиком 30.11.2021, следовательно, оплату необходимо было осуществить до 14.12.2021 включительно, согласно платежному поручению № 68358 платеж произведен 22.12.2021, просрочка составила 6 рабочих дней, в результате чего нарушены условия пункта 2.3. Контракта 02.08.2021 № 46/58А.

В качестве обеспечения исполнения контракта Поставщиком предоставлена информация, подтверждающая добросовестность участника закупки, содержащаяся в реестре контрактов. Номера реестровых записей контрактов: от 22.05.2020 № 2540650980020000151 (4242,00 тыс. рублей), от 31.07.2019 № 3650123897519000158 (2281,67 тыс. рублей), от 07.05.2020 № 2253902670020000097 (2699,42 тыс. рублей).

В ходе проверки данного реестра контрактов было установлено, что по контракту с реестровым номером 2540650980020000151 в отношении ООО «Геликон» была выставлена неустойка в сумме 5,0 тыс. рублей. Таким образом, предоставленная информация, подтверждающая добросовестность участника закупки, не соответствует требованиям части 8.1. статьи 96 Федерального закона от № 44-ФЗ.

7. Контракт от 03.08.2021 № 50/68А (реестровый номер контракта 3250201218721000055) на поставку и монтаж шкафов сушильных для одежды на строящийся объект «Детский сад на 230 мест, расположенный по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 99» заключен между Администрацией Артемовского городского округа и ООО «Стальная Империя» на сумму 705,31 тыс. рублей. Срок поставки и монтажа товара до 30.11.2021.

Товарная накладная от 08.11.2021 № 4 подписана Заказчиком 29.11.2021, направлена в реестр контрактов 13.12.2021 несвоевременно, должна быть направлена не позднее 06.12.2021, просрочка составила 5 рабочих дней, в результате чего нарушены требования части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

8. Контракт от 03.08.2021 № 51/57А (реестровый номер контракта 3250201218721000056) на поставку оборудования (бытового) на строящийся объект: «Детский сад на 230 мест, расположенный по адресу: г. Артем ул. Кирова, 99» заключен между Администрацией Артемовского городского округа и ИП Кириченко Юлия Николаевна на сумму 404,66 тыс. рублей. Срок поставки и монтажа товара до 30.11.2021.

Товарная накладная от 01.11.2021 № 46 подписана Заказчиком 26.11.2021, направлена в реестр контрактов 13.12.2021 несвоевременно,

должна быть направлена не позднее 03.12.2021, просрочка составила 6 рабочих дней, в результате чего нарушены требования части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

9. Контракт от 04.08.2021 № 49/56А (реестровый номер контракта 3250201218721000058) на поставку оборудования (бытового) на строящийся объект «Детский сад на 230 мест, расположенный по адресу: г. Артем ул. Кирова, 99» заключен между Администрацией Артемовского городского округа и ООО «Геликон» на сумму 909,70 тыс. рублей. Срок поставки и монтажа товара до 30.11.2021.

Товарная накладная от 25.11.2021 № 74 подписана Заказчиком 30.11.2021, направлена в реестр контрактов 13.12.2021 несвоевременно, а должна быть направлена не позднее 07.12.2021, просрочка составила 4 рабочих дней, в результате чего нарушены требования части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

Установить, проводилась ли Заказчиком экспертиза товара, не предоставляется возможным, так как в акте приема-передачи товара не отражена информация соответствует (не соответствует) требованиям контракта фактическое качество и количество товара (и сопутствующих услуг), выявлены (не выявлены) недостатки товаров (и сопутствующих услуг).

В качестве обеспечения исполнения контракта Поставщиком предоставлена информация, подтверждающая добросовестность участника закупки, содержащаяся в реестре контрактов. Номера реестровых записей контрактов: от 22.05.2020 № 2540650980020000151 (4242,00 тыс. рублей), от 31.07.2019 № 3650123897519000158 (2281,67 тыс. рублей), от 07.05.2020 № 2253902670020000097 (2699,42 тыс. рублей).

В ходе проверки данного реестра контрактов было установлено, что по контракту с реестровым номером 2540650980020000151 в отношении ООО «Геликон» была выставлена неустойка в сумме 5,0 тыс. рублей. Таким образом, предоставленная информация, подтверждающая добросовестность участника закупки, не соответствует требованиям части 8.1. статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

10. Контракт от 16.08.2021 № 53/66А (реестровый номер контракта 3250201218721000059) на поставку мебели деревянной на строящийся объект «Детский сад на 230 мест, расположенный по адресу: г. Артем ул. Кирова, 99» заключен между Администрацией Артемовского городского округа и ООО «Примф-Мебель» на сумму 614,70 тыс. рублей. Срок поставки и монтажа товара до 30.11.2021.

Товарная накладная от 26.11.2021 № 753 подписана Заказчиком 29.11.2021, направлена в реестр контрактов 13.12.2021 несвоевременно, а должна быть направлена не позднее 06.12.2021, просрочка составила 5 рабочих дней, в результате чего нарушены требования части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

11. Контракт от 23.08.2021 № 55/76А (реестровый номер контракта 3250201218721000061) на поставку мебели деревянной на строящийся объект «Детский сад на 230 мест, расположенный по адресу: г. Артем ул. Кирова,

99» заключен между Администрацией Артемовского городского округа и ООО «Примф-Мебель» на сумму 593,62 тыс. рублей. Срок поставки и монтажа товара до 30.11.2021.

Товарная накладная от 26.11.2021 № 755 подписана Заказчиком 29.11.2021, направлена в реестр контрактов 13.12.2021 несвоевременно, а должна быть направлена не позднее 06.12.2021, просрочка составила 5 рабочих дней, в результате чего нарушены требования части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

12. Контракт от 30.08.2021 № 58/71А (реестровый номер контракта 3250201218721000065) на поставку мебели на строящийся объект «Детский сад на 230 мест, расположенный по адресу: г. Артем ул. Кирова, 99» заключен между Администрацией Артемовского городского округа и ООО «Примф-Мебель» на сумму 813,03 тыс. рублей. Срок поставки и монтажа товара до 30.11.2021.

Товарная накладная от 26.11.2021 № 756 подписана Заказчиком 29.11.2021, направлена в реестр контрактов 13.12.2021 несвоевременно, а должна быть направлена не позднее 06.12.2021, просрочка составила 5 рабочих дней, в результате чего нарушены требования части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

13. Контракт от 30.08.2021 № 59/79А (реестровый номер контракта 3250201218721000064) на поставку мебели на строящийся объект «Детский сад на 230 мест, расположенный по адресу: г. Артем ул. Кирова, 99» заключен между Администрацией Артемовского городского округа и ООО «Примф-Мебель» на сумму 489,06 тыс. рублей. Срок поставки и монтажа товара до 30.11.2021.

Товарная накладная от 26.11.2021 № 757 подписана Заказчиком 29.11.2021, направлена в реестр контрактов 13.12.2021 несвоевременно, а должна быть направлена не позднее 06.12.2021, просрочка составила 5 рабочих дней, в результате чего нарушены требования части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

14. Контракт от 01.09.2021 № 57/64А (реестровый номер контракта 3250201218721000067) на поставку металлической мебели хозяйственно-бытового назначения на строящийся объект «Детский сад на 230 мест, расположенный по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 99» заключен между Администрацией Артемовского городского округа и ИП Гриневич Людмила Анатольевна на сумму 483,04 тыс. рублей. Срок поставки и монтажа товара до 30.11.2021.

Товарная накладная от 15.11.2021 № 417 подписана Заказчиком 29.11.2021, направлена в реестр контрактов 13.12.2021, несвоевременно, а должна быть направлена не позднее 06.12.2021, просрочка составила 5 рабочих дней, в результате чего нарушены требования части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

Установить, проводилась ли Заказчиком экспертиза товара не предоставляется возможным, так как в акте приема-передачи товара не отражена информация, соответствует (не соответствует) требованиям контракта фактическое качество и количество товара (и сопутствующих

услуг), выявлены (не выявлены) недостатки товаров (и сопутствующих услуг).

IV. Объект капитального строительства «Детский сад на 230 мест, расположенный по адресу: Приморский край г. Артем микрорайон «Глобус-2».

1. Контракт от 07.09.2020 № 11А/20 (реестровый номер контракта 3250203507120000021) на выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации заключен между МКУ «Управление строительства и капитального ремонта г. Артема» и ООО «Бельведер» на сумму 6 345,56 тыс. рублей. Срок выполнения инженерных изысканий – не позднее 27.09.2020, разработка проектной документации повторного использования – не позднее 18.10.2020, проведение государственной экспертизы проектной документации, проведение государственной экспертизы проверки достоверности сметной стоимости – сорок второй день с даты начала проведения государственной экспертизы проектной документации, проведение государственной экспертизы проверки достоверности сметной стоимости, разработка рабочей документации – не позднее 25.12.2020.

Работы по разработке проектной документации повторного использования выполнены с нарушением срока, согласно графику работ, работы необходимо было выполнить не позднее 18.10.2020, акт подписан 10.11.2020, просрочка составила 23 календарных дня. В адрес Подрядчика ООО «Бельведер» 16.11.2020 направлено требование об уплате штрафа по ненадлежащему исполнению обязательств, предусмотренных контрактом от 07.09.2020 № 11А/20, в размере 5,0 тыс. рублей. Согласно платежному поручению № 14 штраф в размере 5,0 тыс. рублей оплачен Подрядчиком ООО «Бельведер» 25.01.2021.

Акт приема-передачи результатов выполненных работ от 05.03.2021 подписан Заказчиком 10.03.2021 и направлен в реестр контрактов 12.03.2021, своевременно. Просрочка исполнения обязательств составила 27 календарных дней. В адрес Подрядчика ООО «Бельведер» 10.03.2021 направлено требование об уплате пени по муниципальному контракту от 07.09.2020 № 11А/20, в размере 24,27 тыс. рублей. Согласно платежному поручению № 56 пеня в размере 24,27 тыс. рублей оплачена Подрядчиком ООО «Бельведер» 11.03.2021.

2. Контракт от 25.10.2021 № 12А/21 (реестровый номер контракта 3250203507121000049) на оказание услуг по строительному контролю за производством работ по строительству объекта «Детский сад на 230 мест, расположенный по адресу: Приморский край, г. Артем, микрорайон «Глобус-2», 23» заключен между МКУ «Управление строительства и капитального ремонта г. Артема» и ООО «Асимметрия» на сумму 481,83 тыс. рублей. Срок оказания услуг до 20.12.2021.

В связи с истечением срока исполнения контракта и невозможностью выбора полного объема услуг по строительному контролю, контракт от 25.10.2021 № 12А/21 расторгнут по соглашению сторон (Дополнительное соглашение к контракту от 18.05.2022).

Акт оказанных услуг № 1 подписан сторонами 25.02.2022 и направлен в реестр контрактов 09.03.2022 несвоевременно, а должен быть направлен не позднее 04.03.2022, просрочка составила 2 рабочих дня, в результате чего нарушены требования части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

V. Объект капитального строительства детский сад-ясли на 152 места в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района, ул. Анисимова, д. 75 (строительство) (Управление образования администрации Надеждинского муниципального района (далее – Заказчик)).

1. Контракт от 17.04.2020 № 0320300028220000014 (реестровый номер контракта 3252100227220000005), заключенный Заказчиком с ООО «РП МСП» (далее – Подрядчик) по выполнению строительно-монтажных работ по объекту «Строительство детского сада-ясли в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района» (далее – контракт от 17.04.2020 № 0320300028220000014).

В ходе выборочной проверки установлено, что в нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), пункта 2.9 контракта от 17.04.2020 № 0320300028220000014, согласно которому оплата должна быть произведена в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), подписанных Подрядчиком и Заказчиком:

с нарушением срока на 1 рабочий день произведена оплата на сумму 14 388,69 тыс. рублей (КС-3 от 30.10.2020 № 4, подписана всеми сторонами; платежное поручение от 25.11.2020 № 74992), оплата должна быть не позднее 23.11.2020;

с нарушением срока на 7 рабочих дней произведена оплата на сумму 11 907,01 тыс. рублей (КС-3 от 15.09.2020 № 3, подписана всеми сторонами; платежное поручение от 16.10.2020 № 196741), оплата должна быть не позднее 06.10.2020;

с нарушением срока на 15 рабочих дней произведена оплата на сумму 6 376,55 тыс. рублей (КС-3 от 07.07.2020 № 1, подписана всеми сторонами; платежное поручение от 19.08.2020 № 836917), оплата должна быть не позднее 28.07.2020;

с нарушением срока на 2 рабочих дня произведена оплата на сумму 51,42 тыс. рублей (КС-3 от 07.07.2020 № 1, подписана всеми сторонами; платежное поручение от 31.07.2020 № 519012), оплата должна быть не позднее 28.07.2020.

Заключение дополнительного соглашения от 20.12.2021 № 6 к контракту от 17.04.2020 № 0320300028220000014, при отсутствии решения местной администрации, осуществлено с нарушением положений пункта 8 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

На основании письма Заказчика от 17.05.2022 № 750, направленного в адрес Подрядчика, о возврате излишне перечисленных средств на сумму 149,67 тыс. рублей, Подрядчиком 18.05.2022 осуществлен возврат излишне уплаченной суммы (платежные поручения от 18.05.2022 № 256 и 257).

В нарушение абзаца 4 подпункта «б» пункта 15 Правил № 60¹, согласно которому срок направления в ЕИС информации и документов о возврате заказчику излишне уплаченной суммы оплаты контракта, составляет не более 5 рабочих дней со дня, следующего за днем представления соответствующего документа, Заказчиком 08.06.2022 с нарушением срока на 9 рабочих дней направлены в ЕИС информация и документы о возврате излишне уплаченной суммы оплаты контракта, сведения должны быть направлены не позднее 25.05.2022.

Актом сдачи-приемки этапа выполненных работ от 20.12.2021 установлено, что Подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты работы по предмету закупки – строительство детского сада-ясли в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района на сумму 213 732,83 тыс. рублей.

По выводам приемочной комиссии, работы выполнены полностью в соответствии с условиями контракта и (или) предусмотренной им нормативной и технической документации.


Вместе с тем, при выезде 26.10.2022, при визуальном осмотре здания и помещений выявлен ряд дефектов.



Дефект потолочной плитки



Дефект потолочной плитки

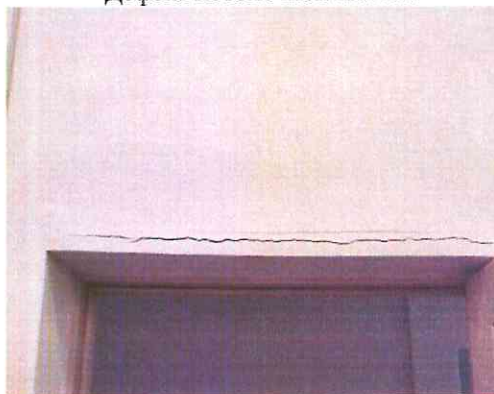

Дефект дверного проема



Дефект дверного проема

Фотографии сделаны сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края 26.10.2022

По каждому выявленному Заказчиком в ходе эксплуатации здания факту недостатков и дефектов, в соответствии с положениями раздела № 6

¹ Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 № 60 (ред. от 31.10.2022) «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации».

контракта от 17.04.2020 № 0320300028220000014, Подрядчиком своевременно исполняются гарантийные обязательства.

2. Контракт от 01.06.2021 № 0320300028221000002_213856 (реестровый номер контракта 3252100227221000004) заключен с ООО «ПриМФ-мебель» на поставку мебели в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района (далее – контракт от 01.06.2021 № 0320300028221000002_213856).

Обеспечение исполнения контракта от 01.06.2021 № 0320300028221000002_213856 предоставлено в соответствии с пунктом 9.5 указанного контракта в сумме 69,13 тыс. рублей (платежное поручение от 26.05.2021 № 533).

В нарушение пункта 9.7 контракта от 01.06.2021 № 0320300028221000002_213856, согласно которому срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения, не может превышать 15 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, Заказчик вернул обеспечение исполнения контракта только 09.09.2021 (акт приёмки-передачи товара от 11.08.2021, платежное поручение от 09.09.2021 № 883349) с превышением установленного срока на 14 календарных дней, возврат должен быть осуществлен не позднее 26.08.2021.

3. Контракт от 01.06.2021 № 0320300028221000003_213856 (реестровый номер контракта 3252100227221000005) заключен с ООО «ПриМФ-мебель» на поставку мебели в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района, цена которого 183,08 тыс. рублей (далее – контракт от 01.06.2021 № 0320300028221000003_213856).

Обеспечение исполнения контракта от 01.06.2021 № 0320300028221000003_213856 предоставлено в соответствии с пунктом 9.5 указанного контракта в сумме 9,15 тыс. рублей (платежное поручение от 26.05.2021 № 530).

В нарушение пункта 9.7 контракта от 01.06.2021 № 0320300028221000003_213856, согласно которому срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения, не может превышать 15 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, Заказчик вернул обеспечение исполнения контракта только 10.09.2021 (акт приёмки-передачи товара от 11.08.2021, платежное поручение от 10.09.2021 № 21145) с превышением установленного срока на 15 календарных дней, возврат должен быть осуществлен не позднее 26.08.2021.

4. Контракт от 15.06.2021 № 0320300028221000004_213856 (реестровый номер контракта 3252100227221000006) заключен с ООО «Контур ДВ» на поставку стеллажей и шкафов металлических в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района, цена которого 523,50 тыс. рублей (далее – контракт от 15.06.2021 № 320300028221000004_213856).

В нарушение статьи 309 ГК РФ, пункта 3.1 контракта от 15.06.2021 № 0320300028221000004_213856, согласно которому оплата должна быть произведена в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара, оплата осуществлена с нарушением срока на 6 рабочих дней на сумму 523,50 тыс. рублей (акт приёмки-передачи товара от 20.08.2021, платежное поручение от 14.09.2021 № 115056), а должна быть не позднее 03.09.2021.

Обеспечение исполнения контракта от 15.06.2021 № 0320300028221000004_213856 предоставлено согласно пункту 9.5 указанного контракта в сумме 26,18 тыс. рублей (платежное поручение от 08.06.2021 № 229).

В нарушение пункта 9.7 контракта от 01.06.2021 № 0320300028221000004_213856, согласно которому срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения не может превышать 15 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, Заказчик вернул обеспечение исполнения контракта только 11.11.2022 (акт приёмки-передачи товара от 20.08.2021, платежное поручение от 11.11.2022 № 663592), в период проведения экспертно-аналитического мероприятия, с превышением установленного срока на 1 год и 68 календарных дней, возврат должен быть осуществлен не позднее 04.09.2021.

5. Контракт от 29.06.2021 № 0320300028221000007_213856 (реестровый номер контракта 3252100227221000007) заключен с ООО «Панорама» на поставку шкафов холодильных и кухонного оборудования в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района (далее – контракт от 29.06.2021 № 0320300028221000007_213856). Срок поставки – с 09.08.2021 по 20.08.2021.

В нарушение пункта 5.1 контракта от 29.06.2021 № 0320300028221000007_213856 ООО «Панорама» несвоевременно осуществило поставку 01.10.2021.

Согласно части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком выставлено требование об уплате неустоек (требование об уплате неустойки от 05.10.2021 № 1355 в размере 1,51 тыс. рублей).

ООО «Панорама» в полном объеме оплачена неустойка (платежное поручение от 14.10.2021 № 1424 на 1,51 тыс. рублей).

В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ с нарушением срока на 13 рабочих дней 08.11.2021 Заказчик направил информацию и документы о начислении неустойки в ЕИС, сведения должны быть направлены не позднее 12.10.2021.

Пунктом 3.3 контракта от 29.06.2021 № 0320300028221000007_213856 предусмотрено, что оплата поставленного товара производится на основании товарной накладной и счет-фактуры (или УПД) при условии, что Товар поставлен надлежащим образом в полном объеме и в установленный срок.

В нарушение статьи 309 ГК РФ, пункта 3.1 контракта от 29.06.2021 № 0320300028221000007_213856, согласно которому оплата должна быть

произведена в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара (товарная накладная от 17.09.2021 № ПНЦ 0005947 подписана Заказчиком 01.10.2021), Заказчиком оплата осуществлена с нарушением срока на 10 рабочих дней на сумму 609,97 тыс. рублей (платежное поручение от 03.11.2021 № 724184), а должна быть не позднее 15.10.2021.

6. Контракт от 02.07.2021 № 0320300028221000008_213856 (реестровый номер контракта 3252100227221000008) заключен с ООО «Контур ДВ» на поставку мебели для пищеблока и прачечной в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района (далее – контракт от 02.07.2021 № 0320300028221000008_213856).

Обеспечение исполнения контракта предоставлено в соответствии с пунктом 9.5 контракта от 02.07.2021 № 0320300028221000008_213856 на сумму 26,59 тыс. рублей (платежное поручение от 25.06.2021 № 257).

В нарушение пункта 9.7 контракта от 01.06.2021 № 0320300028221000008_213856, согласно которому срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения, не может превышать 15 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, Заказчик вернул обеспечение исполнения контракта только 11.11.2022 (акт приёмки-передачи товара от 16.09.2021, платежное поручение от 11.11.2022 № 663594), в период проведения экспертно-аналитического мероприятия, с превышением установленного срока на 1 год и 41 календарный день, возврат должен быть осуществлен не позднее 01.10.2021.

7. Контракт от 29.04.2021 № 1-УИС (реестровый номер контракта 3252100227221000003) заключен с ФКУ ИК-41 ГУФСИН России по ПК на поставку мебели в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района (далее – контракт от 29.04.2021 № 1-УИС).

В силу пункта 5.1 контракта от 29.04.2021 № 1-УИС Заказчик организует и осуществляет приемку поставленного товара, срок приемки и срок оформления результатов такой приемки составляет не более 2 рабочих дней с момента поставки товара.

Положениями пункта 5.2 контракта от 29.04.2021 № 1-УИС предусмотрено, что приемка товара включает проведение экспертизы поставленного товара, при этом экспертиза проводится Заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством.

Товарная накладная от 20.08.2021 № 00000175 подписана представителем Заказчика без проставления даты и расшифровки подписи, в нарушение части 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ экспертиза поставленного товара Заказчиком не проведена (27.08.2021 в ЕИС размещен документ о приемке, не имеющий отношение к контракту от 29.04.2021 № 1-УИС, а именно, о приемке мебели по контракту 0320300028221000003_213856, заключенному с ООО «ПриМФ-мебель»), в связи с чем не представляется возможным определить своевременность оплаты.

8. Контракт № 1-ОБ заключен с ООО «МедПрофи» 13.07.2021 на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на поставку медицинского оборудования (фото № 16 и № 17) в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района (далее – контракт № 1-ОБ).

Согласно пункту 5.1 контракта № 1-ОБ товар должен быть поставлен в полном объеме в срок с 09.08.2021 по 17.09.2021. В соответствии с пунктом 3.1 контракта, расчеты за поставленный товар производятся в течение 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке.

Исходя из содержания пункта 10.1 контракта № 1-ОБ следует, что изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон.

Срок поставки товара по контракту относится к существенным условиям (пункт 1 статьи 432, статьи 506, 508 ГК РФ).

Без оформления дополнительного соглашения к контракту № 1-ОБ Заказчик инициировал изменение сроков поставки товара, уведомив ООО «МедПрофи» письмом б/н от 17.09.2021.

В соответствии с товарной накладной от 14.09.2021 № 527 товар был поставлен Заказчику, однако принят только 13.10.2021 (товарная накладная от 14.09.2021 № 527; акт приемки-передачи от 13.10.2021), при этом пунктом 5.14 контракта № 1-ОБ предусмотрено, что осмотр товара и проверка его количества, качества и комплектности производятся в месте доставки в день вручения товара Заказчику. Необоснованное затягивание Заказчиком подписания документа о приемке товара позволяют избежать ответственности за нарушение сроков оплаты.

В нарушение статьи 309 ГК РФ, пункта 3.1 контракта № 1-ОБ, согласно которому оплата должна быть произведена в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара (товарная накладная от 14.09.2021 № 527 пописана Заказчиком 13.10.2021), Заказчиком с нарушением срока на 2 рабочих дня осуществлена оплата на сумму 382,78 тыс. рублей (платежное поручение от 08.11.2021 № 743242), а должна быть не позднее 27.10.2021.

9. Контракт № 2-ОБ заключен с ООО «Океан Строй» 14.07.2021 на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на поставку противопожарного оборудования в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района (далее – контракт № 2-ОБ).

Согласно условиям контракта № 2-ОБ товар должен быть поставлен в полном объеме в срок до 06.09.2021. В соответствии с пунктом 3.1 контракта расчеты за поставленный товар производятся в течение 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке.

Дополнительного соглашения к контракту № 2-ОБ об изменении сроков поставки товара в рамках проверки не представлено.

Согласно акту приема-передачи от 22.10.2021, УПД от 19.10.2021 № 895, товар поставлен Заказчику 19.10.2021, принят Заказчиком 22.10.2021.

В нарушение пункта 5.1 контракта № 2-ОБ, срок поставки товара ООО «Океан Строй» превышен на 43 календарных дня.

Положениями части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 7.9.3 контракта № 2-ОБ установлена обязанность Заказчика требовать уплаты неустойки в случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения Поставщиком обязательств по контракту, данные нормы носят императивный характер, являются нормами прямого действия и подлежат применению независимо от установленных условий контракта. При этом требования об уплате неустойки (пени в размере 0,38 тыс. рублей) Заказчиком не предъявлено. Претензионная работа не проводилась.

В нарушение статьи 309 ГК РФ, пункта 3.1 контракта № 2-ОБ, согласно которому оплата должна быть произведена в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара (УПД от 19.10.2021 № 895, подписан Заказчиком 22.10.2021), Заказчиком с нарушением срока на 3 рабочих дня осуществлена оплата на сумму 39,47 тыс. рублей (платежное поручение от 18.11.2021 № 183989), а должна быть не позднее 12.11.2021.

10. Контракт № 3-ОБ заключен с ООО «Компания Джаз» 14.07.2021 на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на поставку музыкального оборудования в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района (далее – контракт № 3-ОБ).

В нарушение статьи 309 ГК РФ, пункта 3.1 контракта № 3-ОБ, согласно которому оплата должна быть произведена в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара (УПД от 26.08.2021 № УТ-85, подписан Заказчиком 26.08.2021), Заказчиком с нарушением срока на 2 рабочих дня осуществлена оплата на сумму 109,23 тыс. рублей (платежное поручение от 14.09.2021 № 115550), а должна быть не позднее 09.09.2021.

11. Контракт № 5-ОБ заключен с ООО «Панорама» 14.07.2021 на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на поставку кухонного и прачечного оборудования (фото № 18) в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района (далее – контракт № 5-ОБ).

В нарушение статьи 309 ГК РФ, пункта 3.1 контракта № 5-ОБ, согласно которому оплата должна быть произведена в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара (ТН от 17.09.2021 № ПНЦ0005949, подписана Заказчиком 01.10.2021), Заказчиком с нарушением срока на 10 рабочих дней осуществлена оплата на сумму 306,03 тыс. рублей (платежное поручение от 03.11.2021 № 724185), а должна быть не позднее 15.10.2021.

12. Контракт № 6-ОБ заключен с ООО «Ресто Владивосток» 19.07.2021 на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на поставку кухонного инвентаря в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района (далее – контракт № 6-ОБ).

Согласно пункту 5.1 контракта № 6-ОБ товар должен быть поставлен в полном объеме в срок с 16.08.2021 по 17.09.2021, контракт подлежит исполнению в один этап, условия не предполагают приемку работ по частям. В соответствии с пунктом 3.1 контракта, расчеты за поставленный товар производятся в течение 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке, аванс не предусмотрен. Кроме того, пунктом 3.3 контракта № 6-ОБ предусмотрено, что оплата поставленного товара производится на основании товарной накладной и счет-фактуры (или УПД).

Между тем товар получен Заказчиком 21.09.2021 (УПД, счет-фактура № P2109.0021 от 21.09.2021 и акт приема-передачи от 21.09.2021), то есть в нарушение пункта 5.1 контракта № 6-ОБ срок поставки превышен на 4 календарных дня.

Положениями части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 7.9.3 контракта № 6-ОБ установлена обязанность Заказчика требовать уплаты неустойки в случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения Поставщиком обязательств по контракту, данные нормы носят императивный характер, являются нормами прямого действия и подлежат применению независимо от установленных условий контракта. При этом требования об уплате неустойки (пени – 0,02 тыс. рублей) Заказчиком не предъявлено. Претензионная работа не проводилась.

В нарушение пункта 3.3 контракта № 6-ОБ, при отсутствии правовых оснований Заказчиком 20.08.2021 произведена оплата ООО «Ресто Владивосток» по контракту № 6-ОБ на сумму 18,33 тыс. рублей, без товарной накладной и счет-фактуры (УПД) и фактически поставленного товара, так как акт приемки подписан 21.09.2021 (платежное поручение от 20.08.2021 № 414820; основанием для платежа указан УПД № Ч00021232 от 15.07.2021, который в рамках проверки не представлен).

13. Контракт № 7-ОБ заключен с ООО «Контур-ДВ» 15.07.2021 на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на поставку стеллажей и столов в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района (далее – контракт № 7-ОБ).

Пунктом 2.1 контракта № 7-ОБ установлено, что цена контракта (237,2 тыс. рублей) определена по итогам электронного аукциона, при этом основанием заключения контракта в преамбуле указан пункт 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ – осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей, у единственного поставщика.

Согласно пункту 5.1 контракта № 7-ОБ товар должен быть поставлен в полном объеме в срок с 09.08.2021 по 17.09.2021, контракт подлежит исполнению в один этап, условия не предполагают приемку работ по частям. В соответствии с пунктом 3.1 контракта, расчеты за поставленный товар производятся в течение 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке, аванс не предусмотрен. Кроме того, пунктом 3.3 контракта № 7-ОБ предусмотрено, что оплата поставленного товара производится на основании товарной накладной и счет-фактуры (или УПД).

Между тем товар поставлен Заказчику 08.10.2021 (счет-фактура от 08.10.2021 № 00107 и товарная накладная от 08.10.2021 № 121), принят Заказчиком 17.11.2021 (товарная накладная от 08.10.2021 № 121 и акт приема-передачи от 17.11.2021). В нарушение пункта 5.1 контракта № 7-ОБ, срок поставки превышен на 21 календарный день.

Положениями части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 7.9.3 контракта № 7-ОБ установлена обязанность Заказчика требовать уплаты неустойки в случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения Поставщиком обязательств по контракту, данные нормы носят императивный характер, являются нормами прямого действия и подлежат применению независимо от установленных условий контракта. При этом требования об уплате неустойки (пени – 1,1 тыс. рублей) Заказчиком не предъявлено. Претензионная работа не проводилась.

В нарушение статьи 309 ГК РФ, пункта 3.1 контракта № 7-ОБ, согласно которому оплата должна быть произведена в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара (товарная накладная от 08.10.2021 № 121, подписана 17.11.2021), Заказчиком с нарушением срока на 2 рабочих дня осуществлена оплата на сумму 237,2 тыс. рублей (платежное поручение от 06.12.2021 № 632350), а должна быть не позднее 01.12.2021.

14. Контракт № 8-ОБ заключен с ООО «Трудовик» 21.07.2021 на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на поставку шкафов сушильных в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района (далее – контракт № 8-ОБ).



Сушильный шкаф



Сушильный шкаф

Фотографии сделаны сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края 26.10.2022

Пунктом 2.1 контракта № 8-ОБ установлено, что цена контракта (515,9 тыс. рублей) определена по итогам электронного аукциона, при этом основанием заключения контракта в преамбуле указан пункт 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ – осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей, у единственного поставщика.

Согласно пункту 5.1 контракта № 8-ОБ товар должен быть поставлен в полном объеме в срок с 16.08.2021 по 01.10.2021, контракт подлежит исполнению в один этап, условия не предполагают приемку работ по частям. В соответствии с пунктом 3.1 контракта, расчеты за поставленный товар производятся в течение 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке, аванс не предусмотрен. Кроме того, пунктом 3.3 контракта № 8-ОБ предусмотрено, что оплата поставленного товара производится на основании товарной накладной и счет-фактуры (или УПД).

Между тем товар поставлен и принят Заказчиком 25.10.2021 (УПД от 25.10.2021 № 1378; акт приема-передачи от 25.10.2021). В нарушение пункта 5.1 контракта № 8-ОБ, срок поставки превышен на 24 календарных дня.

Положениями части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 7.9.3 контракта № 8-ОБ установлена обязанность Заказчика требовать уплаты неустойки в случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения Поставщиком обязательств по контракту, данные нормы носят императивный характер, являются нормами прямого действия и подлежат применению независимо от установленных условий контракта. При этом требования об уплате неустойки (пени – 2,8 тыс. рублей) Заказчиком не предъявлено. Претензионная работа не проводилась.

В нарушение статьи 309 ГК РФ, пункта 3.1 контракта № 8-ОБ, согласно которому оплата должна быть произведена в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара (УПД от 25.10.2021 № 1378, подписан Заказчиком 25.10.2021), Заказчиком с нарушением срока на 2 рабочих дня осуществлена оплата на сумму 515,9 тыс. рублей (платежное поручение от 18.11.2021 № 183990), а должна быть не позднее 15.11.2021.

15. Контракт № 9-ОБ заключен с ООО «Трудовик» 21.07.2021 на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на поставку оборудования для сада в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района (далее – контракт № 9-ОБ).

Согласно пункту 5.1 контракта № 9-ОБ товар должен быть поставлен в полном объеме в срок с 16.08.2021 по 01.10.2021, контракт подлежит исполнению в один этап, условия не предполагают приемку работ по частям. В соответствии с пунктом 3.1 контракта, расчеты за поставленный товар производятся в течение 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке, аванс не предусмотрен. Кроме того, пунктом 3.3 контракта № 9-ОБ предусмотрено, что оплата поставленного товара производится на основании товарной накладной и счет-фактуры (или УПД).

Между тем товар поставлен Заказчику 25.10.2021 (УПД от 25.10.2021 № 1207), в нарушение пункта 5.1 контракта № 9-ОБ, срок поставки превышен на 24 календарных дня.

Положениями части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 7.9.3 контракта № 9-ОБ установлена обязанность Заказчика требовать уплаты неустойки в случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения Поставщиком обязательств по контракту, данные нормы носят императивный характер, являются нормами прямого действия и подлежат

применению независимо от установленных условий контракта. При этом требования об уплате неустойки (пени – 2,7 тыс. рублей) Заказчиком не предъявлено. Претензионная работа не проводилась.

В пункте 5.17 контракта № 9-ОБ указано, что осмотр товара и проверка его количества, качества и комплектности производятся в месте доставки в день вручения товара Заказчику.

Товар поставлен Заказчику 25.10.2021 (УПД от 25.10.2021 № 1207), однако акт приемки-передачи подписан 24.11.2021, по выводам которого следует, что товар поставлен полностью в соответствии с условиями контракта, экспертиза с привлечением эксперта или экспертной организации не проводилась.

Необоснованное затягивание Заказчиком подписания документа о приемке товара позволяют избежать ответственности за нарушение сроков оплаты. По данному контракту оплата произведена 03.12.2021 на сумму 495,88 тыс. рублей (УПД от 25.10.2021 № 1207, акт приемки-передачи от 24.11.2021, платежное поручение от 03.12.2021 № 599293), фактически товар поставлен 25.10.2021.

16. Контракт № 10-ОБ заключен с ООО «ТПК Мебельная фабрика» 21.07.2021 на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на поставку вешалок для сада в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района (далее – контракт № 10-ОБ).


Согласно пункту 5.1 контракта № 10-ОБ товар должен быть поставлен в полном объеме в срок с 02.08.2021 по 17.09.2021, контракт подлежит исполнению в один этап, условия не предполагают приемку работ по частям. В соответствии с пунктом 3.1 контракта, расчеты за поставленный товар производятся в течение 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке, аванс не предусмотрен. Кроме того, пунктом 3.3 контракта № 10-ОБ предусмотрено, что оплата поставленного товара производится на основании товарной накладной и счет-фактуры (или УПД).

В нарушение статьи 309 ГК РФ, пункта 3.1 контракта № 10-ОБ, согласно которому оплата должна быть произведена в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара (УПД от 21.07.2021 № 988, подписан Заказчиком 21.07.2021), Заказчиком с нарушением срока на 12 рабочих дней осуществлена оплата на сумму 20,52 тыс. рублей (платежное поручение от 23.08.2021 № 449233), а должна быть не позднее 04.08.2021.

17. Контракт № 11-ОБ заключен с ООО Дальневосточный экипировочный центр «Атлант» 21.07.2021 на поставку спортивного инвентаря в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района (далее – контракт № 11-ОБ).



Спортивный инвентарь

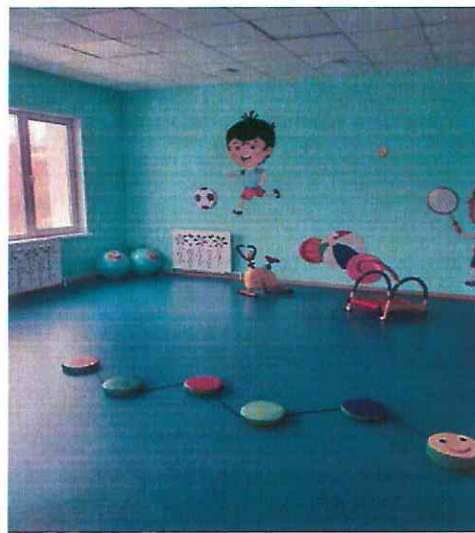

Спортивный инвентарь

Фотографии сделаны сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края 26.10.2022

В преамбуле контракта № 11-ОБ указано, что он заключен на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 04.06.2021, при этом информация о данной закупке в ЕИС отсутствует. Сведения, представленные Заказчиком в рамках проводимой проверки, содержат информацию, что контракт № 11-ОБ заключен с единственным поставщиком.

Согласно пункту 5.1 контракта № 11-ОБ товар должен быть поставлен в полном объеме в срок с 16.08.2021 по 17.09.2021, контракт подлежит исполнению в один этап, условия не предполагают приемку работ по частям. В соответствии с пунктом 3.1 контракта, расчеты за поставленный товар производятся в течение 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке, аванс не предусмотрен. Кроме того, пунктом 3.3 контракта № 11-ОБ предусмотрено, что оплата поставленного товара производится на основании товарной накладной и счет-фактуры (или УПД).

Между тем, товар поставлен Заказчику 06.10.2021 (товарная накладная от 06.10.2021 № 510), в нарушение пункта 5.1 контракта № 11-ОБ, срок поставки превышен на 19 календарных дней.

Положениями части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 7.9.3 контракта № 11-ОБ установлена обязанность Заказчика требовать уплаты неустойки в случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения Поставщиком обязательств по контракту, данные нормы носят императивный характер, являются нормами прямого действия и подлежат применению независимо от установленных условий контракта. При этом требования об уплате неустойки (пени – 0,44 тыс. рублей) Заказчиком не предъявлено. Претензионная работа не проводилась.

Приемка поставленного товара осуществлена Заказчиком 12.10.2021 (товарная накладная от 06.10.2021 № 510, акт приемки-передачи от 12.10.2021). Экспертиза проведена силами Заказчика.

В нарушение статьи 309 ГК РФ, пункта 3.1 контракта № 11-ОБ, согласно которому оплата должна быть произведена в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке поставленного

товара (товарная накладная от 06.10.2021 № 510 подписана Заказчиком 12.10.2021), Заказчиком с нарушением срока на 3 рабочих дня осуществлена оплата на сумму 103,47 тыс. рублей (платежное поручение от 08.11.2021 № 743243), а должна быть не позднее 26.10.2021.

18. Контракт № 12-ОБ с ИП Акулова Светлана Александровна 26.07.2021 на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на поставку сушилок для рук в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района (далее – контракт № 12-ОБ).

Согласно пункту 5.1 контракта № 12-ОБ товар должен быть поставлен в полном объеме в срок с даты заключения контракта по 17.09.2021, контракт подлежит исполнению в один этап, условия не предполагают приемку работ по частям. В соответствии с пунктом 3.1 контракта, расчеты за поставленный товар производятся в течение 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке, аванс не предусмотрен. Кроме того, пунктом 3.3 контракта № 12-ОБ предусмотрено, что оплата поставленного товара производится на основании товарной накладной и счет-фактуры (или УПД).

Товар поставлен Заказчику 27.07.2021 (УПД № ТТ-48 от 27.07.2021), принят Заказчиком в день поставки (УПД № ТТ-48 от 27.07.2021, акт приемки-передачи от 27.07.2021), экспертиза проведена силами Заказчика.

В нарушение статьи 309 ГК РФ, пункта 3.1 контракта № 12-ОБ, согласно которому оплата должна быть произведена в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара (УПД № ТТ-48 от 27.07.2021, подписан Заказчиком 27.07.2021), Заказчиком с нарушением срока на 7 рабочих дней осуществлена оплата на сумму 194,68 тыс. рублей (платежное поручение от 20.08.2021 № 414821), а должна быть не позднее 10.08.2021.

19. Контракт № 13-ОБ заключен с ООО «ДНС Ритейл» 04.08.2021 на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на поставку электронного оборудования в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района (далее – контракт № 13-ОБ).

В нарушение статьи 309 ГК РФ, пункта 3.1 контракта № 13-ОБ, согласно которому оплата должна быть произведена в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара (УПД № ЛТ5-000252/1055 от 05.08.2021, подписан Заказчиком 05.08.2021), Заказчиком с нарушением срока на 4 рабочих дня осуществлена оплата на сумму 413,87 тыс. рублей (платежное поручение от 26.08.2021 № 541985), а должна быть не позднее 19.08.2021.

VI. Объект «Детский сад, расположенный по адресу: Приморский край, Надеждинский район, п. Новый, ул. Молодежная, 12» (реконструкция здания) (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 31 п. Новый Надеждинского района» (далее – Заказчик).

Контракт от 08.06.2020 № 0320300028220000016 (реестровый номер 3252100576320000004), заключённый между ООО «ВЛАДВИК» (далее –

Подрядчик) и муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида № 31 п. Новый Надеждинского района» (далее – Заказчик, МБДОУ «Детский сад № 31») по выполнению работ по реконструкции здания детского сада, расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, п. Новый, ул. Молодежная, 12 (далее – контракт от 08.06.2020 № 0320300028220000016).

В соответствии с частью 1 статьи 23 Федерального закона № 44-ФЗ идентификационный код закупки указывается в плане закупок, плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а также в иных документах, предусмотренных настоящим Законом.

Раздел 8 документации электронного аукциона от 15.05.2020 № ИД 1, размещенной в ЕИС 15.05.2020 (извещение № 0320300028220000016), содержит проект контракта. В данном проекте контракта, а также в заключенном Заказчиком контракте от 08.06.2020 № 0320300028220000016 (реестровый номер 3252100576320000004), в нарушение требований части 1 статьи 23 Федерального закона № 44-ФЗ, не содержится указания на идентификационный код закупки.

В нарушение статьи 309 ГК РФ, пункта 2.9 контракта от 08.06.2020 № 320300028220000016, согласно которому оплата производится поэтапно по факту выполнения работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3):

с нарушением срока на 4 рабочих дня произведена оплата на сумму 36,21 тыс. рублей (КС-3 от 30.06.2020 № 1, платежное поручение от 28.07.2020 № 427662), оплата должна быть не позднее 22.07.2020;

с нарушением срока на 7 рабочих дней произведена оплата на сумму 44,52 тыс. рублей (КС-3 от 15.07.2020 № 2, платежное поручение от 14.08.2020 № 764527), оплата должна быть не позднее 05.08.2020;

с нарушением срока на 7 рабочих дней произведена оплата на сумму 8,49 тыс. рублей (КС-3 от 20.07.2020 № 3, платежное поручение от 19.08.2020 № 862067), оплата должна быть не позднее 10.08.2020;

с нарушением срока на 28 рабочих дней произведена оплата на сумму 1 052,62 тыс. рублей (КС-3 от 20.07.2020 № 3, платежное поручение от 17.09.2020 № 492898), оплата должна быть не позднее 10.08.2020;

с нарушением срока на 19 рабочих дней произведена оплата на сумму 1 058 тыс. рублей (КС-3 от 31.07.2020 № 4 и КС-3 от 31.07.2020 № 4-1, платежное поручение от 17.09.2020 № 492901), оплата должна быть не позднее 21.08.2020;

с нарушением срока на 19 рабочих дней произведена оплата на сумму 717,71 тыс. рублей (КС-3 от 31.08.2020 № 5, платежное поручение от 16.10.2020 № 196746), оплата должна быть не позднее 21.09.2020;

с нарушением срока на 9 рабочих дней произведена оплата на сумму 1 540,46 тыс. рублей (КС-3 от 30.09.2020 № 6, платежное поручение от 05.11.2020 № 577432), оплата должна быть не позднее 21.10.2020;

с нарушением срока на 2 рабочих дня произведена оплата на сумму 39,47 тыс. рублей (КС-3 от 30.10.2020 № 7, платежное поручение от 25.11.2020 № 74999), оплата должна быть не позднее 23.11.2020;

с нарушением срока на 3 рабочих дня произведена оплата на сумму 1,42 тыс. рублей (КС-3 от 30.11.2020 № 8, платежное поручение от 24.12.2020 № 792052), оплата должна быть не позднее 21.12.2020;

с нарушением срока на 28 рабочих дней произведена оплата на сумму 1 329,08 тыс. рублей (КС-3 от 31.01.2021 № 9, платежное поручение от 02.04.2021 № 899318), оплата должна быть не позднее 19.02.2021;

с нарушением срока на 21 рабочий день произведена оплата на сумму 57,92 тыс. рублей (КС-3 от 31.01.2021 № 9, платежное поручение от 24.03.2021 № 683150), оплата должна быть не позднее 19.02.2021;

с нарушением срока на 7 рабочих дней произведена оплата на сумму 21,35 тыс. рублей (КС-3 от 05.07.2021 № 10.1, платежное поручение от 04.08.2021 № 38189), оплата должна быть не позднее 26.07.2021;

с нарушением срока на 18 рабочих дней произведена оплата на сумму 255,87 тыс. рублей (КС-3 от 01.10.2021 № 10.2, платежное поручение от 24.11.2021 № 326112), оплата должна быть не позднее 22.10.2021;

с нарушением срока на 28 рабочих дней произведена оплата на сумму 2 647,56 тыс. рублей (КС-3 от 05.07.2021 № 10.1, платежное поручение от 02.09.2021 № 705920), оплата должна быть не позднее 26.07.2021;

с нарушением срока на 41 рабочий день произведена оплата на сумму 71,43 тыс. рублей (КС-3 от 01.10.2021 № 11, платежное поручение от 27.12.2021 № 353867), оплата должна быть не позднее 22.10.2021.

Согласно пункту 3.1 Контракта от 08.06.2020 № 0320300028220000016 обязательство по выполнению работ должно быть исполнено Подрядчиком с 08.06.2020 по 20.05.2021.

Вместе с тем, данное условие было нарушено, фактически на 21.05.2021 работы были выполнены на сумму 47 430,90 тыс. рублей (акт обследования объекта от 21.05.2021), далее с 21.05.2021 по 20.07.2021 – на сумму 2 668,91 тыс. рублей (акт о приемке выполненных работ от 05.07.2021 № 10-4), также были выполнены работы на сумму 661,62 тыс. рублей (справка о стоимости выполненных работ и затрат от 01.10.2021 № 10.2).

Согласно части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком выставлено требование об уплате неустойки от 15.10.2021 № 112 на сумму 709,63 тыс. рублей (пени на сумму 202,02 тыс. рублей и штрафа на сумму 507,61 тыс. рублей). Требование Подрядчиком не исполнено.


В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, 28.10.2021 с нарушением установленного срока на 3 рабочих дня Заказчиком в ЕИС размещена информация о начислении неустойки 15.10.2021, информация должна быть размещена не позднее 22.10.2021.

В мае 2022 года Подрядчику направлена досудебная претензия с требованием оплатить неустойку по контракту.

24.10.2022 Арбитражным судом Приморского края принято к производству исковое заявление Заказчика, возбуждено производство по делу, на 07.12.2022 назначено судебное разбирательство по делу № А51-18102/2022.

Пунктом 7.10 контракта от 08.06.2020 № 0320300028220000016 установлен размер штрафа (507,61 тыс. рублей) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, **за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства)**. Аналогичные исключения содержатся в части 8 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.


Установлен факт уклонения Подрядчика от исполнения гарантийных обязательств, устранения недостатков и дефектов, выявленных в ходе эксплуатации здания.

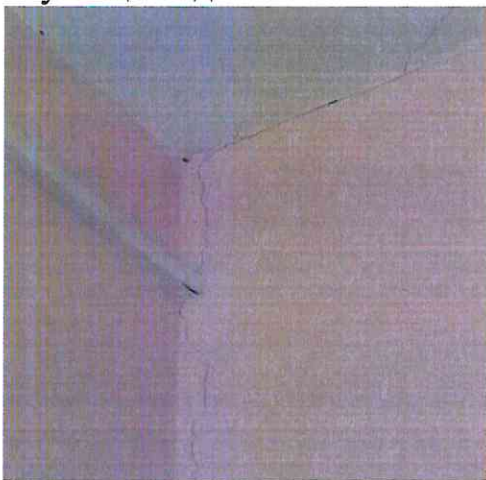

Дефект верхних слоев отделочных материалов стен



Дефект оконных откосов



Дефект верхних слоев отделочных материалов стен

Фотографии сделаны сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края 26.10.2022

05.05.2022 Подрядчику направлено извещение № 47 с просьбой направить специалистов для устранения выявленных дефектов и согласовать сроки проведения работ.

В силу пункта 6.5 контракта от 08.06.2020 № 0320300028220000016, для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан в

течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя. При этом пунктом 6.6 предусмотрено, что при отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику.

03.06.2022 комиссией в составе представителей Заказчика и Управления образования администрации Надеждинского муниципального района составлен односторонний акт о выявленных недостатках результата выполненных работ.

Требования об исполнении Подрядчиком гарантийных обязательств по контракту от 08.06.2020 № 0320300028220000016 и уплате выставленного штрафа за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, включены в ранее поданное Заказчиком исковое заявление в Арбитражный суд Приморского края.

VII. Объект капитального строительства «Детский сад № 2 на 240 мест в жилом районе Патрокл в г. Владивостоке, расположенный по адресу г. Владивосток ул. Сочинская, 14» (МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» (далее – Заказчик).

1. Контракт от 17.09.2019 № 968/291-147/19 (реестровый номер контракта 3253621852419000040) на выполнение работ по строительству объекта детского сада № 2 в жилом районе Патрокл г. Владивостоке (далее – контракт от 17.09.2019 № 968/291-147/19), на общую сумму 315 166,45 тыс. руб. (в редакции дополнительного соглашения от 29.04.2021 № 5 к контракту от 17.09.2019 № 968/291-147/19), заключенный между МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» и ООО «Вива», окончание выполнения работ по контракту 379 дней с момента его заключения (в редакции дополнительного соглашения от 01.02.2021 № 4 к контракту от 17.09.2019 № 968/291-147/19 срок выполнения работ продлен до 15.02.2021).

Соглашением о расторжении контракта от 17.09.2019 № 968/291-147/19 от 29.06.2021 стоимость выполненных работ изменена до 307 728,72 тыс. руб., работы на сумму 7 437,73 тыс. руб. не выполнялись и не оплачивались, контракт расторгнут.

Экспертиза проведена силами Заказчика, по результатам которой установлено, что подрядчик выполнил все обязательства в полном объеме, в срок и с надлежащим качеством. Работы приняты Заказчиком, оплачены в полном объеме на общую сумму 307 728,72 тыс. рублей.

VIII. Объект капитального строительства «Детский сад № 1 на 240 мест в жилом районе Патрокл в г. Владивостоке, расположенный по адресу г. Владивосток ул. Архангельская, 25» (МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» (далее – Заказчик).

1. Контракт 07.09.2021 № 968/291-77/21 (реестровый номер контракта 3253621852421000017) на поставку мебели производственного и хозяйственного назначения для объекта строительства детского сада № 1 в жилом районе Патрокл г. Владивостоке (далее – контракт от 07.09.2021

№ 968/291-77/21), на общую сумму 2 400,03 тыс. руб., заключенный между МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» и ООО «ПриМФ-Лес», сроком действия до 31.12.2021.

В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком не соблюден срок направления в реестр контрактов информации о приемке поставленного товара с приложением документа о приемке:

- товар на сумму 1 383,618 тыс. руб. принят Заказчиком по акту приема-передачи от 18.11.2021 № б/н, информация направлена 21.12.2021, а должна быть и направлена в реестр контрактов не позднее 25.11.2021, срок нарушен на 18 рабочих дней;

- товар на сумму 601,52 тыс. руб. принят Заказчиком по акту приема-передачи № б/н 29.11.2021, информация направлена 21.12.2021, а должна быть направлена в реестр контрактов не позднее 06.12.2021, срок нарушен на 11 рабочих дней;

- товар на сумму 171,85 тыс. руб. принят Заказчиком по акту приема-передачи № б/н 08.12.2021, информация направлена 21.12.2021, а должна быть направлена в реестр контрактов не позднее 15.12.2021, срок нарушен на 4 рабочих дня;

- товар на сумму 243,04 тыс. руб. принят Заказчиком по акту приема-передачи № б/н 08.12.2021, информация направлена 21.12.2021, а должна быть направлена в реестр контрактов не позднее 15.12.2021, срок нарушен на 4 рабочих дня.

2. Контракт от 09.09.2021 № 968/291-80/21 (реестровый номер контракта 3253621852421000016) на поставку мебели производственного и хозяйственного назначения для объекта строительства детского сада № 1 в жилом районе Патрокл г. Владивостоке (далее – контракт от 09.09.2021 № 968/291-80/21), на общую сумму 802,07 тыс. руб., заключенный между МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» и ООО «Евростандарт-ДВ», сроком действия до 31.12.2021.

В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком не соблюден срок направления в реестр контрактов информации о приемке поставленного товара с приложением документа о приемке. Товар на сумму 802,07 тыс. руб. принят Заказчиком по акту приема-передачи № 145 16.11.2021, информация направлена 25.11.2021, а должна быть направлена в реестр контрактов не позднее 23.11.2021, срок нарушен на 2 рабочих дня.

3. Контракт от 07.09.2021 № 968/291-76/21 (реестровый номер контракта 3253621852421000018) на поставку мебели производственного и хозяйственного назначения для объекта строительства детского сада № 1 в жилом районе Патрокл г. Владивостоке (далее – контракт от 07.09.2021 № 968/291-76/21), на общую сумму 1 113,99 тыс. руб., заключенный между МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» и ООО «ПриМФ-Мебель», сроком действия до 31.12.2021.

В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком не соблюден срок направления в реестр контрактов информации о приемке поставленного товара с приложением документа о приемке. Товар на сумму 569,03 тыс. руб. принят Заказчиком по акту приема-передачи

08.12.2021, информация направлена 21.12.2021, а должна быть направлена в реестр контрактов не позднее 15.12.2021, срок нарушен на 4 рабочих дня.

В ходе проверки закупок, заключенных с единственным поставщиком, установлены 2 случая приемки товара без проведения экспертизы соответствия поставленного товара условиям муниципального контракта, что не соответствует норме части 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ:

- по контракту от 01.09.2021 № 968/291-69/21 на поставку спортивного оборудования для объекта строительства детского сада № 1 в жилом районе Патрокл г. Владивостоке на общую сумму 120,88 тыс. руб., заключенному между МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» и ООО «СДС Групп», сроком действия до 31.12.2021;

- по контракту от 09.09.2021 № 968/291-79/21 на поставку технологического оборудования для объекта строительства детского сада № 1 в жилом районе Патрокл г. Владивостоке (далее – контракт от 09.09.2021 № 968/291-79/21), на общую сумму 98,00 тыс. руб., заключенному между МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» и ООО «ХозСервис», сроком действия до 31.12.2021.

IX. Объект капитального строительства «Детский сад по ул. Крыгина д. 84» на 120 мест (МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» (далее – Заказчик).

1. Контракт от 07.05.2019 № 968/291-69/19 (реестровый номер контракта 3253621852419000009) на выполнение работ по строительству объекта «Детского сада в районе ул. Крыгина, д. 84 в г. Владивостоке» (далее – контракт от 07.05.2019 № 968/291-69/19), на общую сумму 163 321,71 тыс. руб., заключенный между МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» и ООО СКФ «Горстрой», сроком действия контракта до 31.12.2019, а в части расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Согласно пункту 1.4 контракта от 07.05.2019 № 968/291-69/19 окончание выполнения работ по контракту – 210 дней с момента его заключения (до 02.12.2019).

В связи с нарушением подрядчиком срока выполнения обязательств по муниципальному контракту от 07.05.2019 № 968/291-69/19 Заказчиком - МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» было принято решение от 11.12.2019 №3 об одностороннем отказе исполнения муниципального контракта.

Арбитражным судом Приморского края от 01.06.2020 по делу № А51-26131/2019, решение муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» от 11.12.2019 № 3 об одностороннем отказе от исполнения договора признано судом недействительным.

Дополнительным соглашением от 10.08.2020 № 2 к контракту от 07.05.2019 № 968/291-69/19 продлен срок выполнения работ до 30.11.2020 и срок действия контракта до 31.12.2020.

Дополнительным соглашением от 08.06.2021 № 4 к контракту от 07.05.2019 № 968/291-69/19 снижена цена контракта до 157 502,40 тыс. руб.

Соглашением от 13.07.2021 о расторжении контракта от 07.05.2019 № 968/291-69/19 стороны подтвердили выполнение работ подрядчиком на общую сумму 69 516,84 тыс. руб. Контракт расторгнут в связи с невозможностью его исполнения по причине необходимости выполнения работ по корректировке проектной документации.

В период выполнения контракта, к подрядчику были применены меры ответственности на общую сумму 1 557,70 тыс. руб.

Претензия от 24.07.2019 № 2656 с требованием оплатить неустойку (пени) за нарушение сроков выполнения работ в сумме 48,20 тыс. руб. оплачена в полном объеме (платежное поручение от 09.08.2019 № 1142).

Претензия от 23.09.2019 № 3499 с требованием оплатить неустойку (пени) за нарушение сроков выполнения работ в сумме 73,78 тыс. руб. оплачена в полном объеме (платежное поручение от 29.11.2019 № 1778).

Претензия от 28.09.2020 № 2129 с требованием оплатить штраф за нарушение исполнения контрактных обязательств в сумме 100 тыс. руб. оплачена в полном объеме (платежное поручение от 14.10.2020 № 2941).

Претензия к подрядчику от 05.11.2020 № 2355, с требованием оплатить штраф за нарушение исполнения контрактных обязательств в сумме 100,00 тыс. руб., осталась без удовлетворения. Сумма штрафных санкций была удержана Заказчиком из средств, предназначенных для оплаты фактически выполненных работ подрядчиком (платежное поручение от 09.07.2021 № 558).

Претензия к подрядчику от 25.11.2020 № 2451 с требованием оплатить неустойку (пени) за нарушение сроков выполнения работ в сумме 54,43 тыс. руб. осталась без удовлетворения. Сумма штрафных санкций была удержана Заказчиком из средств, предназначенных для оплаты фактически выполненных работ подрядчиком (платежное поручение от 09.07.2021 № 559).

Претензия к подрядчику от 26.02.2021 № 330 с требованием оплатить пеню за невыполнение контрактных обязательств в сумме 1 181,28 тыс. руб. осталась без удовлетворения. Сумма штрафных санкций была удержана Заказчиком из средств, предназначенных для оплаты фактически выполненных работ подрядчиком (платежное поручение от 09.07.2021 № 557).

2. Контракт от 28.09.2021 № 968/291-87/21 (реестровый номер контракта 3253621852421000021) на выполнение работ по строительству объекта «Детского сада в районе ул. Крыгина, д. 84 г. Владивостоке» (далее – контракт от 28.09.2021 № 968/291-87/21), на общую сумму 109 440,87 тыс. руб., заключенный между МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» и ООО «Транстрой», сроком выполнения работ до 15.12.2021, срок действия контракта до 31.12.2021, а в части расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

К контракту 28.09.2021 № 968/291-87/21 заключено 8 дополнительных соглашений.

Дополнительным соглашением от 16.12.2021 № 5 к контракту от 28.09.2021 № 968/291-87/21 изменен срок выполнения работ до 01.03.2022 и срок действия контракта до 31.12.2022.

Решением Арбитражного суда Приморского края от 28.03.2022 по делу № А51-2821/2022, удовлетворены исковые требования прокуратуры Приморского края – признано недействительным дополнительное соглашение № 5 от 16.12.2021 к муниципальному контракту № 968/291-87/21 от 28.09.2021 о продлении срока выполнения работ до 01.03.2022 и срока действия муниципального контракта до 31.12.2022.

В ходе совместной работы Заказчика и Управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока по приемке объекта выявлены недостатки, которые по состоянию на 17.10.2022 устраняются подрядчиком ООО «Транстрой».

В период выполнения контракта к подрядчику были применены меры ответственности, предъявлено три претензии на общую сумму 6 257,63 тыс. рублей, из них удовлетворена одна претензия от 22.11.2021 № 2481 об оплате штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств в сумме 100,00 тыс. руб. (платежное поручение от 17.12.2021 № 3037).

Претензия к подрядчику от 15.12.2021 №2679/1 с требованием оплатить пеню за просрочку исполнения обязательств в сумме 1 630,48 тыс. руб. осталась без удовлетворения.

Претензия к подрядчику от 13.09.2022 №1307 с требованием оплатить пеню за невыполнение контрактных обязательств в сумме 4 527,15 руб. осталась без удовлетворения.

Обеспечительные меры по контракту к подрядчику не применялись, Заказчик намерен удержать штрафные санкции из средств, причитающихся подрядчику, при окончательном расчете (письмо Администрации г. Владивостока от 17.10.2022 № 17517д/27 на запрос КСП ПК).

По состоянию на 02.11.2022 на объекте, фактически введенном в эксплуатацию (акт № 1 приемки законченного строительством объекта от 24.08.2022 по форме КС 11, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 25.08.2022 №25-RU25304000-55-2022), идут ремонтные работы.

3. По контракту от 23.11.2021 № 968/291-108/21 на поставку технологического оборудования, мебель производственного и хозяйственного назначения для объекта строительства детского сада в районе ул. Крыгина, д. 84 в г. Владивостоке (далее – контракт от 23.11.2021 № 968/291-108/21), на общую сумму 564,68 тыс. руб., заключенному между МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» и ООО «ХабМашКомплект», сроком действия до 31.12.2021, установить, проводилась ли Заказчиком экспертиза поставленного товара, не предоставляется возможным, так как в документах, подтверждающих приемку-передачу товара (товарная накладная от 20.12.2021 № 58) отсутствует информация о соответствии поставленного товара условиям муниципального контракта, что является нарушением части 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

8. ВЫВОДЫ:

1. Постановлением Администрации Приморского края от 16.12.2019 № 848-па утверждена государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы (далее – ГП «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы), в состав которой включена подпрограмма № 6 «Реализация национальных проектов «Демография» и «Образование» (далее – подпрограмма № 6).

Пунктом 6.7. Приложения № 6 ГП «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы в рамках мероприятия № 7 Основное мероприятие «Федеральный проект «Содействие занятости» подпрограммы № 6 (с изменениями от 25.05.2022), предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного воспитания за счет средств федерального бюджета на 2021 год в сумме 1 085 533,80 тыс. рублей, на 2022 год – 305 235,47 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета на 2021 год – 824 522,11 тыс. рублей, на 2022 год – 293 142,27 тыс. рублей.

За 2021-2022 годы из краевого бюджета перечислены субсидии муниципальным образованиям на указанные цели в сумме 1 890 563,13 тыс. рублей (2021 год – 1 568 844,37 тыс. рублей, 2022 год – 321 718,76 тыс. рублей), из них освоено 1 716 554,48 тыс. рублей, или 90,8 % от объема предоставленных субсидий (1 890 563,13 тыс. рублей).

2. Согласно разрешениям на ввод в эксплуатацию введены в эксплуатацию:

- детский сад на 120 мест по адресу: Приморский край с. Чугуевка ул. Школьная;
- детский сад на 230 мест по адресу: г. Артем ул. Кирова, 99;
- детский сад на 150 мест в п. Новонежино Шкотовского муниципального района Приморского края;
- детский сад-ясли на 152 места в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района;
- детский сад общеразвивающего вида на 120 мест № 31 п. Новый Надеждинского района, ул. Молодежная, д. 12 (реконструкция);
- детский сад № 2 в жилом районе Патрокл в г. Владивостоке, расположенный по адресу г. Владивосток ул. Сочинская, 14, на 240 мест;
- детский сад № 1 в жилом районе Патрокл в г. Владивостоке, расположенный по адресу г. Владивосток, ул. Архангельская, 25, на 240 мест;
- детский сад по ул. Крыгина, д. 84 в г. Владивостоке, на 120 мест.

Таким образом, в ходе мероприятия установлено, что введены в эксплуатацию объекты капитального строительства, позволяющие принять 1372 ребенка, то есть результат использования субсидий достигнут.

2.1. Несмотря на разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада по ул. Крыгина, д. 84 в г. Владивостоке, на 120 мест и наличие акта приемки законченного строительства № 1 от 24.08.2022 (форма № КС-11),

подписанного представителями исполнителя работ ООО «Транстрой» и директором МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа», в ходе выездного мероприятия на объект капитального строительства сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края совместно с представителями администрации Владивостокского городского округа, с целью его осмотра выявлено, что строительные работы на объекте не прекращены, работниками подрядной организации ООО «Транстрой» выполняются строительные работы: в здании детского сада в некоторых помещениях частично демонтирован потолок, осуществляются работы по замене оконной рамы, монтажу двери кухонного лифта, а также демонтажу и замене плитки в помещении прачечной и т.д. Новое оборудование, находящееся в помещениях детского сада, не защищено от попадания пыли и мелкого строительного мусора.

На прилегающей территории находятся складированные строительные материалы и строительный мусор, фасадное покрытие здания детского сада с видимыми дефектами, частично демонтирован пол в уличных беседках, не обустроены пешеходные дорожки, а также выход с территории детского сада с западной стороны.

Фактически детский сад не эксплуатируется, приказ уполномоченного органа местного самоуправления о начале функционирования учреждения (по завершении строительства), штатное расписание, список детей, посещающих данное учреждение, приказы об организации деятельности учреждения соответственно не были предоставлены.

3. В рамках аудита в сфере закупок проведена проверка 83 исполненных контрактов на сумму 1 466 128,29 тыс. рублей.

При проведении анализа и оценки эффективности, результативности и применения обеспечительных мер и мер ответственности по контрактам и их влияние на достижение целей осуществления закупки установлено, что в проверяемом периоде Заказчиками осуществлено 29 случаев применения мер ответственности (пени и штрафов) в отношении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, на общую сумму 10 461,96 тыс. рублей.

4. По результатам предъявленных Заказчиками требований об уплате неустоек поставщиками (подрядчиками, исполнителями) было оплачено 3 125,88 тыс. рублей (29,88 %):

низкий процент оплаты предъявленных требований обусловлен непризнанием неустоек поставщиками (подрядчиками, исполнителями), а также отказами в удовлетворении заявленных требований в судебном порядке;

наибольший объем требований об уплате штрафных санкций на общую сумму 7 715,33 тыс. рублей (или 73,75 % от общей суммы предъявленных требований) был предъявлен МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа»;

основным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), к которому предъявлен наибольший объем требований, стал ООО «Транстрой» в ходе выполнения муниципального контракта на выполнение строительно-

монтажных работ по объекту «Детский сад в районе ул. Крыгина, д.84 в г. Владивостоке» от 28.09.2021 № 968/291-87/21 (реестровый № 3253621852421000021), которому было предъявлено три претензии об оплате пени за просрочку исполнения обязательств на общую сумму 6 257,63 тыс. рублей, из них удовлетворена одна претензия об оплате штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств в сумме 100,00 тыс. рублей (или 1,6 % от общей суммы предъявленных претензий).

5. В нарушение условий контрактов и положений части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ Управлением образования администрации Надеждинского муниципального района (Заказчиком) не применялись меры ответственности (пени и штрафов) в отношении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в размере 7,44 тыс. рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом².

6. В ходе аудита выявлены 80 прочих нарушений:

- несоблюдение требований к разработке, утверждению и содержанию документации (извещения) о закупке **(1 - 1,16 % от общего количества выявленных нарушений)**;

- несоответствие контракта (договора) требованиям, предусмотренным документацией (извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке участника закупки **(1 - 1,16 %)**³;

- отсутствие надлежащего обеспечения исполнения контракта (договора) **(2 – 2,3 %)**⁴;

- внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации **(1 - 1,16 %)**⁵;

- отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором), отдельного этапа поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, нарушение порядка проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором). Несоблюдение требований, предъявляемых к результатам экспертизы, экспертного заключения **(7 – 8,14 %)**⁶;

- нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору) **(44 – 51,16 %)**⁷;

- непредставление (ненаправление), несвоевременное представление (направление) информации (сведений) и (или) документов, подлежащих

² Номера контрактов с единственным поставщиком № 2-ОБ, № 6-ОБ, № 7-ОБ, № 8-ОБ, № 9-ОБ, № 11-ОБ (Надеждинский МР),

³ Реестровый номер контракта 3253400004021000051 (Чугуевский МО).

⁴ Реестровые номера контрактов 3250201218721000054, 3250201218721000058 (Артемовский ГО).

⁵ Реестровый номер контракта 3252100227220000005 (Надеждинский МР).

⁶ Реестровые номера контрактов (3250201218721000054, 3250201218721000058, 3250201218721000067 – Артемовский ГО); (3253400004021000031 – Чугуевский МО), номера договоров с единственным поставщиком (от 01.09.2021 № 968/291-69/21, от 09.09.2021 № 968/291-79/21 – по д/саду, расположенному по адресу ул. Архангельская, д. 25, от 20.09.2021 № 968/291-84/21, по д/саду, расположенному по адресу ул. Сочинская, 14, Владивостокского ГО).

⁷ 36 случаев – Надеждинский МР; 4 случая – Артемовский ГО; 2 – Чугуевский МО; Шкотовский МР – 2;

включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, или представление (направление) недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию (24 – 27,9 %).⁸

9. По результатам проведения аудита соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок заказчиками Приморского края при применении штрафных санкций в ходе исполнения контрактов (выборочно) на создание дополнительных мест для детей в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования за 2021 год и истекший период 2022 года, Контрольно-счетная палата рекомендует:

9.1. Министерству образования Приморского края, министерству строительства:

- с целью недопущения срывов сроков строительства осуществлять контроль, предусмотренный пунктом 10 части 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации и установленный Соглашениями, заключенными с муниципальными образованиями, контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий, целей, порядка предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного воспитания.

9.2. Администрациям муниципальных образований (объектам аудита) при использовании средств субсидии в рамках реализации национальных проектов:

- с целью недопущения нарушений сроков исполнения контрактов усилить контроль за соблюдением всех условий контрактов;
- обеспечить своевременность, достоверность и полноту документов и сведений, направляемых в реестр контрактов, в том числе сведений о начисленных и оплаченных неустойках в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, сведений о приемке и иных обязательных документов и сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

9.3. По результатам экспертно-аналитического мероприятия направить:

- отчет об экспертно-аналитическом мероприятии – в Законодательное Собрание Приморского края, Губернатору Приморского края;

- информационные письма:

министерству государственного финансового контроля Приморского края;

министерству строительства Приморского края;

министерству образования Приморского края;

прокуратуре Приморского края;

администрации Владивостокского городского округа;

⁸ 8 случаев – Надеждинский МР; 13 случаев - Артемовский ГО; 1 – Чугуевский МО.

администрации Артемовского городского округа;
администрации Надеждинского муниципального района;
администрации Шкотовского муниципального района;
администрации Чугуевского муниципального округа.

Приложение: перечень контрактов, проверенных в рамках аудита на 14 л. в
1 экз.

Руководитель экспертно-аналитического
мероприятия, начальник юридической
инспекции аппарата Контрольно-счетной
палаты Приморского края



И.Г. Домнич

Приложение к отчету об экспертно-аналитическом мероприятии «Аудит соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок заказчиками Приморского края при применении штрафных санкций в ходе исполнения контрактов (выборочно) на создание дополнительных мест для детей в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» за 2021 год и истекший период 2022 года»

Перечень контрактов, проверенных в рамках аудита

№п /п	Реестровый номер контракта	Дата и номер контракта	Предмет	Подрядчик	Цена контракта (тыс. рублей)	Сроки выполнения работ	Стадия исполнения
Объект «Детский сад на 120 мест по адресу: Приморский край, с. Чугуевка, ул. Школьная»							
1	3253400004 020000059	от 12.05.2020 № 012030001 662000006 6_88488	выполнение работ по строительству объекта «Детский сад на 120 мест по адресу: Приморский край, с. Чугуевка, ул. Школьная»	ООО «Трак-Сервис»	187590,13	31.10.2021	исполнен
2	3253400004 021000020	от 17.05.2021 № 012030001 662100005 0_88488	поставка оборудования для вновь строящегося объекта «Детский сад на 120 мест по адресу: Приморский край с. Чугуевка ул. Школьная»	ООО «ЛогистикУрал»	247,22	15.06.2021	исполнен
3	3253400004 021000031	от 16.06.2021 № 012030001 662100007 0_88488	поставку оборудования для вновь строящегося объекта «Детский сад на 120 мест по адресу: Приморский край с. Чугуевка ул. Школьная»	ООО «Торговое оборудование»	239,44	15.07.2021	исполнен

4	3253400004 021000033	от 21.06.2021 № 012030001 662100007 2_88488	поставку оборудования для вновь строящегося объекта «Детский сад на 120 мест по адресу: Приморский край с. Чугуевка ул. Школьная»	ООО «Офир»	1 794,99	15.07.2021	исполнен
5	3253400004 021000051	от 16.08.2021 № 012030001 662100009 6_88488	поставка мебели в рамках инвестиционн о проекта для вновь строящегося объекта «Детский сад на 120 мест по адресу: Приморский край с. Чугуевка ул. Школьная»	ООО «ПриМФ- мебель»	2488,14	15.09.2021	исполнен
6	3253400004 021000060	от 14.09.2021 № 012030001 662100011 4_88488	поставка мебели в рамках инвестиционн о проекта для вновь строящегося объекта «Детский сад на 120 мест по адресу: Приморский край с. Чугуевка ул. Школьная»	ООО «ПриМФ- Мебель»	456,28	14.10.2021	исполнен
7	3253400004 021000071	от 14.10.2021 № 012030001 662100011 9_88488	поставка мебели в рамках инвестиционн о проекта для вновь строящегося объекта «Детский сад на 120 мест по адресу: Приморский край с. Чугуевка, ул. Школьная»	ИП Люберцева М.С.	54,05	13.11.2021	исполнен
8	3253400004 021000073	от 15.10.2021 № 012030001 662100012 0_88488	поставка мебели в рамках инвестиционн о проекта для вновь строящегося объекта «Детский сад на 120 мест по адресу: Приморский	ООО «Техноимпор т»	157,73	14.11.2021	исполнен

			край с. Чугуевка ул. Школьная»				
9	3253400004 021000072	от 18.10.2021 № 012030001 662100012 3_88488	поставка мебели в рамках инвестиционног о проекта для вновь строящегося объекта «Детский сад на 120 мест по адресу: Приморский край с. Чугуевка ул. Школьная»	ИП Солдатова М.В.	623,01	17.11.2021	исполнен
10	3253400004 021000076	от 14.11.2021 № 012030001 662100012 6_88488	поставка оборудования для вновь строящегося объекта «Детский сад на 120 мест по адресу: Приморский край с.Чугуевка ул.Школьная»	ООО «Фартелит»	170,73	14.12.2021	исполнен
11	3253400004 021000075	от 17.11.2021 № 012030001 662100012 7_88488	поставка оборудования для вновь строящегося объекта «Детский сад на 120 мест по адресу: Приморский край с. Чугуевка ул. Школьная»	ООО «Панорама»	201,69	17.12.2021	исполнен
Объекты «Детский сад на 230 мест по адресу: Приморский край г. Артем ул. Кирова, 99» и «Детский сад на 230 мест, расположенный по адресу: Приморский край, г. Артем, микрорайон «Глобус-2»							
1	3250203507 120000019	от 22.07.2020 № 10А/20	на выполнение работ по строительству объекта «Детский сад на 230 мест по адресу: Приморский край г. Артем ул. Кирова, 99»	ООО «Ремонтно- Строительная компания КФК»	265137,46	30.11.2021	исполнено
2	3250203507 121000011	от 22.03.2021 № 5А/21	проведение строительного контроля за производством работ по строительству объекта: «Детский сад на 230 мест по адресу: Приморский край г. Артем ул. Кирова, 99»	ООО «АСИММЕТ РИЯ»	1 673,55	31.12.2021	исполнено

3	3250201218 721000041	от 28.06.2021 № № 38/52А	поставку стеллажей складских металлических	ЗАО «Профессион ал Сервис»	896,79	30.11.2021	исполнено
4	3250201218 721000046	от 14.07.2021 № 44/55А	на поставку оборудования (бытового, холодильного, прочего оборудования)	ЗАО «Профессион ал Сервис»	592,07	30.11.2021	исполнено
5	3250201218 721000053	от 26.07.2021 № 48/65А	поставку и монтаж ванн моечных на строящийся объект: «Детский сад на 230 мест, расположенный по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 99»	ООО «Контур ДВ»	328,09	30.11.2021	исполнено
6	3250201218 721000054	от 02.08.2021 № 46/58А	поставку оборудования для пищеблока (печь конвекционная) на строящийся объект: «Детский сад на 230 мест, расположенный по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 99	ООО «Геликон»	248,89	30.11.2021	исполнено
7	3250201218 721000055	от 03.08.2021 №50/68А	поставку и монтаж шкафов сушильных для одежды на строящийся объект: «Детский сад на 230 мест, расположенный по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 99»	ООО «Стальная Империя»	705,31	30.11.2021	исполнено
8	3250201218 721000056	от 03.08.2021 № 51/57А	поставку оборудования (бытового) на строящийся объект: «Детский сад на 230 мест, расположенный по адресу: г. Артем ул. Кирова, 99»	ИП Кириченко Юлия Николаевна	404,66	30.11.2021	исполнено
9	3250201218 721000058	от 04.08.2021 № 49/56А	на поставку оборудования (бытового) на строящийся объект: «Детский сад на 230 мест, расположенный по адресу: г.	ООО «Геликон»	909,70	30.11.2021	исполнено

			Артем ул. Кирова, 99»				
10	3250201218 721000059	от 16.08.2021 № 53/66А	на поставку мебели на деревянной на строящийся объект: «Детский сад на 230 мест, расположенный по адресу: г. Артем ул. Кирова, 99»	ООО «Примф- Мебель»	614,70	30.11.2021	исполнено
11	3250201218 721000061	от 23.08.2021 № 55/76А	на поставку мебели на деревянной на строящийся объект: «Детский сад на 230 мест, расположенный по адресу: г. Артем ул. Кирова, 99»	ООО «Примф- Мебель»	593,62	30.11.2021	исполнено
12	3250201218 721000065	от 30.08.2021 № 58/71А	на поставку мебели на строящийся объект: «Детский сад на 230 мест, расположенный по адресу: г. Артем ул. Кирова, 99»	ООО «Примф- Мебель»	813,03	30.11.2021	исполнено
13	3250201218 721000064	от 30.08.2021 № 59/79А	на поставку мебели на строящийся объект: «Детский сад на 230 мест, расположенный по адресу: г. Артем ул. Кирова, 99»	ООО «Примф- Мебель»	489,06	30.11.2021	исполнено
14	3250201218 721000067	от 01.09.2021 № 57/64А	на поставку металлической мебели хозяйственно- бытового назначения на строящийся объект: «Детский сад на 230 мест, расположенный по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 99»	ИП Гриневич Людмила Анатольевна	483,04	30.11.2021	исполнено
15	3250203507 120000021	от 07.09.2020 № 11А/20	на выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации	ООО «Бульведер»	6 345,56	27.09.2020 18.10.2020 25.12.2020	исполнено
16	3250203507 121000049	от 25.10.2021 № 12А/21	на оказание услуг по строительному	ООО «Асимметрия »	481,83	20.12.2021	исполнени е

			контролю за производством работ по строительству объекта: «Детский сад на 230 мест, расположенный по адресу: Приморский край, г. Артем, микрорайон «Глобус-2»				прекраще но
Объект: «Детский сад на 150 мест в п. Новонежино Шкотовского МР»							
1	3250301679 421000001	от 04.06.2021 № 012030001 452100002 10001	поставка оборудования для пищеблока строящегося дошкольного образовательного учреждения на 150 мест, расположенного по адресу: Приморский край Шкотовский район пос. Новонежино ул. Авиаторов, 25	ООО «Снабженец»	1977,30	31.08.2021	исполнен
2	3250301679 421000002	325030167 942100000 2	поставка технологического оборудования для строящегося дошкольного образовательного учреждения на 150 мест, расположенного по адресу: Приморский край Шкотовский район пос. Новонежино ул. Авиаторов, 25	ООО «Снабженец»	948,59	31.08.2021	исполнен
3	3250301679 421000004	от 22.06.2021 № 012030001 452100002 50001	поставка мебели для строящегося дошкольного образовательного учреждения на 150 мест, расположенного по адресу: Приморский край Шкотовский район пос. Новонежино ул. Авиаторов, 25	ООО «Примф-лес»	1159,09	30.09.2021	исполнен

4	3250301679 421000005	от 21.06.2021 № № 012030001 452100002 40001	поставка игровой и детской мебели для строящегося дошкольного образовательного учреждения на 150 мест, расположенного по адресу: Приморский край Шкотовский р-он пос. Новонежино ул. Авиаторов, 25	ООО «ПриМФ-лес»	1202,25	30.09.2021	исполнен
5	3250301679 421000006	от 26.07.2021 № № 012030001 452100002 60001	поставка малых архитектурных форм для строящегося дошкольного образовательного учреждения на 150 мест, расположенного по адресу: Приморский край Шкотовский р-он пос. Новонежино ул. Авиаторов, 25	ИП Туптин В.А.	8817,34	30.09.2021	исполнен
6	3250301679 420000002	от 17.04.2020 № № 012030001 452000003 50002	выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Здание дошкольного образовательного учреждения в с. Новонежино на 150 мест»	ООО «Региональное предприятие механизации строительного производства»	203114,92	30.11.2021	исполнен
Надеждинский муниципальный район							
<u>Управление образования администрации Надеждинского муниципального района</u>							
1	3252100227220 000005	от 17.04.2020 № 03203000282 20000014, срок исполнения 1 квартал 2022 года	214 078,53	Выполнению строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство детского сада-ясли в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района»	ООО МСП»	«РП	Исполнение завершено
2	3252100227221 000004	от 01.06.2021 № 03203000282 21000002_2138 56, срок исполнения 20.08.2021	1 382, 64	Поставка мебели в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно-Надеждинское	ООО «ПриМФ-мебель»		Исполнение завершено

				Надеждинского района		
3	3252100227221 000005	от 01.06.2021 № 03203000282 21000003_2138 56, срок исполнения 20.08.2021	183,08	Поставка мебели в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно- Надеждинское Надеждинского района	ООО «ПриМФ- мебель»	Исполнение завершено
4	3252100227221 000006	от 15.06.2021 № 03203000282 21000004_2138 56, срок исполнения 20.08.2021	523,50	Поставка стеллажей и шкафов металлических в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно- Надеждинское Надеждинского района	ООО «Контур ДВ»	Исполнение завершено
5	3252100227221 000007	от 29.06.2021 № 03203000282 21000007_2138 56, срок исполнения 20.08.2021	609,97	Поставка шкафов холодильных и кухонного оборудования в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно- Надеждинское Надеждинского района	ООО «Панорама»	Исполнение завершено
6	3252100227221 000008	от 02.07.2021 № 03203000282 21000008_2138 56, срок исполнения 17.09.2021	531,80	Поставка мебели для пищеблока и прачечной в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно- Надеждинское Надеждинского района	ООО «Контур ДВ»	Исполнение завершено
7	3252100227221 000003	от 29.04.2021 № 1-УИС, срок исполнения 20.08.2021	411,54	Поставка мебели в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно- Надеждинское Надеждинского района	ФКУ ИК-41 ГУФСИН России по ПК	Исполнение завершено
8	Закупка у единственного поставщика	от 17.07.2021 № 1-ОБ, срок исполнения 17.09.2021	382,78	Поставка медицинского оборудования в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно- Надеждинское Надеждинского района	ООО «МедПрофи»	Исполнение завершено

9	Закупка у единственного поставщика	от 14.07.2021 № 2-ОБ, срок исполнения 06.09.2021	39,47	Поставка противопожарного оборудования в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно- Надеждинское Надеждинского района	ООО «Океан Строй»	Исполнение завершено
10	Закупка у единственного поставщика	от 14.07.2021 № 3-ОБ, срок исполнения 17.09.2021	109,23	Поставка музыкального оборудования в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно- Надеждинское Надеждинского района	ООО «Компания Джаз»	Исполнение завершено
11	Закупка у единственного поставщика	от 14.07.2021 № 4-ОБ, срок исполнения 17.09.2021	342,69	Поставка холодильного оборудования в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно- Надеждинское Надеждинского района	ООО «Панорама»	Исполнение завершено
12	Закупка у единственного поставщика	от 14.07.2021 № 5-ОБ, срок исполнения 17.09.2021	360,06	Поставка кухонного и прачечного оборудования в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно- Надеждинское Надеждинского района	ООО «Панорама»	Исполнение завершено
13	Закупка у единственного поставщика	от 15.07.2021 № 6-ОБ, срок исполнения 17.09.2021	18,33	Поставка кухонного инвентаря в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно- Надеждинское Надеждинского района	ООО «Ресто Владивосток»	Исполнение завершено
14	Закупка у единственного поставщика	от 19.07.2021 № 7-ОБ, срок исполнения 17.09.2021	237,20	Поставка стеллажей и столов в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно- Надеждинское Надеждинского района	ООО «Контур- ДВ»	Исполнение завершено

15	Закупка у единственного поставщика	от 21.07.2021 № 8-ОБ, срок исполнения 01.10.2021	515,9	Поставка шкафов сушильных в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно- Надеждинское Надеждинского района	ООО «Трудовик»	Исполнение завершено
16	Закупка у единственного поставщика	от 21.07.2021 № 9-ОБ, срок исполнения 01.10.2021	495,88	Поставка оборудования в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно- Надеждинское Надеждинского района	ООО «Трудовик»	Исполнение завершено
17	Закупка у единственного поставщика	от 21.07.2021 № 10-ОБ, срок исполнения 17.09.2021	20,52	Поставка вешалок в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно- Надеждинское Надеждинского района	ООО «ТПК Мебельная Фабрика»	Исполнение завершено
18	Закупка у единственного поставщика	от 21.07.2021 № 11-ОБ, срок исполнения 17.09.2021	103,47	Поставка спортивного инвентаря в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно- Надеждинское Надеждинского района	ООО Дальневосточн ый экипировочны й центр «Атлант»	Исполнение завершено
19	Закупка у единственного поставщика	от 26.07.2021 № 12-ОБ, срок исполнения 17.09.2021	194,68	Поставка сушилок для рук в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно- Надеждинское Надеждинского района	ИП Акулова С.А.	Исполнение завершено
20	Закупка у единственного поставщика	от 04.08.2021 № 13-ОБ, срок исполнения 30.09.2021	413,87	Поставка электронного оборудования в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно- Надеждинское Надеждинского района	ООО «ДНС Ритейл»	Исполнение завершено
21	Закупка у единственного поставщика	от 22.11.2021 № 14-ОБ, срок исполнения 10.12.2021	80,25	Поставка поручней в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно- Надеждинское Надеждинского района	ИП Дудка А.А.	Исполнение завершено

22	Закупка у единственного поставщика	от 13.12.2021 № 15-ОБ, срок исполнения 20.12.2021	359,62	Поставка оборудования в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно- Надеждинское Надеждинского района	ООО «Трудовик»	Исполнение завершено
23	Закупка у единственного поставщика	от 13.12.2021 № 16-ОБ, срок исполнения 20.12.2021	129,93	Поставка электронного оборудования в рамках строительства детского сада-ясли в с. Вольно- Надеждинское Надеждинского района	ООО «Альфа»	Исполнение завершено
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 31 п. Новый Надеждинского района»						
24	3252100576320 000004	от 08.06.2020 № 0320300028220 000016, срок исполнения 20.05.2021	53 622,67	Выполнение работ по реконструкции здания детского сада, расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, п. Новый, ул. Молодежная, 12	ООО «ВЛАДВИК»	Исполнение завершено
Владивостокский городской округ						
Объект объекта «Детский сад № 1 в жилом районе Патрокла г. Владивосток»						
1	Электронный аукцион от 27.09.2021 № 0320300113621 000018	от 18.10.2021 № 968/291- 95/21 Реестровый № <u>3253621852421</u> 000023 Исполнение до 23.12.2021	1900,28	Поставка технологического оборудования	ИП Ситников Анатолий Алексеевич	Исполнение завершено
2	Электронный аукцион От 10.08.2021 № 0320300113621 000013	от 07.09.2021 №968/291- 77/21 Реестровый № <u>3253621852421</u> 000017 Исполнение до 21.12.2021	2400,03	Поставка мебели производственног о и хозяйственного назначения	ООО «ПриМФ- Лес»	Исполнение завершено
3	Электронный аукцион от 10.08.2021 № 0320300113621 000012	от 09.09.2021 968/291-80/21 Реестровый № <u>3253621852421</u> 000016 Исполнение до 12.11.2021	802,07	Поставка мебели производственног о и хозяйственного назначения	ООО «Евростандарт- ДВ»	Исполнение завершено
		от 07.09.2021 968/291-76/21	1113,99	Поставка мебели производственног	ООО «ПриМФ- Мебель»	Исполнение завершено

4	Электронный аукцион от 06.08.2021 № 0320300113621000011	Реестровый № <u>3253621852421000018</u> Исполнение до 21.12.2021		о и хозяйственного назначения		
5	п. 4 ч. 1 ст. 93	От 01.09.2021 №968/291-69/21 Исполнение до 31.12.2021	120,88	Поставка спортивного оборудования	ООО «СДС Групп»	Исполнение завершено
6	п. 4 ч. 1 ст. 93	От 02.09.2021 №968/291-70/21 Исполнение до 31.12.2021	97,36	Поставка медицинского оборудования	ООО «Мудрой»	Исполнение завершено
7	п. 4 ч. 1 ст. 93	От 09.09.2021 №968/291-79/21 Исполнение до 31.12.2021	98,00	Поставка технологического оборудования	ООО «Хозсервис»	Исполнение завершено
8	п. 4 ч. 1 ст. 93	От 08.10.2021 №968/291-94/21 Исполнение до 31.12.2021	122,26	Поставка оборудования	ООО «Оборудование сервис»	Исполнение завершено
9	п. 4 ч. 1 ст. 93	От 02.09.2021 №968/291-67/21 Исполнение до 31.12.2021	121,15	Поставка медицинского оборудования	ООО «Метпрофи»	Исполнение завершено
10	п. 4 ч. 1 ст. 93	От 01.09.2021 №968/291-66/21 Исполнение до 31.12.2021	162,00	Поставка мебели производственного о и хозяйственного назначения	ООО «ИмпортТорг»	Исполнение завершено
11	п. 4 ч. 1 ст. 93	От 20.09.2021 №968/291-84/21 Исполнение до 31.12.2021	599,23	Поставка технологического оборудования	ООО «ХабМашКомплект»	Исполнение завершено
12	п. 4 ч. 1 ст. 93	От 01.09.2021 №968/291-68/21 Исполнение до 31.12.2021	193,98	Поставка мебели производственного о и хозяйственного назначения	ООО «Офис-Владивосток»	Исполнение завершено
Объект объекта «Детский сад № 2 в жилом районе Патрокла г. Владивосток»						
1	Электронный аукцион от 16.11.2020 № 0320300113620000023	от 10.12.2020 № 968/291-170/20 Реестровый № <u>3253621852420000024</u> Исполнение до 30.03.2021	398,50	Поставка технологического оборудования	ООО «Уралмет»	Исполнение завершено
2	Электронный аукцион от 24.11.2020 № 0320300113620000025	от 21.12.2020 № 968/291-178/20 Реестровый № <u>3253621852420000027</u>	498,66	Поставка технологического оборудования	ЗАО «Профессионал сервис»	Исполнение завершено

		Исполнение до 06.04.2021				
3	Электронный аукцион от 22.08.2019 № 03203001136 19000042	от 17.09.2019 № 968/291-147/19 Реестровый № <u>3253621852419000040</u> Исполнение до 30.04.2021	307 728,72	Строительство объекта «Детский сад № 2 в жилом районе Патрокла г. Владивосток»	ООО «Вива»	Исполнение завершено
4	п. 4 ч. 1 ст. 93	от 02.09.2021 № 968/291-74/21 Исполнение до 31.12.2021	594,90	Поставка мебели производственного и хозяйственного назначения	ООО «Офислайн»	Исполнение завершено
5	п. 4 ч. 1 ст. 93	от 02.09.2021 № 968/291-75/21 Исполнение до 31.12.2021	539,76	Поставка мебели производственного и хозяйственного назначения	ООО «Офислайн»	Исполнение завершено
Объект объекта «Детский сад на ул. Крыгина, 84 г. Владивосток»						
1	Электронный аукцион от 01.04.2019 № 03203001136 19000009	от 07.05.2019 № 968/291-69/19 Реестровый № <u>3253621852419000009</u> Исполнение до 13.07.2021	69 516,84	Выполнение строительно-монтажных работ	ООО СКФ «Горстрой»	Исполнение прекращено
2	Электронный аукцион от 08.09.2021 № 03203001136 21000016	от 28.09.2021 № 968/291-87/21 Реестровый № <u>3253621852421000021</u> Исполнение до 15.12.2021	109 440,87	Выполнение строительно-монтажных работ	ООО «Транстрой»	На исполнении
3	п. 4 ч. 1 ст. 93	от 01.12.2021 № 968/291-138/21 Исполнение до 31.12.2021	81,00	Поставка мебели производственного и хозяйственного назначения	ООО «Импорт Торг Компани»	Исполнение завершено
4	п. 4 ч. 1 ст. 93	от 06.12.2021 № 968/291-146/21 Исполнение до 31.12.2021	54,00	Поставка технологического оборудования	ООО «Дэстор»	Исполнение завершено
5	п. 4 ч. 1 ст. 93	от 06.12.2021 № 968/291-147/21 Исполнение до 31.12.2021	452,65	Поставка технологического оборудования	ООО «Хозсервис»	Исполнение завершено
6	п. 4 ч. 1 ст. 93	от 06.12.2021 № 968/291-149/21 Исполнение до 31.12.2021	458,60	Поставка технологического оборудования	ООО «Хозсервис»	Исполнение завершено
	п. 4 ч. 1 ст. 93	от 06.12.2021 № 968/291-150/21	563,95		ООО «Хозсервис»	Исполнение завершено

7		Исполнение до 31.12.2021		Поставка технологического оборудования		
8	п. 4 ч. 1 ст. 93	от 23.11.2021 № 968/291-108/21 Исполнение до 31.12.2021	564,68	Поставка технологического оборудования, мебели производственного и хозяйственного назначения	ООО «ХабМашКомплект»	Исполнение завершено
9	п. 4 ч. 1 ст. 93	от 26.11.2021 № 968/291-115/21 Исполнение до 31.12.2021	396,04	Поставка медицинской мебели и оборудования	ООО «МедПрофи»	Исполнение завершено

Руководитель экспертно-аналитического мероприятия, начальник юридической инспекции аппарата Контрольно-счетной палаты Приморского края



И.Г. Домнич
