



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Алеутская, д. 45а, г. Владивосток, 690091
Тел.: (423) 243-32-60, факс: (423) 243-32-60
E-mail: pk@ksp25.ru
ОКПО 38557372, ОГРН 1122540000670
ИНН/КПП 2540178592/254001001

Председателю
Законодательного Собрания
Приморского края

А.И. Ролику

22.08.2019 № 01-27/02-01/840

На № _____ от _____

Уважаемый Александр Иванович!

На основании Закона Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ «О Контрольно-счетной палате Приморского края» и предложения Совета контрольно-счётных органов Приморского края, Контрольно-счетной палатой Приморского края и контрольно-счетными органами муниципальных образований Приморского края проведено совместное контрольное мероприятие «Реализация подпрограммы «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края на 2017 год» государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 – 2020 годы (2017 год); государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018 – 2024 годы (2018 год – истекший период 2019 года)», в результате которого установлено следующее.

Размер бюджетных ассигнований, утвержденный Законами Приморского края о краевом бюджете на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды муниципальных образований Приморского края, в проверяемом периоде составил в общей сумме 2 798 524,7 тыс. рублей, в том числе:

на 2017 год – 485 966,6 тыс. рублей;

на 2018 год – 466 549,2 тыс. рублей;

на 2019 год – 1 846 008,9 тыс. рублей.

Наряду с ежегодным увеличением доли финансового участия федерального бюджета: 2017 год – 83 %, 2018 год – 88 %, 2019 год – 98 %, в 2019 году Приморским краем приняты обязательства, почти в 2 раза превышающие объем бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета (ФБ - 618 535,7 тыс. рублей, КБ - 1 227 473,2 тыс. рублей).

Кассовое исполнение мероприятий по благоустройству территорий в 2017 году составило 548 284,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 385 062,9 тыс. рублей; за счет средств краевого

Законодательное Собрание
Приморского края
Управление делопроизводства и
всех дел
Входящий № 16/3981
Дата: 23.08.2019 Время: 14:52

бюджета – 86 851,5 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - 76 370,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий по благоустройству территорий в **2018 году** составило 545 761,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 409 384,2 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета – 55 825,1 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов составило 70 142,1 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств – 10 410,5 тыс. рублей.

В 2017 году в Приморском крае благоустроено 254 дворовые территории, 58 территорий общего пользования и 6 городских парков. В 2018 году благоустроено 139 дворовых территорий, 55 территорий общего пользования и 5 городских парков.

Контрольным мероприятием отмечено отсутствие комплексного подхода к решению вопросов благоустройства, в результате чего остались не решенными проблемы, связанные с не обустроенностью как придомовых, так и общественных территорий и территорий парков.

По 27 придомовым территориям Владивостокского городского округа из 44, по которым в 2018 году выполнено асфальтирование и устройство детских площадок, имеется потребность в устройстве освещения, по 5 дворовым территориям, на которых выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия, отсутствуют детские площадки, на 13 территориях из 24, по которым выполнено устройство детских площадок в неудовлетворительном состоянии находятся дороги и тротуары.

Кроме того контрольным мероприятием установлено, что в г. Владивостоке не решается вопрос устройства (реконструкции) водоотводных сооружений, что не позволяет достигнуть должного уровня комфорта при реализации мероприятий по благоустройству придомовых территорий.

В Уссурийском городском округе выполнены работы по благоустройству сквера имени В. Кузьменчука, что позволило создать новую общественную территорию, имеющую завершенный и эстетически привлекательный внешний вид. В то же время жители городского округа отмечают, что отсутствие общественных туалетов на территории сквера свидетельствует о том, что надлежащий уровень комфорта благоустроенной территорий не достигнут.

При осмотре выполненных работ контрольным мероприятием установлены факты некачественно выполненных работ: по Артемовскому, Владивостокскому, Дальнегорскому, Дальнереченскому, Лесозаводскому, Находкинскому, Партизанскому, Уссурийскому городским округам, городскому округу Спасск-Дальний, Кавалеровскому городскому поселению, Чугуевскому сельскому поселению: повреждения, разрушение асфальтобетонного покрытия; отсутствие планировки территорий детских площадок (крутые уклоны, наличие крупных, острых камней).

Кроме этого установлены факты повреждений и кражи элементов благоустройства неустановленными лицами.

Результаты анкетирования граждан, проведенного контрольно-счетными органами муниципальных образований в период проведения совместного контрольного мероприятия, позволяют сделать вывод, что в целом удовлетворенность населения проводимыми мероприятиями по формированию современной городской среды выше среднего уровня – по большинству муниципальных образований выше 4 баллов (по 5-балльной шкале).

При этом жители ряда муниципальных образований дали более сдержанные оценки:

средняя оценка участников опроса в Чугуевском сельском поселении составила 2,8 балла, в Кавалеровском городском поселении – от 1,2 до 1,5 балла;


менее 50 % респондентов в Спасском городском округе оценили уровень благоустройства придомовых территорий на 4 и 5 баллов;

негативные отзывы в отношении выполненных в 2018 году работ по благоустройству придомовых территорий и первому этапу благоустройства сквера «Планета» и парка «Ружино» получены от жителей Лесозаводского городского округа.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Приморского края внесено представление и.о. директора департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Бабичу В.А., контрольно-счетными органами муниципальных образований Приморского края внесены представления главам муниципальных образований Приморского края. Отчет о совместном контрольном мероприятии направлен Губернатору Приморского края и в прокуратуру Приморского края.

Приложение: Отчет о совместном контрольном мероприятии на 110 л. в 1 экз.

Председатель



Ю.В. Высоцкий

ОТЧЕТ
О СОВМЕСТНОМ КОНТРОЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ
«Реализация подпрограммы «Формирование современной городской
среды муниципальных образований Приморского края на 2017 год»
государственной программы Приморского края «Обеспечение
доступным жильем и качественными услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 – 2020
годы (2017 год); государственной программы Приморского края
«Формирование современной городской среды муниципальных
образований Приморского края» на 2018 – 2024 годы (2018 год –
истекший период 2019 года)»
(утвержден коллегией Контрольно-счетной палаты Приморского края
(протокол от «19» августа 2019 года № 10)

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.5.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2019 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края от 25.12.2018 № 131-П (в редакции решения коллегии Контрольно-счетной палаты, протокол от 18.04.2019 № 4), решение о проведении совместного контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Приморского края и контрольно-счетными органами муниципальных образований Приморского края от 22.04.2019, дополнительное соглашение от 19.08.2019 к решению о проведении совместного контрольного мероприятия, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края от 29.04.2019 № 20.

2. Предмет контрольного мероприятия: порядок выделения и использования средств субсидий бюджетами муниципальных образований Приморского края на реализацию подпрограммы «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края на 2017 год» государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2020 годы (2017 год); государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018 - 2024 годы (2018 год – истекший период 2019 года).

3. Объекты контрольного мероприятия: департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, администрации Арсеньевского, Артемовского, Дальнегорского, Лесозаводского, Находкинского, Партизанского, Уссурийского городских округов, городского округа Спасск-Дальний, Кавалеровского городского поселения, Владимиро-Александровского, Екатериновского, Золотогорского, Новицкого, Сергеевского сельских поселений Партизанского муниципального района, Чугуевского сельского поселения, управление содержания жилищного фонда и управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока, муниципальное

казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа».

4. Проверяемый период деятельности: 2017 - 2018 годы и истекший период 2019 года.

5. Срок проведения контрольного мероприятия с 29.04.2019 по 19.08.2019.

6. Цели совместного контрольного мероприятия:

6.1. Определить обоснованность принятия решений и своевременность направления бюджетных средств в форме субсидий бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение мероприятий по улучшению состояния придомовых территорий муниципальных образований Приморского края, по повышению уровня благоустройства территорий общего пользования (общественных территорий) муниципальных образований Приморского края, по формированию (обустройству) мест массового отдыха населения (городских парков), по формированию (обустройству) детских и спортивных площадок.

6.2. Оценить законность, эффективность использования средств, выделенных в форме субсидий бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение реализации мероприятий по формированию современной городской среды муниципальных образований Приморского края в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года.

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Цель 1. Определить обоснованность принятия решений и своевременность направления бюджетных средств в форме субсидий бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение мероприятий по улучшению состояния придомовых территорий муниципальных образований Приморского края, по повышению уровня благоустройства территорий общего пользования (общественных территорий) муниципальных образований Приморского края, по формированию (обустройству) мест массового отдыха населения (городских парков), по формированию (обустройству) детских и спортивных площадок.

1.1. Государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»¹, запланирована реализация Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – Приоритетный проект).

¹ утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 393)

Целью Приоритетного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации.

В целях реализации Приоритетного проекта в 2017 году Минстроем России заключены с Администрацией Приморского края соглашения:

- о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Приморского края на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды от 16.02.2017 № 069-08-482 (далее – Соглашение от 16.02.2017);

- о предоставлении субсидии бюджету Приморского края из федерального бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) от 12.02.2017 № 069-08-284 (далее – Соглашение от 12.02.2017).

Во исполнение условий, предусмотренных Соглашениями от 16.02.2017 и от 12.02.2017, государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 – 2020 годы² дополнена подпрограммой № 10 «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2017 год³ (далее – Подпрограмма № 10).

На период 2018 – 2025 годы постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710⁴ утверждена новая государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Федеральная программа).

В целях реализации Приоритетного проекта, предусмотренного Федеральной программой, Минстроем России заключены с Администрацией Приморского края соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Приморского края в 2018 году:

² утверждена постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 – 2020 годы»

³ постановление Администрации Приморского края от 15.03.2017 № 74-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 – 2020 годы»

⁴ «Об утверждении государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

- на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды от 12.02.2018 № 069-08-2018-008 (далее – Соглашение от 12.02.2018);

- на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) от 09.02.2018 № 069-08-2018-321 (далее – Соглашение от 09.02.2018).

В рамках исполнения Соглашений от 12.02.2018 и от 09.02.2018 постановлением Администрации Приморского края от 31.08.2017 № 356-па⁵ утверждена государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018 – 2022 годы (далее – Государственная программа).

Управление Государственной программой осуществляется ответственным исполнителем - департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края (далее – Департамент).

Целью Государственной программы является повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий муниципальных образований Приморского края.

Цель Государственной программы достигается путем решения задач Государственной программы:

- улучшение состояния придомовых территорий муниципальных образований Приморского края;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципальных образований Приморского края;

- формирование (обустройство) мест массового отдыха населения (городских парков).

Мероприятия Государственной программы реализуются посредством предоставления субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204⁶ (далее - Указ Президента Российской Федерации № 204) определены национальные цели развития Российской Федерации на период до 2024 года для осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

⁵ «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018 – 2022 годы»

⁶ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Российской Федерации № 204 при разработке национального проекта в сфере городской среды Правительство Российской Федерации должно исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 %, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в 2 раза, а также создать механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 %.

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам утвержден паспорт национального проекта «Жилье и городская среда»⁷ (далее – Национальный проект), в состав которого включен федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (далее – Федеральный проект).

Между Минстроем России, осуществляющим функции руководителя федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», и Департаментом, осуществляющим функции руководителя регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Приморский край)» (далее – региональный проект), заключено соглашение о реализации регионального проекта от 01.02.2019 № 069-2019-F20036-1 (далее – Соглашение от 01.02.2019).

В соответствии с пунктом 2.2.1 Соглашения от 01.02.2019 руководитель регионального проекта обеспечивает наличие утвержденной государственной программы Субъекта, в которой региональный проект, соответствующий федеральному проекту, обособлен в виде отдельного(ых) структурного(ых) элемента(ов) государственной(ых) программы(м) Субъекта.

В соответствии с абзацем восьмым пункта 2.2.2.4. Порядка принятия решений о разработке государственных программ Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2014 № 566-па⁸ (в редакции постановления Администрации Приморского края от 07.05.2019 № 272-па), региональные (федеральные) проекты подлежат включению в государственную программу как основное мероприятие.

Постановлением Администрации Приморского края от 08.02.2019 № 69-па⁹ продлен срок реализации Государственной программы до 2024

⁷ протокол от 24.12.2018 № 16

⁸ «Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных программ Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края»

⁹ «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 31.08.2017 № 356-па «Об утверждении государственной программы Приморского края

года, структура Государственной программы дополнена подпрограммой № 2 «Благоустройство территорий муниципальных образований Приморского края» на 2019 – 2024 годы.

В нарушение пункта 2.2.2.4. порядка принятия решений о разработке государственных программ Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2014 № 566-па¹⁰ (в редакции постановления Администрации Приморского края от 07.05.2019 № 272-па), пункта 2.2.1 Соглашения от 01.02.2019 Департаментом не обеспечено включение в Государственную программу регионального проекта, как основного мероприятия Государственной программы.

Мероприятия Государственной программы реализуются посредством предоставления субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края (далее – субсидии из краевого бюджета):

на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды;

на поддержку муниципальных программ в сфере благоустройства территорий.

В соответствии с пунктом 2.1.2 Соглашения от 01.02.2019 Минстроем России заключено с Администрацией Приморского края соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 11.02.2019 № 069-09-2019-125 (далее – Соглашение от 11.02.2019).

Предметом Соглашения от 11.02.2019 является предоставление из федерального бюджета в 2019 году бюджету Приморского края субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.

Пунктом 6.1.1 указанного Соглашения Департамент определен уполномоченным органом исполнительной власти Субъекта, осуществляющим взаимодействие с Министерством, на который со стороны

«Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018 – 2022 годы»

¹⁰ «Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных программ Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края»

Субъекта возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) Соглашения и предоставлению отчетности.

1.2. Размер бюджетных ассигнований, утвержденный Законами Приморского края о краевом бюджете на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды муниципальных образований Приморского края в проверяемом периоде, составил в общей сумме 2 798 524,7 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по данному направлению, утвержденные Законами Приморского края на 2017 - 2018 годы, соответствуют программным назначениям, предусмотренным Подпрограммой № 10¹¹ и Государственной программой¹² соответственно.

Бюджетные ассигнования по данному направлению, утвержденные Законом Приморского края на 2019 год, на 14 850,0 тыс. рублей превышают размер назначений, предусмотренных Государственной программой¹³.

Информация об объеме утвержденных бюджетных ассигнований приведена в таблице.

Наименование мероприятия	Источник	Объем финансирования, тыс. рублей			
		предусмотрено бюджетом на 2017 год (в ред. Закона Приморского края от 09.10.2017 № 171-КЗ)	предусмотрен о бюджетом на 2018 год (в ред. Закона Приморского края от 07.03.2018 № 241-КЗ)	предусмотрено бюджетом на 2019 год (в ред. Закона Приморского края от 31.05.2019 № 507-КЗ)	Всего
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды	Всего	459 884,1	452 714,2	631 158,9	1 543 757,2
	ФБ	381 703,8	398 388,5	618 535,7	1 398 628,0
	КБ	78 180,3	54 325,7	12 623,2	145 129,2
Дополнительная субсидия бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств краевого бюджета	КБ	11 262,6			11 262,6
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	Всего	14 819,9	13 835,0		28 654,9
	ФБ	12 300,5	12 174,8		24 475,3
	КБ	2 519,4	1 660,2		4 179,6

¹¹ в редакции постановления Администрации Приморского края от 29.11.2017 № 487-па

¹² в редакции постановления Администрации Приморского края от 07.06.2018 № 272-па

¹³ в редакции постановления Администрации Приморского края от 08.02.2019 № 69-па

Наименование мероприятия	Источник	Объем финансирования, тыс. рублей			
		предусмотрено бюджетом на 2017 год (в ред. Закона Приморского края от 09.10.2017 № 171-КЗ)	предусмотрен о бюджетом на 2018 год (в ред. Закона Приморского края от 07.03.2018 № 241-КЗ)	предусмотрено бюджетом на 2019 год (в ред. Закона Приморского края от 31.05.2019 № 507-КЗ)	Всего
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию объектов благоустройства (в том числе проектно-изыскательские работы), находящиеся в муниципальной собственности	КБ			14 850,0	14 850,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края	КБ			1 200 000,0	1 200 000,0
Итого:	Всего	485 966,6	466 549,2	1 846 008,9	2 798 524,7
	ФБ	394 004,3	410 563,3	618 535,7	1 423 103,3
	КБ	91 962,3	55 985,9	1 227 473,2	1 375 421,4

В результате анализа данных, приведенных в таблице, видно, что объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Приморского края на финансовое обеспечение расходного обязательства, направленного на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды муниципальных образований Приморского края, в 2019 году (1 846 008,9 тыс. рублей) в 3,8 раза превышает объем бюджетных ассигнований, утвержденных в 2017 году (485 966,6 тыс. рублей).

Наряду с ежегодным увеличением доли финансового участия федерального бюджета: 2017 год – 83 %, 2018 год – 88 %, 2019 год – 98 %, в 2019 году Приморским краем приняты обязательства, почти в 2 раза превышающие объем бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета.

1.3. Приложениями к Подпрограмме № 10 и Государственной программе утверждены правила предоставления и расходования субсидий (далее – Правила предоставления и расходования субсидий), устанавливающие порядок, цели, условия предоставления и распределения субсидий, а также критерии отбора муниципальных образований Приморского края для предоставления субсидий:

правила предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2017 году¹⁴ (далее – Правила № 1);

правила предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2017 году¹⁵ (далее – Правила № 2);

правила предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018 году¹⁶ (далее – Правила № 3);

правила предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2018 году¹⁷ (далее – Правила № 4);

правила предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды¹⁸ (далее – Правила № 5);

правила предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края¹⁹ (далее – Правила № 6).

¹⁴ Приложение № 39 к государственной программе Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2021 годы

¹⁵ Приложение № 40 к государственной программе Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2021 годы

¹⁶ Приложение № 4 к государственной программе Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018 – 2022 годы

¹⁷ Приложение № 5 к государственной программе Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018 – 2022 годы

¹⁸ Приложение № 14 к государственной программе Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018 – 2024 годы

¹⁹ Приложение № 15 к государственной программе Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018 – 2024 годы

Департаментом и муниципальными образованиями выполнены все условия предоставления субсидий, закрепленные Правилами предоставления и расходования субсидий.

Вместе с тем, не исполнены отдельные обязательства, предусмотренные условиями предоставления субсидий.

1. Письменные обязательства глав 57 муниципальных образований в 2017 году и 10 муниципальных образований в 2018 году, предоставленные в Департамент для получения субсидии в соответствии с абзацем пятым пункта 5 Правил № 1 и абзацем седьмым пункта 5 Правил № 3 соответственно, не содержат обязательства по утверждению с учетом прохождения ценовой экспертизы сметной документации на проведение работ по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой, до их начала, предусмотренных абзацем девятым пункта 3 Правил № 1 и абзацем тринадцатым пункта 3 Правил № 1 соответственно.

Департаментом не обеспечено соблюдение 57 муниципальными образованиями²⁰ в 2017 году и 10 муниципальными образованиями²¹ в 2018 году условий предоставления субсидий, возложенное на него пунктом 24 Правил № 1 и пунктом 27 Правил № 3 соответственно.

2. Одним из условий предоставления субсидии является:

в 2017 году - снижение (отсутствие) кредиторской задолженности муниципального образования перед муниципальными учреждениями по оплате труда и начислениям на оплату труда работников муниципальных учреждений, а также по оплате коммунальных услуг, сложившейся на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов, по отношению к данным на начало текущего финансового года²²,

в 2018, 2019 годах - снижение (отсутствие) на момент распределения и фактического перечисления субсидии просроченной кредиторской задолженности муниципального образования по оплате труда и начислениям на оплату труда работников муниципальных учреждений, а также

²⁰ Арсеньевский, Артемовский, Владивостокский, Дальнегорский, Дальнереченский, Лесозаводский, Находкинский, Партизанский, Уссурийский городские округа, городской округ Большой Камень, городской округ ЗАТО г. Фокино, Кавалеровское, Горноключевское, Кировское, Преображенское, Новошахтинское, Липовецкое, Ольгинское, Пограничное, Пластунское, Тернейское, Зарубинское, Посыетское, Приморское, Славянское, Хасанское, Ярославское, Смоляниновское, Шкотовское городские поселения, Устиновское, Востокское, Ивановское, Михайловское, Сунятсенское, Надеждинское, Раздольненское, Тавричанское, Покровское, Веселояровское, Тимофеевское, Владимиро-Александровское, Золотогорское, Сергеевское, Лучегорское, Светлогорское, Хвалынское, Камень-Рыболовское, Хорольское, Дмитриевское, Реттиховское, Черниговское, Чугуевское, Новонежинское, Подъяпольское, Романовское, Штыковское, Центральненское сельские поселения

²¹ Владивостокский городской округ, городской округ ЗАТО город Фокино, Кавалеровское, Сибирцевское, Шкотовское городские поселения, Владимиро-Александровское, Екатерининское, Сергеевское, Камень-Рыболовское, Ярославское сельские поселения

²² абзац четырнадцатый пункта 3 Правил № 1, абзац десятый Правил № 2

кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями, сложившейся на последнюю отчетную дату, по отношению к данным на начало текущего финансового года²³.

В подтверждение данного факта в соответствии Правилами²⁴ уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования предоставляет в Департамент копию справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (код формы по ОКУД 0503387) (далее – Справочная таблица).

Согласно пункту 50 информации Минфина России от 11.03.2016²⁵ (далее – Информация Минфина России) все справочные показатели по кредиторской задолженности отражаются в Справочной таблице только по просроченным обязательствам бюджетов.

Таким образом, Справочная таблица, предоставляемая муниципальными образованиями в Департамент для получения субсидии в 2017 году²⁶, не содержит информации о кредиторской задолженности муниципального образования перед муниципальными учреждениями по оплате труда и начислениям на оплату труда работников муниципальных учреждений, а также по оплате коммунальных услуг.

Кроме того контрольным мероприятием установлено, что копия Справочной таблицы, представленная в Департамент для получения субсидии в 2017 году шестью муниципальными образованиями (Новошахтинским, Ольгинским, Светлогорским городскими поселениями, Надеждинским, Раздольненским, Тавричанским сельскими поселениями) и шестью муниципальными образованиями в 2019 году (Владимиро-Александровским, Екатерининским, Золотолинским, Сергеевским, Новицким и Чугуевским сельскими поселениями), не содержит раздела «Просроченная кредиторская задолженность», что по информации Минфина России свидетельствует о предоставлении недостоверной информации.

Указанные факты свидетельствуют о недостаточном контроле со стороны Департамента за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидии. При этом пунктом 24 Правил № 1, пунктом 19 Правил № 2 и пунктом 27 Правил № 5 на Департамент возложена обязанность по обеспечению соблюдения муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий, в том числе путем проведения проверок.

Справочно

Письмом от 14.06.2019 № 19-2456/4 на запрос Контрольно-счетной палаты Приморского края от 30.05.2019 № 01-27/02-01/492 Департамент пояснил, что «мониторинг движения кредиторской задолженности муниципального

²³ абзац шестнадцатый пункта 3 Правил № 3 и Правил № 5 соответственно

²⁴ абзац шестой пункта 5 Правил № 1 и абзац седьмой пункта 5 Правил № 2

²⁵ «Порядок заполнения справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (ф. 0503387)»

²⁶ в соответствии с абзацем шестым пункта 5 Правил № 1 и абзацем седьмым пункта 5 Правил № 2

образования по отношению к данным на начало текущего финансового года осуществлялся путем просмотра сведений о кредиторской задолженности по отчетным данным муниципальных образований, размещенных на сайте Администрации Приморского края на странице департамента финансов Приморского края (раздел «Информация, методические рекомендации») и сведений муниципальных образований. Вопросы по снижению кредиторской задолженности выносились на рабочие и селекторные совещания с главами муниципальных образований».

В результате анализа информации, размещенной на странице департамента финансов Приморского края (раздел «Деятельность/Аналитика, методические рекомендации») (<https://www.primorsky.ru/authorities/executiveagencies/departments/finance/information.php>), установлено, что:

1) кредиторская задолженность по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам по состоянию на 01.02.2017 увеличилась:

по Дальнереченскому городскому округу на 1 002,4 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2017 – 2 447,8 тыс. рублей, по состоянию на 01.02.2017 – 3 450,2 тыс. рублей);

по городскому округу ЗАТО город Фокино на 249,1 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2017 – 4 808,6 тыс. рублей, по состоянию на 01.02.2017 – 5 057,7 тыс. рублей);

по Кавалеровскому городскому поселению на 88,9 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2017 – 2 105,7 тыс. рублей, по состоянию на 01.02.2017 – 2 239,6 тыс. рублей);

2) кредиторская задолженность по коммунальным услугам по городскому округу Спасск-Дальний увеличилась на 153,5 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2017 – 2 187,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.02.2017 – 2 340,5 тыс. рублей);

3) кредиторская задолженность по коммунальным услугам Новосысоевского сельского поселения Яковлевского муниципального района на момент распределения субсидии в 2019 году увеличилась на 159,6 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2019 – 4 070,4 тыс. рублей, по состоянию на 01.03.2019 – 4 230,0 тыс. рублей).

Необходимо также отметить, что на указанной странице отсутствует информация о просроченной кредиторской задолженности в разрезе муниципальных образований. В результате проведенного анализа данных, приведенных на указанной странице, отмечен рост просроченной кредиторской задолженности по оплате труда по муниципальным районам в целом:

по Кировскому муниципальному району на 1 141,4 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2019 – 1 786,3 тыс. рублей, по состоянию на 01.03.2019 – 2 927,7 тыс. рублей);

по Михайловскому муниципальному району на 3 672,6 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2019 просроченная кредиторская задолженность по оплате труда отсутствует, по состоянию на 01.03.2019 составила 3 672,6 тыс. рублей);

по Пожарскому муниципальному району на 186,4 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2019 – 4 442,6 тыс. рублей, по состоянию на 01.03.2019 – 4 629,0 тыс. рублей);

по Хасанскому муниципальному району на 242,2 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2019 – 3 778,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.03.2019 – 4 020,2 тыс. рублей);

по Черниговскому муниципальному району на 54,4 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2019 просроченная кредиторская задолженность по оплате труда отсутствует, по состоянию на 01.03.2019 составила 54,4 тыс. рублей).

3. Рядом муниципальных образований не исполнены отдельные обязательства, предусмотренные условиями предоставления субсидий:

1) в нарушение абзаца е) подпункта 2.3.2 пункта 2 Порядка представления, рассмотрения, учета и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Артемовского городского округа на 2018 - 2022 годы»²⁷ Администрацией Артемовского городского округа не привлекались лица из числа собственников помещений многоквартирного дома, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, к участию в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории;

2) управлением дорог и благоустройства администрации города Владивостока в 2017 году не обеспечено прохождение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству 17 дворовых и 2 общественных территорий (в части работ по ремонту территории по ул. Набережной от ул. Светланская до пер. Красноармейский, ландшафтно-парковой зоны ДВФУ);

управлением содержания жилищного фонда администрации города Владивостока дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий утверждены в мае 2019 года, то есть с нарушением установленного абзацем девятым пункта 3 Правил № 5 срока (до 1 марта);

при отборе дворовых территорий для включения в муниципальную программу на 2017 год и формировании перечня получателей субсидий в 2018 году управлением содержания жилищного фонда администрации города Владивостока допущены нарушения Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2017 год²⁸ (далее - Порядок оценки предложений заинтересованных лиц) и Порядка предоставления субсидий из бюджета Владивостокского городского округа²⁹ (далее - Порядок предоставления субсидий № 2375):

²⁷ утвержден постановлением администрации Артемовского городского округа от 23.11.2017 № 1479-па «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Артемовского городского округа на 2018 - 2022 годы»

²⁸ утвержден постановлением администрации г. Владивостока от 30.03.2017 № 831

²⁹ утвержден постановлением администрации г. Владивостока от 30.08.2018 № 2375

в нарушение пункта 2.5 Порядка предоставления субсидий № 2375 в 2018 году 27 дворовых территорий включены в список получателей субсидий без учета рекомендаций общественной комиссии;

в нарушение пункта 3.5 Порядка оценки предложений заинтересованных лиц в 2017 году в одном случае, к участию в отборе допущена заявка дворовой территории (по ул. Тунгусская, 46), направленная после установленного срока и в отсутствие документа, подтверждающего намерение собственников многоквартирного дома участвовать в муниципальной программе. В нарушение пункта 4.2 указанного порядка адресный перечень многоквартирных домов для включения в муниципальную программу утвержден протоколом общественной комиссии от 02.05.2017 без указания количества баллов присвоенных каждой заявке;

3) при разработке паспорта подпрограммы «Формирование современной городской среды Дальнегогорского городского округа на 2017 год» администрацией Дальнегогорского городского округа не учтены рекомендации, приведенные в пункте 3.1 и в Приложении № 2 Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденные приказом Минстроя России от 21.02.2017 № 114;

в нарушение пункта 7 Правил № 1 паспорт долгосрочной муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018 – 2022 годы Дальнегогорского городского округа не содержит:

адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными с органами местного самоуправления соглашениями;

мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

адресный перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованного питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов (при необходимости, определяемой уполномоченным органом местного самоуправления сельского поселения);

в нарушение абзаца восьмого пункта 3 Правил № 4 Администрацией Дальнегогорского городского округа не утвержден порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году;

дизайн-проекты благоустройства парка «Березка», территории сквера «Звезда» и территории МБУ «Центральная библиотечная система» утверждены Администрацией Дальнегорского городского округа 04.07.2017, то есть за пределами установленного абзацем пятым пункта 3 Правил № 2 (до 1 июля);

4) главой Лесозаводского городского округа не утверждена сметная документация на проведение в 2018 году работ по благоустройству дворовых территорий и ремонту пешеходной зоны (тротуара) по ул. Пушкинская;

5) дизайн-проекты общественных территорий, утвержденные администрацией Находкинского городского округа, не соответствуют требованиям к содержанию дизайн-проекта, указанному в пункте 3 Правил № 1 и Правил № 3 (не содержат текстового описания и визуального изображения);

сметные расчеты после прохождения ценовой экспертизы не утверждены заказчиком – администрацией Находкинского городского округа;

6) администрацией Партизанского городского округа в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» на 2017 год, утвержденную постановлением администрации Партизанского городского округа от 18.05.2017 № 895-па, не включена нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ, предусмотренная подпунктом д) пункта 6 Правил № 1;

7) администрацией городского округа Спасск-Дальний:

нарушены сроки внесения изменений в муниципальную программу; не обеспечено проведение общественных обсуждений муниципальной программы сроком не менее 30 дней; отсутствует муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство, на исполнение, которого предоставляется субсидия; не предоставлены дизайн-проекты дворовых и общественных территорий с текстовым и визуальным описанием; не обеспечена синхронизация с реализуемой в муниципальном образовании региональной программой по капитальному ремонту; отсутствует сметная документация, прошедшая ценовую экспертизу, на изготовление и монтаж малых архитектурных форм для территории парка и для центральной площади, поставку и монтаж светодиодного экрана, выполнение работ по монтажу самонесущего изолированного провода на территории парка;

- в нарушение пункта 6 Правил № 3 и Правил № 4 не учитывалась очередность включения в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 и 2019 годах, в порядке поступления предложений заинтересованных лиц;

8) синхронизация мероприятий Муниципальной программы с мероприятиями по ремонту и модернизации инженерных сетей, дорог и иных объектов в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ, реализуемых на территории Чугуевского сельского поселения, проводилась

Администрацией Чугуевского сельского поселения в ходе рабочих встреч и совещаний с профильными структурными подразделениями районной администрации, а также предприятиями жилищно-коммунальной сферы Чугуевского сельского поселения, но в письменном форме не оформлялась;

дизайн-проекты благоустройства дворовых и общественных территорий, утвержденные Администрацией Чугуевского сельского поселения, не соответствуют требованиям к содержанию дизайн-проекта, указанному в пункте 3 Правил предоставления и расходования субсидий (не содержат текстового описания и визуального изображения).

4. В соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий распределение субсидий на текущий финансовый год между бюджетами муниципальных образований утверждается нормативным правовым актом Администрации Приморского края в установленный Правилами срок.

В нарушение пункта 10 Правил № 3 распределение субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018 году утверждено³⁰ на 12 рабочих дней позже установленного срока (до 1 апреля).

5. Согласно Правилам предоставления и расходования субсидий предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Департаментом и муниципальным образованием в установленный Правилами срок.

В 2017 году Департаментом заключено 64 соглашения о предоставлении субсидий (58 - на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, 6 – на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков); в 2018 году – 50 соглашений (45 - на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, 5 – на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков); в 2019 году – 182 соглашения (73 - на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, 109 – на поддержку муниципальных программ по благоустройству территории муниципальных образований Приморского края).

Контрольным мероприятием не установлено нарушения Департаментом сроков заключения соглашений с муниципальными образованиями Приморского края.

Правилами предоставления и расходования субсидий установлены требования к Соглашениям о предоставлении субсидии.

³⁰ постановление Администрации Приморского края от 17.04.2018 № 168-па «Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018 году»

В нарушение подпункта г) пункта 14 Правил № 3 и Правил № 5 Соглашения о предоставлении субсидий не содержат реквизиты муниципальных правовых актов о местном бюджете, предусматривающих собственные средства бюджетов муниципальных образований на исполнение расходных обязательств по направлениям предоставления субсидий.

В нарушение подпункта е) пункта 14 Правил № 3 и Правил № 5, подпункта д) пункта 9 Правил № 4, абзаца шестого пункта 12 Правил № 6 Соглашения о предоставлении субсидий не содержат мероприятий, предусмотренных муниципальными программами.

Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет субсидии из краевого бюджета, в том числе источником которой являются средства федерального бюджета, установленный Соглашениями о предоставлении субсидии, в проверяемом периоде увеличился с 95,9 % в 2017 году до 99,5 % в 2019 году, на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) - с 95,9 % в 2017 году до 97,1 % в 2018 году.

Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края установлен Соглашениями о предоставлении субсидий в 2019 году на уровне от 97 % до 99 % (для городских и сельских поселений Приморского края)³¹.

На основании пункта 15 Правил № 1 в 2017 году рядом муниципальных образований в одностороннем порядке увеличен размер средств местных бюджетов на реализацию мероприятий муниципальных программ, в результате чего увеличен уровень софинансирования из местных бюджетов:

- по Владивостокскому городскому округу до 22,86 %,
- по Светлогорскому сельскому поселению до 5,0 %,
- по Уссурийскому городскому округу до 8,2 % при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и до 10,3 % при реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий,
- по Сунятсенскому сельскому поселению до 7,1 % при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и до 11,8 % при реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий,

³¹ в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 15.05.2014 № 184-па «О порядках определения перечня расходных обязательств муниципальных образований Приморского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, и формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 14.02.2019 № 93-па)

по Черниговскому сельскому поселению до 4,62 % при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и до 49,64 % при реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий.

6. В соответствии с пунктом 16 Правил № 1 перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета Департамента, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее – УФК по ПК), на лицевые счета главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджетов муниципальных образований, открытых в отделениях Федерального казначейства по Приморскому краю для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в течение 5 рабочих дней после заключения соглашения и поступления средств на лицевой счет Департамента путем предоставления в УФК по ПК заявки на кассовый расход, подготовленной государственным казенным учреждением Приморским казначейством во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого бюджета государственному казенному учреждению Приморскому казначейству, заключенного с Департаментом.

Предельные объемы финансирования доведены Департаменту на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств расходными расписаниями от 31.05.2017 № 2396 на сумму 459 384,10 тыс. рублей, от 27.06.2017 № 2961 на сумму 500,00 тыс. рублей.

Заявки на кассовый расход по 11 муниципальным образованиям³² представлены Департаментом с превышением срока, установленного пунктом 16 Правил № 1, от двух до шести дней.

Цель 2. Оценить законность, эффективность использования средств, выделенных в форме субсидий бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение реализации мероприятий по формированию современной городской среды муниципальных образований Приморского края в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года.

2.1. Информация о кассовом исполнении мероприятий Подпрограммы № 10, Государственной программы в 2017, 2018 годах представлена в таблице.

³² Кавалеровское, Зарубинское, Приморское, Хасанское городские поселения, Устиновское, Михайловское, Сунятсенское, Покровское, Дмитриевское, Реттиховское, Новонежинское сельские поселения

Наименование мероприятий	Источники ресурсного обеспечения	Кассовое исполнение, тыс. рублей		
		2017 год	2018 год	Всего
Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды	Всего	519 705,2	530 454,3	1 050 159,5
	ФБ	373 640,3	397 209,4	770 849,7
	КБ	76 528,8	54 164,9	130 693,7
	МБ	69 536,1	68 669,5	138 205,6
	ВНБ		10 410,5	10 410,5
Дополнительная субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств краевого бюджета	Всего	12 481,3	0,0	12 481,3
	КБ	7 983,1	0,0	7 983,1
	МБ	4 498,2	0,0	4 498,2
Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	Всего	16 098,0	15 307,6	31 405,6
	ФБ	11 422,5	12 174,8	23 597,3
	КБ	2 339,6	1 660,2	3 999,8
	МБ	2 335,9	1 472,6	3 808,5
Итого:	Всего	548 284,5	545 761,9	1 094 046,4
	ФБ	385 062,8	409 384,2	794 447,0
	КБ	86 851,5	55 825,1	142 676,6
	МБ	76 370,2	70 142,1	146 512,3
	ВНБ		10 410,5	10 410,5

Кассовое исполнение субсидий, предоставленных муниципальным образованиям Приморского края в 2017 году, составило 471 914,4 тыс. рублей, или 97,1 % от утвержденных бюджетных назначений (485 966,6 тыс. рублей), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 385 062,9 тыс. рублей, или 97,7 % от утвержденных бюджетных назначений (394 004,3 тыс. рублей);

за счет средств краевого бюджета – 86 851,5 тыс. рублей, или 94,4 % от утвержденных бюджетных назначений (91 962,3 тыс. рублей).

Кассовое исполнение за счет средств местного бюджета составило 76 370,2 тыс. рублей.

В 2017 году субсидии предоставлялись по двум направлениям.

«Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды»

В реализации мероприятия приняли участие 57 муниципальных образований³³, из которых 49 (86 %) исполнили субсидии в полном объеме.

Кассовое исполнение субсидии по данному направлению в 2017 году составило 458 152,2 тыс. рублей (ФБ – 373 640,3 тыс. рублей, КБ – 84 511,9 тыс. рублей).

³³ 11 городских округов, 20 городских поселений и 26 сельских поселений

По данному направлению в 2017 году субсидии не исполнены на общую сумму 12 994,5 тыс. рублей (ФБ - 8 063,5 тыс. рублей, КБ - 4 931,0 тыс. рублей).

Возврат неиспользованных средств дополнительной субсидии, предоставленной из краевого бюджета, в сумме 3 279,5 тыс. рублей осуществлен Владивостокским городским округом в 2017 году.

В соответствии с требованиями части 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не использованный по состоянию на 01.01.2018 остаток субсидии в сумме 9 715,0 тыс. рублей, своевременно и в полном объеме возвращен 9 муниципальными образованиями³⁴ в Департамент, Департаментом - в доход федерального бюджета.

Кассовое исполнение за счет средств местного бюджета составило 74 034,3 тыс. рублей.

Информация о кассовом исполнении субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2017 году в разрезе муниципальных образований представлена в приложении 2 к отчету о совместном контрольном мероприятии.

«Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»

В реализации мероприятия приняли участие 6 муниципальных образований, 5 из которых исполнили субсидии в полном объеме.

Кассовое исполнение субсидии по данному направлению составило 13 762,1 тыс. рублей (ФБ – 11 422,5 тыс. рублей, КБ – 2 339,6 тыс. рублей).

Не использованный по состоянию на 01.01.2018 остаток субсидии в сумме 1 057,7 тыс. рублей (ФБ – 878,0 тыс. рублей, КБ – 179,7 тыс. рублей) своевременно возвращен Артемовским городским округом в Департамент, Департаментом - в доход федерального бюджета.

Информация о кассовом исполнении муниципальными образованиями субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2017 году представлена в приложении 3 к отчету о совместном контрольном мероприятии.

Кассовое исполнение субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований Приморского края **в 2018 году**, составило 465 209,3 тыс. рублей, или 99,7 % от утвержденных бюджетных назначений (466 549,2 тыс. рублей), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 409 384,2 тыс. рублей, или 99,7 % от утвержденных бюджетных назначений (410 563,3 тыс. рублей);

за счет средств краевого бюджета – 55 825,1 тыс. рублей, или 99,7 % от утвержденных бюджетных назначений (55 985,9 тыс. рублей).

³⁴ Владивостокский городские округа, Кавалеровское, Новошахтинское, Ольгинское, Славянское, Ярославское городские поселения, Сунятсенское, Надеждинское, Новонежинское сельские поселения

Кассовое исполнение за счет средств местного бюджета составило 70 142,1 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 10 410,5 тыс. рублей.

«Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды»

В реализации мероприятия приняли участие 45 муниципальных образований Приморского края³⁵, из которых 43 (99,7 %) исполнили субсидии в полном объеме.

Кассовое исполнение субсидии по данному направлению в 2018 году составило 451 374,4 тыс. рублей (ФБ – 397 209,4 тыс. рублей, КБ – 54 164,9 тыс. рублей).

Общий объем неисполненных в 2018 году субсидий составил 1 339,9 тыс. рублей (ФБ – 1 179,1 тыс. рублей, КБ – 160,8 тыс. рублей), в том числе:

по Владивостокскому городскому округу – 1 324,0 тыс. рублей (ФБ – 1 165,1 тыс. рублей, КБ – 158,9 тыс. рублей);

по Арсеньевскому городскому округу - 15,9 тыс. рублей (ФБ – 14,0 тыс. рублей, КБ - 1,9 тыс. рублей).

Кассовое исполнение за счет средств местного бюджета составило 68 669,5 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 10 410,5 тыс. рублей.

Информация о кассовом исполнении муниципальными образованиями субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018 году представлена в приложении 4 к отчету о совместном контрольном мероприятии.

«Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»

В реализации мероприятия приняли участие 5 муниципальных образований.

Субсидии по данному направлению исполнены в 2018 году в полном объеме. Кассовое исполнение субсидии составило 13 835,0 тыс. рублей (ФБ – 12 174,8 тыс. рублей, КБ – 1 660,2 тыс. рублей).

Кассовое исполнение за счет средств местного бюджета составило 1 472,6 тыс. рублей.

Информация о кассовом исполнении муниципальными образованиями субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2018 году представлена в приложении 5 к отчету о совместном контрольном мероприятии.

2.2. Согласно отчетам о достижении значений показателей результативности, предоставленных Департаментом в Минстрой России, показатели результативности, установленные соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Приморского края на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, а также на поддержку обустройства мест массового отдыха

³⁵ 12 городских округов, 14 городских поселений и 19 сельских поселений

населения (городских парков) в 2017 и 2018 годах, достигнуты в полном объеме.

Информация о достижении значений показателей результативности, установленных соглашением о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Приморского края на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды от 16.02.2017, представлена в таблице.

Наименование показателя	Плановое значение показателя, ед.	Фактическое значение показателя на 01.01.2018, ед.
Утверждение (корректировка действующей) государственной программы субъекта Российской Федерации формирования современной городской среды на 2017 год	1	1
Утверждение государственной программы субъекта Российской Федерации формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы	1	1
Обеспечить утверждение (корректировку действующих) органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы	1	1
Утверждение органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, правил благоустройства (с учетом общественных обсуждений)	1	1
Принятие (изменение) закона субъекта Российской Федерации об ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, в котором в том числе предусмотрено повышение с 1 января 2021 г. административной ответственности для лиц, не обеспечивших благоустройство принадлежащих им объектов в соответствии требованиями правил благоустройства муниципальных образований	1	1
Представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на конкурс не менее двух реализованных в 2017 год лучших проектов по благоустройству общественных территорий	1	1
Принятие нормативного правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о создании межведомственной комиссии	1	1
Опубликование для общественного обсуждения проектов муниципальных программ формирования современной городской среды	1	1
Утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год	1	1
Утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории	1	1

Информация о достижении значений показателей результативности, установленных соглашением о предоставлении субсидии бюджету Приморского края из федерального бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) от 12.02.2017, представлена в таблице.

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя, ед.	Фактическое значение показателя на 01.01.2018, ед.
1	Утверждение нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации правил предоставления субсидий местным бюджетам в целях софинансирования мероприятий по благоустройству парков	1	1
2	Утверждение и опубликование порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборке парка, подлежащего благоустройству в 2017 году и перечня работ по благоустройству	1	1
3	Принятие решения о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году, с учетом результатов общественного обсуждения	1	1
4	Утверждение дизайн-проекта обустройства парка и перечня мероприятий по обустройству, подлежащих реализации в 2017 году, с учетом результатов общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения	1	1

Информация о достижении значений показателей результативности, установленных соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Приморского края на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды от 12.02.2018, представлена в таблице.

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя, %	Фактическое значение показателя на 01.01.2019, %
1	Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий	100	100
2	Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий	100	100
3	Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий	100	100

Информация о достижении значений показателей результативности, установленных соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Приморского края на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) от 09.03.2018, представлена в таблице.

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя, ед.	Фактическое значение показателя на 01.01.2019, ед.
1	Утверждены нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам в целях софинансирования мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения не позднее 1 февраля 2018 г.	1	1
2	Утверждены и опубликованы порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству, и перечня работ по благоустройству не позднее 1 февраля 2018 г.	1	1
3	100 процентов муниципальных образований – получателей субсидии не позднее 1 апреля 2018 г. приняли решение о выборе парка, подлежащего благоустройству, с учетом результатов общественного обсуждения	1	1
4	100 процентов муниципальных образований – получателей субсидии не позднее 1 апреля 2018 г. утвердили дизайн-проект благоустройства парка и перечень мероприятий по благоустройству, подлежащих реализации, с учетом результатов общественных обсуждений	1	1

Показатели результативности исполнения субсидии, установленные Соглашениями о предоставлении субсидии, заключенными с Минстроем России, трансформируются на Соглашения, заключенные Департаментом с муниципальными образованиями.

Считаем необходимым отметить, что показатели результативности, установленные Соглашениями о предоставлении субсидий, заключенными Департаментом с муниципальными образованиями, не позволяют оценить результативность вложения бюджетных средств.

Между тем, в результате изучения документов, подтверждающих расходы, предоставленных муниципальными образованиями, контрольным мероприятием установлено, что в 2017 году в Приморском крае благоустроено 254 дворовые территории, 58 территорий общего пользования и 6 городских парков, в 2018 году благоустроено 139 дворовых территорий, 55 территорий общего пользования и 5 городских парков.

Информация о количестве объектов, благоустроенных в 2017 году, в разрезе муниципальных образований приведена в приложении 6 к отчету о совместном контрольном мероприятии, о количестве объектов, благоустроенных в 2018 году, - в приложении 7 к отчету о совместном контрольном мероприятии.

Приложением № 1 к соглашению о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Приморского края от 01.02.2019 № 069-2019-F20036-1 установлены показатели Федерального проекта по субъекту Российской Федерации и значения показателей по годам реализации проекта. Одним из показателей является «Реализация мероприятий по благоустройству, предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств). Базовое значение показателя для Приморского края на 01.01.2019 определено в количестве 53 единиц. Значение показателя

накопительным итогом начиная с 2019 года – 128 единиц, в 2020 году – 242 единицы, в 2021 году – 350 единиц, в 2022 году – 465 единиц.

Приведенные выше данные о количестве благоустроенных в 2018 году общественных территорий, указывают на то, что базовый показатель достигнут.

2.3. Совместное контрольное мероприятие проведено Контрольно-счетной палатой Приморского края с 13 контрольно-счетными органами муниципальных образований. Объектами контрольного мероприятия являлись департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края и 17 муниципальных образований Приморского края.

Информация о кассовом исполнении субсидий в 2017, 2018 годах в разрезе муниципальных образований – объектов совместного контрольного мероприятия приведена в таблице.

тыс. рублей

№ п/п	Наименование муниципального образования	Источник	2017 год			2018 год		
			дворовые территории	обществ. территории	парки	дворовые территории	обществ. территории	парки
1	Арсеньевский ГО	Всего	17 224,5	6 654,8	3 420,1	22 715,4	717,6	3 660,0
		ФБ	13 710,2	5 297,0	2 722,3	18 439,3	610,7	3 127,0
		КБ	2 808,1	1 084,9	557,6	2 514,5	83,3	426,4
		МБ	706,2	272,9	140,2	625,8	23,6	106,6
		ВНБ				1 135,8		
2	Артемовский ГО	Всего	26 230,6	8 262,2	663,5	24 829,6	13 367,2	
		ФБ	19 163,1	6 219,2	526,0	18 818,4	10 560,4	
		КБ	3 925,0	1 273,8	107,8	2 566,1	1 440,1	
		МБ	3 142,5	769,2	29,7	2 203,6	1 366,7	
		ВНБ				1 241,5		
3	Владивостокский ГО	Всего	52 228,9	62 555,6		81 779,8	53 689,8	
		ФБ	33 440,2	32 060,7		53 689,3	28 338,8	
		КБ	6 849,2	14 549,7		7 321,3	3 864,4	
		МБ	11 939,5	15 945,2		16 680,2	21 486,6	
		ВНБ				4 089,0		
4	Дальнегорский ГО	Всего	4 815,0	2 245,9	1 391,4	6 209,2	12 063,4	2 996,8
		ФБ	3 832,6	1 480,8	1 107,6	5 305,6	10 305,9	2 560,7
		КБ	785,0	303,3	226,8	723,5	1 405,3	349,2
		МБ	197,4	461,8	57,0	180,1	352,2	86,9
		ВНБ						
5	Дальнереченский ГО	Всего	8 808,0	2 722,4	3 258,1	3 970,4	7 334,6	2 004,0
		ФБ	7 010,9	2 166,9	2 593,3	3 222,5	6 266,5	1 712,1
		КБ	1 436,0	443,9	531,2	439,5	854,5	233,5
		МБ	361,1	111,6	133,6	109,9	213,6	58,4
		ВНБ				198,5		
6	ГО Спасск-Дальний	Всего			3 477,7	5 847,7	7 081,1	2 989,1
		ФБ			2 701,3	4 746,9	5 750,6	2 420,1
		КБ			553,3	647,3	784,2	330,0
		МБ			223,1	161,1	546,3	239,0
		ВНБ				292,4		
7	Лесозаводский ГО	Всего	7 046,5	1 896,1		8 361,6	5 808,3	
		ФБ	5 608,7	1 444,6		6 787,6	4 197,8	
		КБ	1 148,8	295,9		925,6	572,4	
		МБ	289,0	155,6		230,3	1 038,1	
		ВНБ				418,1		

№ п/ п	Наименование муниципального образования	Источн ик	2017 год			2018 год		
			дворовые территории	обществ. территории	парки	дворовые территории	обществ. территории	парки
8	Находкинский ГО	Всего	5 751,8	8 602,4			69 543,9	
		ФБ	4 290,3	2 990,0			50 019,7	
		КБ	878,7	612,4			6 820,9	
		МБ	582,8	5 000,0			12 703,3	
9	Партизанский ГО	Всего	5 872,0				17 340,7	
		ФБ	4 673,9				14 814,7	
		КБ	957,3				2 020,2	
		МБ	240,8				505,8	
10	Уссурийский ГО	Всего	26 284,0	12 250,7		33 282,0	22 501,6	
		ФБ	13 781,0	6 018,1		27 016,9	19 227,1	
		КБ	2 822,6	1 232,6		3 684,1	2 621,9	
		МБ	9 680,4	5 000,0		916,9	652,6	
		ВНБ				1 664,1		
	Кавалеровский МР							
11	Кавалеровское ГП	Всего	12 771,1	5 732,8			6 878,1	
		ФБ	10 165,4	4 563,1			5 804,6	
		КБ	2 082,1	934,6			791,5	
		МБ	523,6	235,1			282,0	
	Партизанский МР:							
12	Владими́ро-Александровское СП	Всего	9 473,3	14 308,7			2 422,7	
		ФБ	7 540,5	10 383,5			2 070,2	
		КБ	1 544,4	2 126,7			282,3	
		МБ	388,4	1 798,5			70,2	
13	Екатери́новское СП	Всего				2 317,2		
		ФБ				1 877,4		
		КБ				256,0		
		МБ				68,0		
		ВНБ				115,8		
14	Золото́долинское СП	Всего		5 954,3			1 241,6	
		ФБ		4 739,1			1 060,9	
		КБ		970,7			144,7	
		МБ		244,5			36,0	
15	Сергеевское СП	Всего		4 583,4			2 062,5	
		ФБ		3 645,1			1 762,4	
		КБ		746,6			240,3	
		МБ		191,7			59,8	
16	Нови́цкое СП	Всего					2 062,5	
		ФБ					1 762,4	
		КБ					240,3	
		МБ					59,8	
	Чугуевский МР							
17	Чугуевское СП	Всего	2 253,6	3 398,1		2 174,4	3 309,7	
		ФБ	1 791,9	2 701,9		1 762,4	2 828,2	
		КБ	367,0	553,4		240,2	385,5	
		МБ	94,7	142,8		59,8	96,0	
		ВНБ				112,0		

Ниже представлены результаты контрольных мероприятий, проведенных в муниципальных образованиях Приморского края.

Арсеньевский городской округ

В 2017 году в Арсеньевском городском округе благоустроено 10 дворовых территорий, 1 территория общего пользования – сквер в честь 25-летия г. Арсеньева и 1 место массового отдыха населения – парк «Восток».

В 2018 году благоустроено 9 дворовых территорий, продолжены работы по благоустройству сквера в честь 25-летия г. Арсеньев и парка «Восток».

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы № 10 и Государственной программы за 2017-2018 годы составили 54 392,4 тыс. рублей (ФБ – 43 906,5 тыс. рублей, КБ – 7 474,8 тыс. рублей, МБ – 1 875,3 тыс. рублей, ВНБ – 1 135,8 тыс. рублей), в том числе:

 благоустройство дворовых территорий – 39 939,9 тыс. рублей (ФБ – 32 149,5 тыс. рублей, КБ – 5 322,6 тыс. рублей, МБ – 1 332,0 тыс. рублей, ВНБ – 1 135,8 тыс. рублей);

 благоустройство территорий общего пользования – 7 372,4 тыс. рублей (ФБ – 5 907,7 тыс. рублей, КБ – 1 168,2 тыс. рублей, МБ – 296,5 тыс. рублей);

 обустройство мест массового отдыха населения – 7 080,1 тыс. рублей (ФБ – 5 849,3 тыс. рублей, КБ – 984,0 тыс. рублей, МБ – 246,8 тыс. рублей).

В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Арсеньевского городского округа установлено следующее:

- локальный сметный расчет, обосновывающий стоимость работ по муниципальному контракту от 30.10.2017 № 77, заключенному между администрацией Арсеньевского городского округа и ООО «Ресурс» на выполнение работ по завозу грунта (земля растительная) на сумму 1,0 тыс. рублей, не проходил ценовую экспертизу;

- в локальный сметный расчет, обосновывающий стоимость работ по муниципальному контракту от 20.08.2018 № 0120300004418000046_88114, заключенному между администрацией Арсеньевского городского округа и ООО «Строительная компания № 1» на выполнение работ по благоустройству парка «Восток», включены непредвиденные затраты (2%) в сумме 60,8 тыс. рублей, не предусмотренные сметной документацией прошедшей ценовую экспертизу и утвержденной постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 10.07.2017 № 432 «Об утверждении сметной документации».

В период проведения контрольного мероприятия сотрудниками Контрольно-счетной палаты Арсеньевского городского округа выборочно проведены контрольные обмеры выполненных работ, в результате которых не установлено фактов приемки и оплаты фактически не выполненных работ.

Анализ исполнения мероприятий Программы, а также показателей результативности муниципальной программы в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2017 - 2018 годы показал, что мероприятия муниципальной Программы в Арсеньевском городском округе реализованы на 100%, планируемые результаты

достигнуты в полном объеме, что свидетельствует об успешности ее реализации.

В ходе контрольного мероприятия сотрудниками Контрольно-счетной палаты Арсеньевского городского округа проведено анкетирование граждан для анализа удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий.

Участие в анкетировании приняли 22 человека. Результаты анкетирования показали следующее:

благоустройство детских площадок в целом оценивается на 4,0 балла (по 5-балльной шкале), в том числе: обустройство – 4,2 балла, ограждение – 4,4 балла, озеленение – 4,4 балла, обеспечение доступности для инвалидов – 2,8 балла;

благоустройство дворовых территорий в целом также оценивается на 4,1 балла (по 5-балльной шкале), в том числе: асфальтовое покрытие – 4,2 балла, обустройство – 4,4 балла, ограждение – 4,3 балла, озеленение – 4,3 балла, обеспечение доступности для инвалидов – 3,5 балла.

Артемовский городской округ

В 2017 году в Артемовском городском округе благоустроено 18 дворовых территорий, 1 территория общего пользования – Площадь перед Дворцом культуры угольщиков и 1 место массового отдыха населения – Взрослый парк культуры и отдыха Артемовского городского округа.

В 2018 году благоустроено 17 дворовых территорий и продолжены работы по благоустройству территории общего пользования - Площади перед Дворцом культуры угольщиков.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы № 10 и Государственной программы в 2017 - 2018 годах составили 73 353,1 тыс. рублей (ФБ – 55 287,1 тыс. рублей, КБ – 9 312,8 тыс. рублей, МБ – 7 511,7 тыс. рублей, ВНБ – 1 241,5 тыс. рублей), в том числе:


благоустройство дворовых территорий – 51 060,2 тыс. рублей (ФБ – 37 981,5 тыс. рублей, КБ – 6 491,1 тыс. рублей, МБ – 5 346,1 тыс. рублей, ВНБ – 1 241,5 тыс. рублей);

благоустройство территорий общего пользования – 21 629,4 тыс. рублей (ФБ – 16 779,6 тыс. рублей, КБ – 2 713,9 тыс. рублей, МБ – 2 135,9 тыс. рублей);

обустройство мест массового отдыха населения – 663,5 тыс. рублей (ФБ – 526,0 тыс. рублей, КБ – 107,8 тыс. рублей, МБ – 29,7 тыс. рублей).


В период проведения контрольного мероприятия сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края и сотрудниками Контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа осуществлены выезды для осмотра благоустроенных территорий.

При осмотре Площади у Дворца культуры угольщиков недостатков и замечаний к качеству работ не установлено.

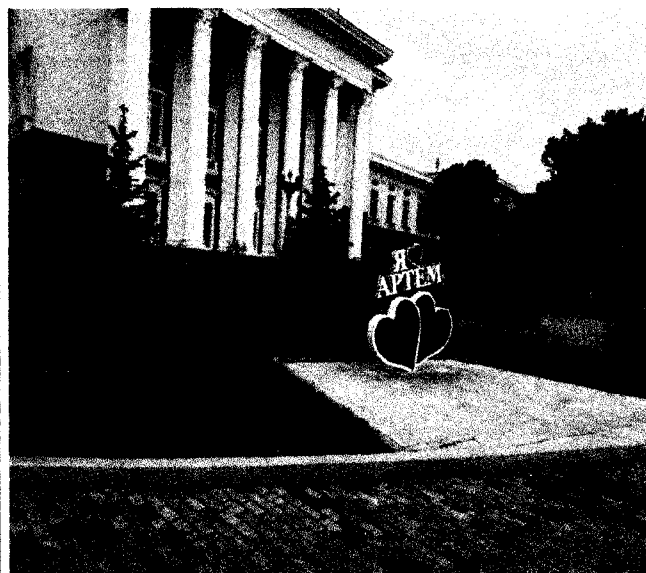

Площадь у Дворца культуры угольщиков
(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края 29.05.2019)

При осмотре придомовых территорий, расположенных по улице Ангарской 2, 4, 6, 8 (заказчик – МКУ «Управление строительства и капитального ремонта г. Артема», подрядчик – ООО «Технострой»), установлено, что асфальтобетонное покрытие территории местами выкрашивается, имеются трещины, в районе канализационного колодца – провал асфальтобетонного покрытия.

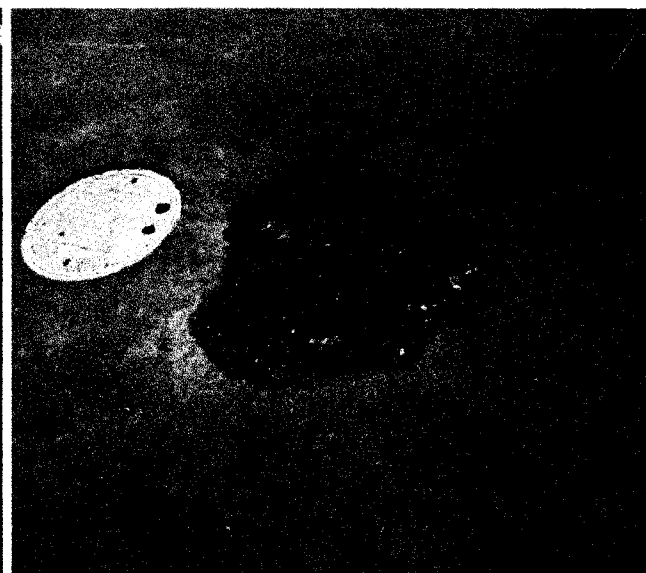



Состояние придомовых территорий после ремонта
(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края 29.05.2019)

В период проведения контрольного мероприятия сотрудниками Контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа выборочно проведены контрольные обмеры выполненных работ, в результате которых не установлено фактов приемки и оплаты фактически не выполненных работ. При этом установлены факты некачественно выполненных работ:

при осмотре выполненных работ по благоустройству придомовых территорий по ул. Херсонская, дома № 1, 2, 3/1, по ул. Фрунзе, дома № 62, 73 (заказчик – МКУ «Управление строительства и капитального ремонта г. Артема», подрядчик – ООО «Технострой») в отдельных местах на основной территории наблюдается выкрашивание асфальта.

С целью анализа удовлетворенности жителей результатами благоустройства сотрудниками Контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа в ходе контрольного мероприятия проведено анкетирование жителей многоквартирных домов, дворовые территории которых были благоустроены в 2017 – 2018 годах.

Участие в анкетировании приняли 93 человека. Результаты анкетирования показали следующее. Качество работ по благоустройству дворовых территорий в целом оценивается на 4,3 балла (оценка по 5-балльной шкале), в том числе: асфальтобетонное покрытие – 3,9 балла, бордюрный камень – 4,3 балла, скамейки – 4,6 балла, урны – 4,5 балла. Причем, жители дворовых территорий, благоустроенных в 2017 году, оценивают благоустройство территорий на более высокую оценку, чем жители, дворовые территории которых были благоустроены в 2018 году.

В ходе анкетирования жители высказывали замечания к качеству выполненных работ, обращали внимание на появившиеся трещины, проседание, выкрашивание асфальтобетонного покрытия, а также на отсутствие системы водоотвода, в результате чего во время дождя вода стекает во дворы, у подъездов образуются лужи.

Опрошенные также отметили, что не все предложения жителей были учтены на этапе обсуждения дизайн-проектов, в частности, в торце домов не предусмотрено устройство асфальтированных дорожек для пешеходов.

Владивостокский городской округ

В 2017 году во Владивостокском городском округе выполнен ремонт проездов 17 дворовых территорий, 3 территорий общего пользования – капитальный ремонт и ремонт объектов инфраструктуры ландшафтно-парковой зоны ДВФУ о. Русский, сквера Адмирала Невельского, ремонт территории ул. Набережная от ул. Светланская до пер. Красноармейский.

В 2018 году благоустроено 44 дворовых территорий, 3 территории общего пользования – общественная территория в районе бюста А.С. Пушкина, реконструкция объекта «Зона отдыха «Площадь Спортивная Гавань». Общественный туалет» (ввиду того, что условия предоставления субсидий из федерального бюджета и из краевого бюджета не предусматривали расходы на капитальные вложения, реконструкция туалета в полном объеме осуществлялась за счет средств бюджета Владивостокского городского округа), капитальный ремонт дворовой и фасадной части территории муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Владивостокский городской Дворец детского творчества» (далее – МАУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества»).

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы № 10 и Государственной программы в 2017 - 2018 годах составили 250 254,1 тыс. рублей (ФБ – 147 529,0 тыс. рублей, КБ – 32 584,6 тыс. рублей, МБ – 66 051,5 тыс. рублей, ВНБ – 4 089,0 тыс. рублей), в том числе:

благоустройство дворовых территорий – 134 008,7 тыс. рублей (ФБ – 87 129,5 тыс. рублей, КБ – 14 170,5 тыс. рублей, МБ – 28 619,7 тыс. рублей, ВНБ – 4 089,0 тыс. рублей);

благоустройство территорий общего пользования – 116 245,4 тыс. рублей (ФБ – 60 399,5 тыс. рублей, КБ – 18 414,1 тыс. рублей, МБ – 37 431,8 тыс. рублей).

В рамках совместного контрольного мероприятия проведены проверки 2 исполнителей муниципальных программ:

управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока – объем проверенных средств за 2017 год составил 83 770,2 тыс. рублей (ФБ - 53 634,9 тыс. рублей, КБ – 10 985,4 тыс. рублей, МБ – 19 149,9 тыс. рублей);

управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока – объем проверенных средств за 2018 год составил 77 899,1 тыс. рублей (ФБ – 53 689,4 тыс. рублей, КБ – 7 321,3 тыс. рублей, МБ – 16 688,4 тыс. рублей)³⁶.

³⁶ средства субсидий, предоставленных управляющим компаниям на доленое софинансирование (95,0 % стоимости благоустройства дворовой территории) - 77 690,9

Кроме того, в 2018 году в рамках муниципальной программы по формированию современной городской среды исполнитель программы - *управление образования администрации города Владивостока* в целях благоустройства общественной территории выдало субсидии на иные цели на капитальный ремонт МАУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества» (29 723,5 тыс. рублей). В связи с чем вопрос использования средств субсидий из краевого и местного бюджета на благоустройство указанной общественной территории был рассмотрен Контрольно-счетной палатой города Владивостока в рамках проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества» за 2017-2018 годы».

В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой города Владивостока установлено следующее.

1. Владивостокский городской округ в 2018 году к выполнению мероприятий по благоустройству общественных территорий фактически приступил во 2 полугодии. В результате, часть работ осталась не выполнена, часть - перенесена на 2019 год.

Одной из причин сложившейся ситуации является позднее распределение субсидий между исполнителями муниципальной программы. Так, несмотря на своевременное доведение межбюджетных трансфертов до Владивостокского городского округа (в апреле 2018 года), в решение о бюджете Владивостокского городского округа изменения внесены только в октябре 2018 года, что связано с длительной подготовкой управлением содержания жилищного фонда постановления о назначении уполномоченных органов по расходованию субсидий из краевого бюджета и распределении субсидий между ними (утверждено от 11.07.2018).

В конце 2018 года (октябре и декабре) высвободившиеся средства (по причине несостоявшегося аукциона на капитальный ремонт сквера Адмирала Невельского, неисполнения обязательств подрядчиком по ремонту сквера им. Анны Щетиной и расторжения с ним муниципального контракта, экономией, образовавшейся при проведении аукционных процедур, отказом от работ по озеленению, ремонту подпорных стен территории МАУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества» и территории в районе бюста А.С. Пушкина в связи с наступлением зимних температур, переносом отдельных работ по реконструкции общественного туалета в части устройства наружной канализации, установки ограждений, посеву газона, поставке и монтажу световых указателей на 2019 год) с общественных территорий перераспределены на благоустройство дворовых территорий путем предоставления субсидий управляющим компаниям, что позволило освоить средства межбюджетных трансфертов.

тыс. рублей; расходы на оплату благоустройства дворовых территорий, как собственника муниципальных жилых помещений – 208,28 тыс. рублей (МБ) (Справочно: внебюджетные средства собственников – 3 880,71 тыс. рублей)

Но в режиме отрицательных температур, управляющие компании уже не имели возможность выполнить асфальтирование дворовых проездов. В итоге, в нарушение пункта 7 Правил № 3, фактически выполнены работы, которые входили в дополнительный перечень, при том, что минимальный перечень работ по благоустройству дворов остался не выполнен.

Так, из 24 дворов, по которым выполнено устройство детских площадок, на 13 территориях (более 50 %) в неудовлетворительном состоянии находились дороги и тротуары (дворы по ул. Спиридонова, 28, Калинина, 23, Марины Расковой, 7, Сафонова, 24, Нейбута, 12, 63, 81в, Крыгина, 86в, Иртышская, 4а, Луговая, 64, Лермонтова, 28, 83, Успенского, 100). Жители этих домов в ходе проведенного анкетирования выразили мнение о необходимости выполнения в первоочередном порядке ремонта дворовых проездов, а по ул. Нейбута, 81в и устройства ливневых колодцев, отводящих грунтовые воды.



ул. Нейбута, 63 (28.05.2019)
(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты г. Владивостока)



ул. Сафонова, 24 (17.05.2019)

2. В Порядке предоставления субсидий № 2375³⁷ администрация города Владивостока не предусмотрела обязанность управляющих компаний по обеспечению адаптации благоустраиваемых детских площадок для инвалидов и других маломобильных групп населения. Данная обязанность отсутствовала и в соглашениях о предоставлении субсидий, заключаемых управлением содержания жилищного фонда с управляющими компаниями. Как следствие, по 7 дворовым территориям (1/3 всех обустроенных в рамках программы детских площадок) доступ к детским площадкам ограничен:


имеются препятствия в виде высоких бордюров, лестниц, канав, не устроено плавное понижение пути, пандусы, аппарели (тем самым не учтены требования пунктов 5.1.5, 5.1.8, 5.1.14 СП 59.13330.2016 «Доступность

³⁷ Порядок предоставления субсидий из бюджета Владивостокского городского округа, утвержденный постановлением администрации г. Владивостока от 30.08.2018 № 2375

зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее - Свод правил 59.13330.2016);

отдельные площадки расположены на уклонах, который превышает максимально допустимый уровень (5,0 % - пункт 5.1.7 Свода правил 59.13330.2016);

площадки установлены на краю крутых склонов, не оборудованы ограждениями или бордюрным камнем со стороны склона, что создает риск падения детей со склона.

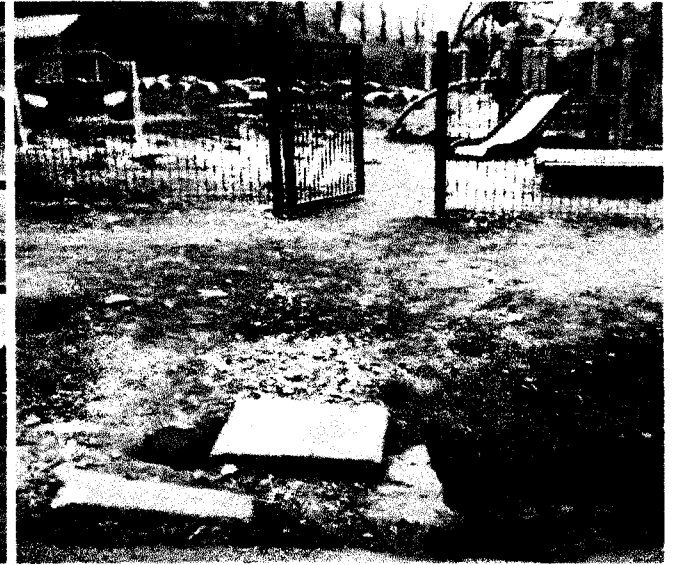

Вход на детскую площадку

ул. Сафонова, 24 (17.05.2019)

ул. Спиридонова, 28 (16.05.2019)



ул. Нейбута, 63 (28.05.2019)

ул. Карбышева, 14 (28.05.2019)

(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты г. Владивостока)

3. На основании распределения субсидий № 2809³⁸ между управлением содержания жилищного фонда администрации города Владивостока и 22 получателями субсидий в 2018 году заключено 45 соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Владивостокского городского округа на возмещение части затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Перечисление субсидий получателям субсидий осуществлялось на основании документов, подтверждающих выполнение работ по благоустройству дворовых территорий: договоров на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, заключенных получателями субсидий с подрядными организациями, актов приемки выполненных работ, подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени получателей субсидии, подрядной организацией, представителями собственников, актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

По результатам контрольных обмеров, проведенных Контрольно-счетной палатой города Владивостока в период проведения контрольного мероприятия, и проверке документов, подтверждающих выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, установлены факты возмещения неправомерных затрат (приемка и оплата фактически невыполненных работ, неправомерное завышение цены и объемов работ) на общую сумму 1 290,1 тыс. рублей, а именно:

1) тремя получателями субсидий - ООО «Дальневосточные коммунальные системы», ООО «УК 71 микрорайона», ООО «УК Регион ЖКХ» приняты и оплачены фактически невыполненные подрядными организациями - ООО «ОРАНЖ ГРУПП» и ООО ДВСК «Гарант» бетонные работы (при установке малых форм на детских площадках) в объеме 54,7 м³ на сумму 405,8 тыс. рублей (субсидии из краевого бюджета - 302,7 тыс. рублей, средства местного бюджета – 83,6 тыс. рублей³⁹, средства из внебюджетных источников – 19,4 тыс. рублей). В ходе контрольного мероприятия управляющими компаниями произведен возврат в бюджет Владивостокского городского округа неправомерно оплаченных бюджетных средств в полном объеме в сумме 386,4 тыс. рублей⁴⁰;

2) четырьмя получателями субсидии - ООО «Дальневосточные коммунальные системы», ООО УК «Геркулес», ООО УК «Лира», ООО «УК

³⁸ Постановление администрации города Владивостока от 17.10.2018 № 2809 «Об утверждении распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Владивостока на 2018 год»

³⁹ излишне предоставлено субсидий управляющим компаниям в сумме 385,48 тыс. рублей, излишне оплачено администрацией города, как собственником помещений - 0,88 тыс. рублей

⁴⁰ платежные поручения от 07.06.2019 №№ 213, 214, 558, 559, от 14.06.2019 № 149, 151, от 18.06.2019 № 230, 568, 569, 570, 571, 572

71 микрорайона» неправомерно оплачены подрядным организациям ООО ДВСК «Гарант», ООО СК «Статус», ООО «ДВ РегионСтрой» непредвиденные затраты, указанные в актах о приемке выполненных работ в процентном выражении от стоимости выполненных работ, без подтверждения объемов понесенных подрядными организациями дополнительных затрат, в общей сумме 468,3 тыс. рублей (субсидии из краевого бюджета – 349,4 тыс. рублей, средства местного бюджета – 96,6 тыс. рублей, средства из внебюджетных источников – 22,3 тыс. рублей).

Пунктом 4.1.3 Соглашений о предоставлении субсидий установлена обязанность Департамента по осуществлению проверки документов, подтверждающих произведенные расходы бюджетом муниципального образования, на возмещение которых предоставляется субсидия.

Таким образом, неисполнение Департаментом обязательств, предусмотренных пунктом 4.1.3 Соглашений о предоставлении субсидий, привело к неправомерным расходам средств субсидии в размере 349,4 тыс. рублей;

3) получателем субсидии - ООО «УК Первомайского района» в акте о приемке выполненных работ неправомерно увеличена расценка на выполнение работ по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси по отношению к расценке, предусмотренной локальным сметным расчетом, прошедшим ценовую экспертизу, что привело к неправомерному завышению стоимости работ и их оплате подрядной организации ООО «Строительный комплекс» на сумму 51,8 тыс. рублей (субсидии из краевого бюджета – 38,6 тыс. рублей, средства местного бюджета – 10,7 тыс. рублей, средства из внебюджетных источников – 2,5 тыс. рублей);

4) ООО УК «Трудовое» при заключении договора с ООО «ОРАНЖ ГРУПП» (ул. Лермонтова, 83) в 3,7 – 6 раз завышена стоимость малых архитектурных форм (диван, урна) на общую сумму 154,5 тыс. рублей (субсидия из краевого бюджета – 115,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 31,6 тыс. рублей, средства из внебюджетных источников – 7,6 тыс. рублей). В ходе контрольного мероприятия бюджетные средства в размере 146,9 тыс. рублей возмещены в бюджет Владивостокского городского округа⁴¹;

5) управляющей компанией ООО «Дальневосточные коммунальные системы» приняты и оплачены невыполненные подрядной организацией ООО ДВКС «Гарант» работы по планировке основания на площади 18 м², устройству подстилающих и выравнивающих слоев из щебня в объеме 18 м³, устройству подстилающих и выравнивающих слоев ударопоглощающего покрытия (песчано-гравийная смесь) в объеме 0,99 м³ по ул. Калинина, 285 на общую сумму 8,1 тыс. рублей (субсидия из краевого бюджета – 6,1 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1,7 тыс. рублей, средства из внебюджетных источников – 0,4 тыс. рублей);

⁴¹ платежные поручения от 19.07.2019 № 851, 852

6) ООО «УК 71 микрорайона» приняты и оплачены невыполненные подрядной организацией ООО «ОРАНЖ ГРУПП» работы по установке ограждения палисадников длиной 43 м и детской площадки длиной 27 м по ул. Спиридонова, 28 на общую сумму 201,6 тыс. рублей (субсидия из краевого бюджета – 150,4 тыс. рублей, средства местного бюджета – 41,1 тыс. рублей, средства из внебюджетных источников – 10,1 тыс. рублей).


В ходе контрольного мероприятия управлением содержания жилищного фонда администрации города Владивостока представлены документы, подтверждающие устранение подрядной организацией нарушений путем установки недостающего ограждения.

4. По результатам контрольных обмеров и осмотров благоустроенных объектов установлено: некачественное выполнение работ, не соблюдение требований безопасности к устройству детских площадок и оборудованию, разрушение отремонтированного асфальтового покрытия, связанное с отсутствием ливневых канализаций, разрушение покрытия тротуара из гранитных плит, обусловленное укладкой плитки на цементно-песчаное основание вместо бетонного, приемка и оплата фактически невыполненных объемов работ:

2017 год

Дворовые территории

1) на асфальтированных территориях необходим ремонт (устройство) ливневой канализации, чтобы исключить разрушение отремонтированного асфальтового полотна. Так, на отдельных дворовых территориях (ул. Тунгусская, 61, ул. Морозова, 9) выявлены провалы в асфальте, образовавшиеся рядом с канализационными колодцами, обусловленные их ненадлежащим состоянием. Также зафиксировано скопление воды после дождя возле подъездов (ул. Луговая, 47);

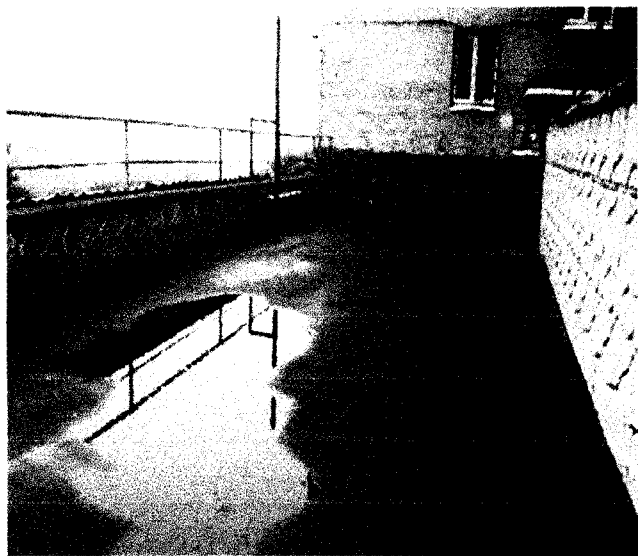

Состояние территорий после ремонта

ул. Морозова, 9

ул. Луговая, 47

(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты г. Владивостока 21.06.2019)

2) ввиду того, что Правила предоставления субсидий из краевого бюджета в отношении дворовых проездов не предусматривали строительство или реконструкцию асфальтового полотна, устройство асфальтового полотна осуществлялось только в местах ранее существующего асфальтового покрытия (то есть частично). В результате, в 2017 году не реализованы дизайн-проекты, составленные собственниками МКД (по ул. Тунгусская, 61, 63, 65), предусматривающие асфальтирование по всему периметру домов (в том числе, где ранее отсутствовал асфальт), устройство новых тротуаров или парковок. То есть задача программы по созданию условий для комфортного проживания на территории Владивостокского городского округа в должной мере не решена;



Состояние придомовых территорий после ремонта

ул. Тунгусская, 63

ул. Тунгусская, 65

(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты г. Владивостока 21.06.2019)

3) по ул. Луговая, 47 дорожный бордюр вокруг клумбы устроен не по всему периметру клумбы (на отдельном участке не демонтированы автомобильные покрышки). На отдельном участке дороги с левого торца многоквартирного дома по ул. Тунгусская, 48 асфальтобетонное покрытие отсутствует.



Состояние придомовых территорий после ремонта

ул. Луговая, 47

ул. Тунгусская, 48

(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты г. Владивостока 21.06.2019)

Общественные территории

1) на благоустроенной территории ул. Набережная от ул. Светланская до пер. Красноармейский имеется провал тротуарной плитки около люка колодца;




Состояние территории после ремонта
(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты города Владивостока
21.06.2019)

2) в период проведения контрольного мероприятия сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края произведен осмотр выполненных работ по благоустройству Набережной ДВФУ (получатель субсидии – Управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока, исполнитель работ – ООО СК «Автобан ДВ»).

В ходе осмотра установлено:

на всем отремонтированном участке тротуара набережной отмечены трещины, сколы, разломы гранитных плит, швы между плитами не заделаны, плиты шатаются, края существующего покрытия не совпадают на стыке с отремонтированным участком по высоте.

Наличие указанных дефектов покрытия не обеспечивает безопасное передвижение по тротуару, а также ведет к дальнейшему разрушению гранитных плит на отремонтированном участке Набережной ДВФУ.

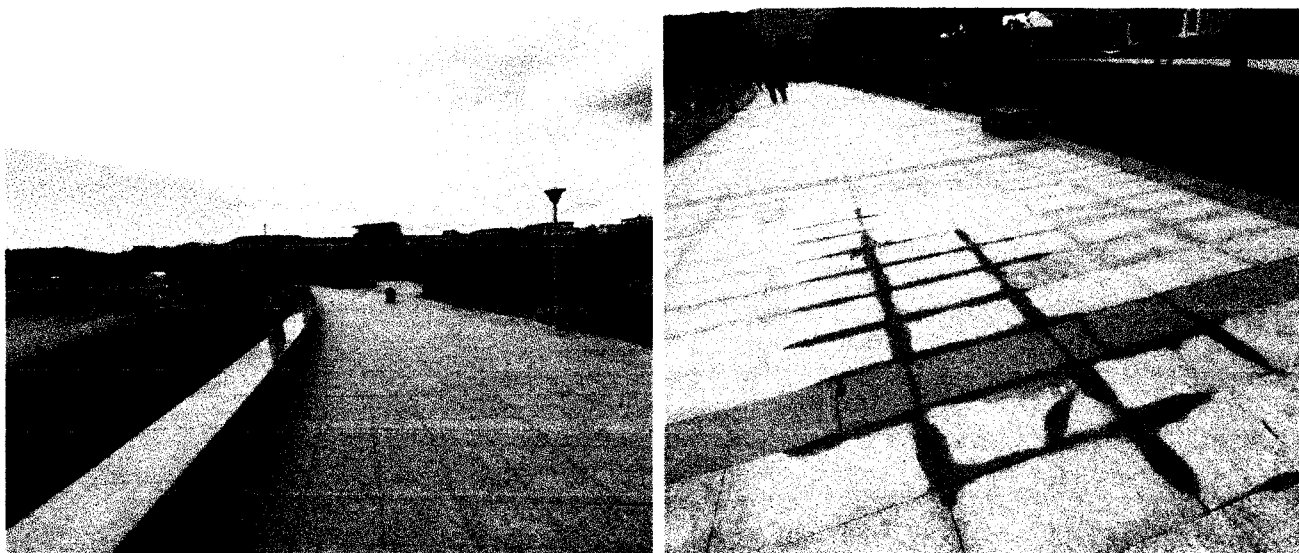


Набережная ДВФУ после ремонта
(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края 21.06.2019)

Контрольно-счетной палатой города Владивостока при проведении контрольного мероприятия установлены аналогичные замечания:

- облицовка стен парапета из гранитных плиток в местах стыка новых и старых крышек парапета в отдельных местах имеет неровные стыки, трещины и сколы (подрядная организация ООО «Объединенная строительная компания»);

- на отремонтированном участке тротуара (стоимость работ 8 591,5 тыс. рублей: за счет субсидии из краевого бюджета – 6 627,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1 964,0 тыс. рублей) покрытие из гранитных плит имеет трещины, разломы, сколы, прилегание плит к основанию тротуара неплотное. Указанные разрушения обусловлены тем, что укладка плитки выполнена на песчано-цементное основание, тогда как, учитывая ширину тротуара (свыше 2,5 метра), в соответствии с требованиями СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» следовало уложить плитку на бетонное основание. В ходе контрольного мероприятия управлением дорог и благоустройства направлено письмо подрядчику о необходимости восстановления тротуара в рамках гарантийных обязательств;

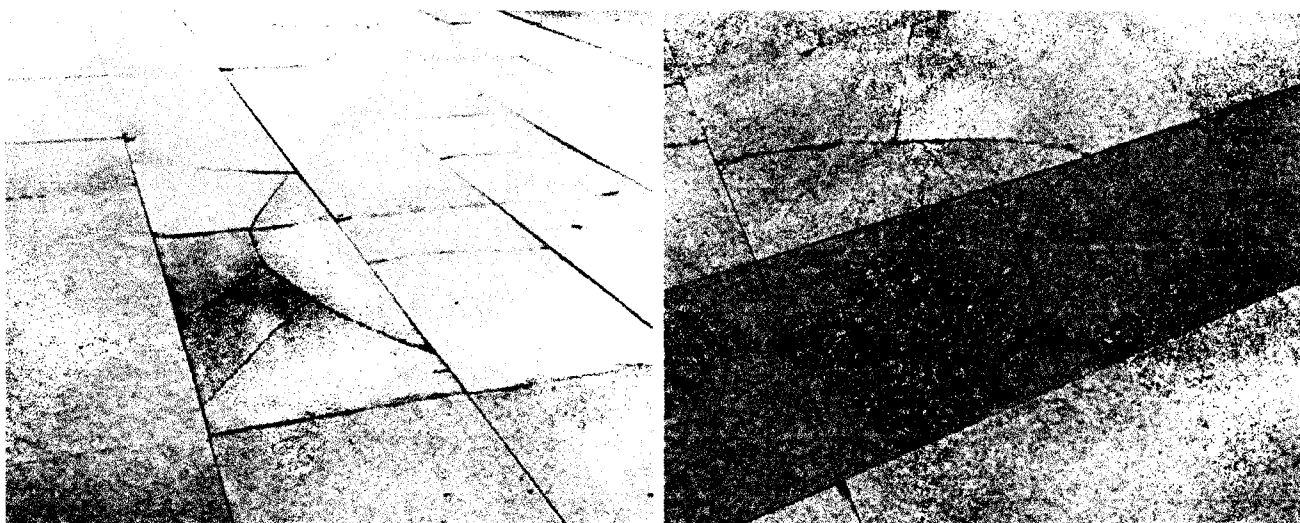


Состояние гранитных плит покрытия Набережной ДВФУ после ремонта
(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты г. Владивостока 21.06.2019)

Контрольно-счетной палатой города Владивостока установлено также:

- один из отремонтированных откосов на территории ДВФУ огорожен металлической конструкцией, сторонней организацией ведутся земляные работы. Затраченные в 2017 году на ремонт откоса средства в сумме 850,1 тыс. рублей (за счет субсидий из краевого бюджета – 655,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 194,3 тыс. рублей) не привели к достижению ожидаемого результата;

- на отдельных участках газонов, расположенных вдоль береговой линии около кафе «Полина», травяной покров сильно поврежден, что связано с установкой выставочных павильонов на этих газонах в период проведения Восточного экономического форума.

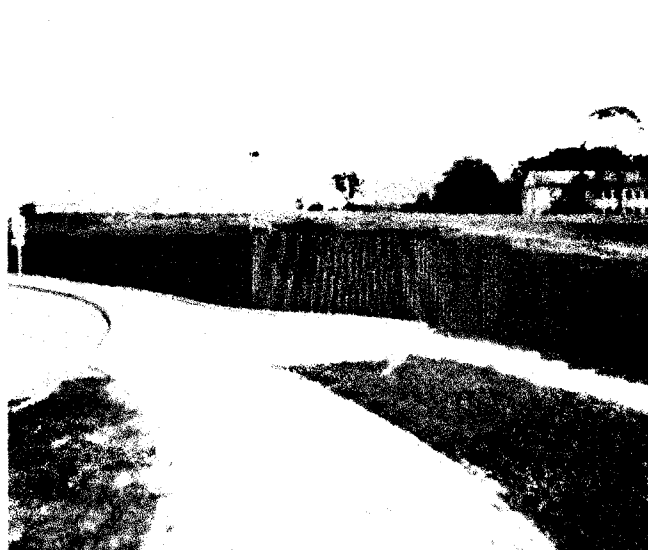

Откос ландшафтно-паковой зоны ДВФУ,
расположенный севернее разворотного
автобусного кольца




Газон ландшафтно-паковой зоны
ДВФУ вдоль береговой линии около
кафе «Полина»

(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты г. Владивостока 21.06.2019)

2018 год*Дворовые территории*


1) на 3 из 23 осмотренных детских площадках (по ул. Успенского, 100⁴², Калинина, 285⁴³, Луговая, 64⁴⁴) установленные спортивные комплексы надлежащим образом не закреплены, одна из конструкций имела повреждение.

В ходе контрольного мероприятия подрядными организациями ООО «ОРАНЖ ГРУПП» и ООО ДВСК «Гарант» стойки детского оборудования на площадке усилены бетоном и заменена деформированная часть конструкции;

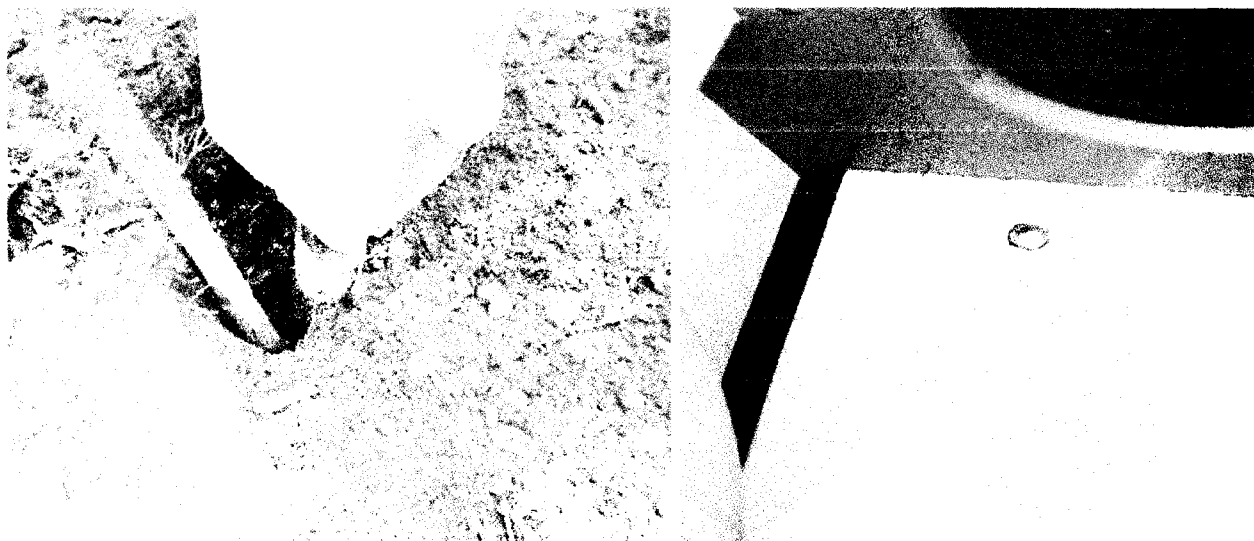

ул. Луговая, 64 (до)

(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты города Владивостока 27.05.2019)

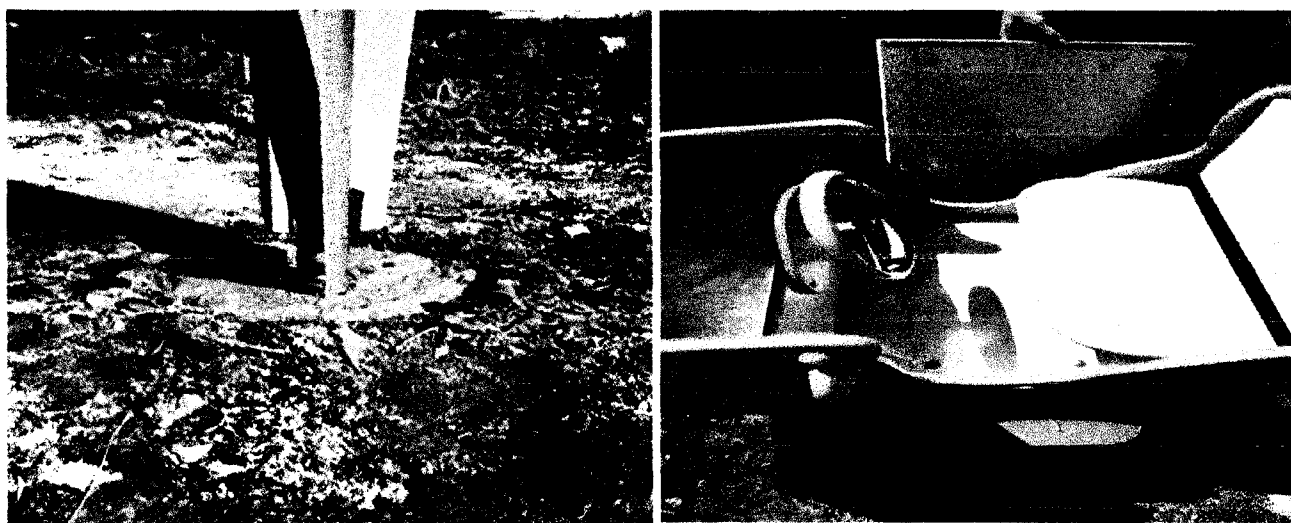

ул. Луговая, 64 (после)



(фото сделано ООО УК «Орион» 28.05.2019)

⁴² получатель субсидии – ООО УК «Трудовое», подрядная организация – ООО «ОРАНЖ ГРУПП»

⁴³ получатель субсидии – ООО «ДВКС», подрядная организация – ООО ДВСК «Гарант»

⁴⁴ получатель субсидии – ООО УК «Орион», подрядная организация – ООО «ОРАНЖ ГРУПП»

2) на 17 из 23 осммотренных площадках отсутствует ударопоглощающее покрытие (песок, резиновое покрытие и др.), необходимое в целях исключения повреждений и травм детей, тем самым не соблюдены требования к безопасности оборудования с высотой свободного падения свыше 600 мм, установленные ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок».

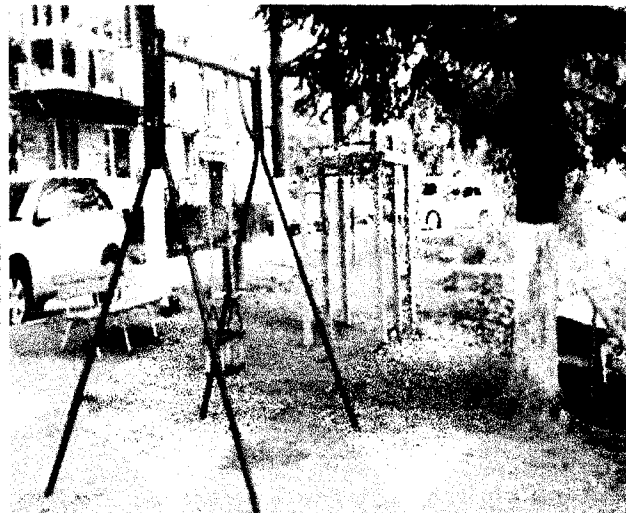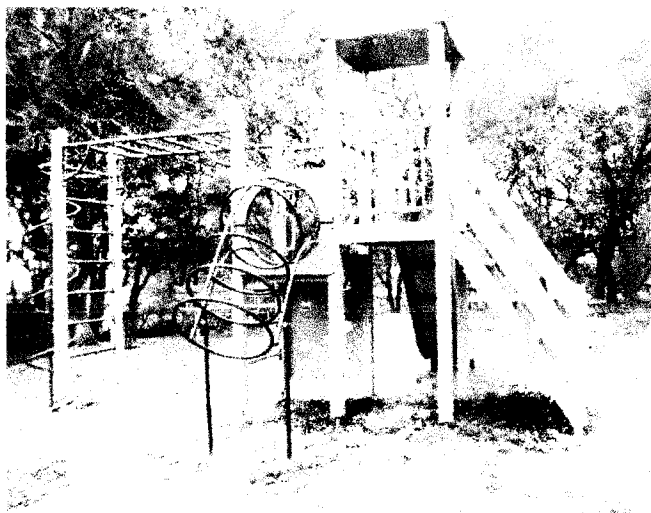

Территории детских площадок после благоустройства
по ул. Громова, 12 (16.05.2019) по ул. Вавилова, 4 (15.05.2019)
(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты города Владивостока)

По ул. Вилкова, 12 выполнены работы по устройству ударопоглощающего покрытия из песчано-гравийной смеси, но толщина покрытия недостаточна, в отдельных местах возле стоек оборудования не закрывает бетон.




Территория детской площадки по ул. Вилкова, 12 после благоустройства
(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты г. Владивостока 17.05.2019)

И только на 2 детских площадках (по ул. Марии Расковой, 7 и по ул. Калинина, 285) из 5, на которых имелось покрытие, ударопоглощающее


покрытие имело толщину засыпки, соответствующую требованиям пункта 4.3.22.2 ГОСТ Р 52169-2012;

3) на отдельных площадках имеются опасные элементы в виде крупных, острых камней, остатков металлоконструкций, асфальта, бетона, брусчатки (по ул. Карбышева, 14, 18, ул. Луговая, 64, ул. Постышева, 11, ул. Вострецова, 10, ул. Сафонова, 24, ул. Спиридонова, 28, ул. Вавилова, 4);

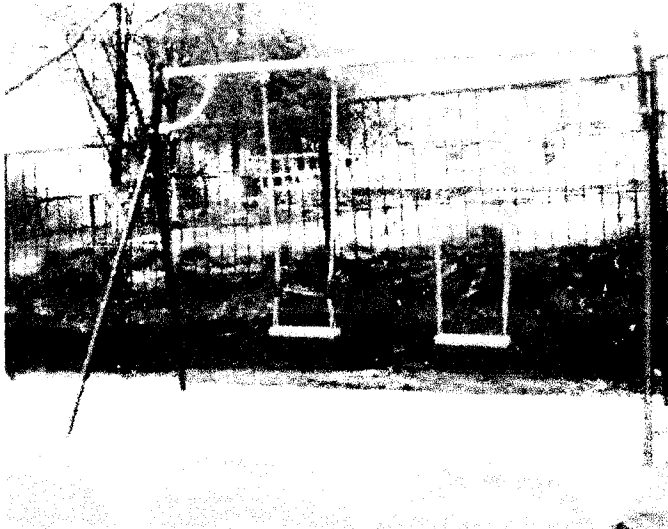


Территории детских площадок после благоустройства
по ул. Сафонова, 24 (17.05.2019) по ул. Карбышева, 14 (22.05.2019)
(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты г. Владивостока)

4) в отсутствие планировки территории, по отдельным дворам оборудование установлено на склоне, вследствие чего, игровые элементы с одной из сторон расположены высоко от земли и их использование небезопасно для детей (например, по ул. Карбышева, 18 – высота от земли до края горки составляет около 40 см; по ул. Спиридонова, 28 - вход в детский домик (для детей 3-6 лет) не позволяет ребенку войти в домик самостоятельно).

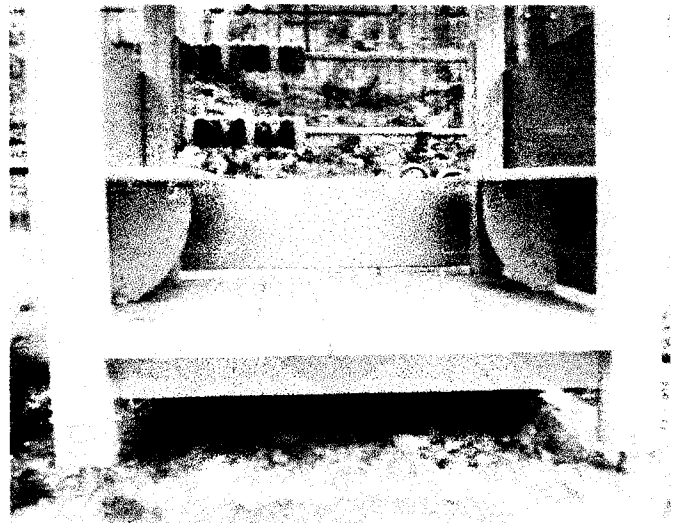

Территории детских площадок после благоустройства
по ул. Карбышева, 18 (22.05.2019) по ул. Спиридонова, 28 (16.05.2019)
(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты г. Владивостока)

Отдельные площадки (ул. Вавилова, 4, Сельская, 10, Успенского, 100) расположены рядом с крутыми склонами или дорогой, имеющиеся на площадках старое ограждение в большинстве разрушено;

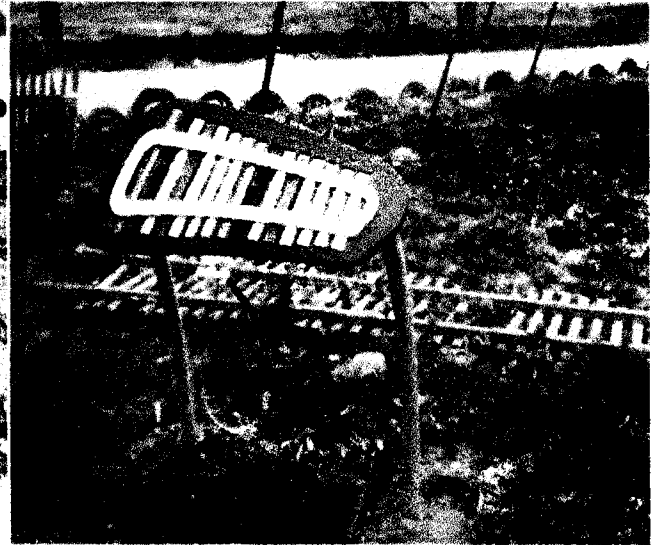

Территории детских площадок после благоустройства

по ул. Сельская, 10 (27.05.2019)
(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты г. Владивостока)

по ул. Успенского, 10 (15.05.2019)
(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты г. Владивостока)

5) по краю детских площадок (ул. Нейбута, 81в, Вострецова, 10) проходят открытые ливневые стоки (глубиной 0,5 метра);



Территории детских площадок после благоустройства

по ул. Нейбута, 81в (28.05.2019)
(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты г. Владивостока)

по ул. Вострецова, 10 (27.05.2019)
(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты г. Владивостока)

6) покрытие детской площадки по ул. Калинина, 23 выполнено из щебня фракции 20-40 мм. В период проведения контрольного мероприятия подрядной организацией ООО «Дальневосточные коммунальные системы» проведены работы по устройству дополнительного ударопоглощающего слоя из сыпучего материала (галька);


7) в нарушение требований пункта 7.5 ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» на всех 23 осмотренных площадках отсутствовали информационные таблички (доски) с указанием правил использования оборудования, возрастных ограничений, номеров телефонов службы спасения, службы эксплуатации и прочее.

Общественные территории


Территория МАУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества»

В период проведения контрольного мероприятия сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края произведен осмотр выполненных работ по благоустройству территории МАУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества», в результате чего установлено следующее:

согласно документам, предоставленным Администрацией Владивостокского городского округа в Департамент, работы выполнялись подрядной организацией ООО СК «Автобан-ДВ». Заказчиком - МАУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества» работы приняты и оплачены в декабре 2018 года. На момент осмотра объекта центральная лестница частично разобрана, строительный мусор в районе спортивной (костровой) площадки не убран, территория детской площадки отсыпана песком, из которого местами торчит нетканый материал, являющийся элементом покрытия (прослойка между щебнем, уложенным в основании покрытия, и песком), что создает угрозу травмирования детей, металлическая опорная конструкция сцены на главной площадке установлена на подкладки из древесно-волокнутой плиты, которые от дождя расслоились и раскрошились, вокруг опоры освещения, установленной на площадке плаца, разрушено асфальтобетонное покрытие.

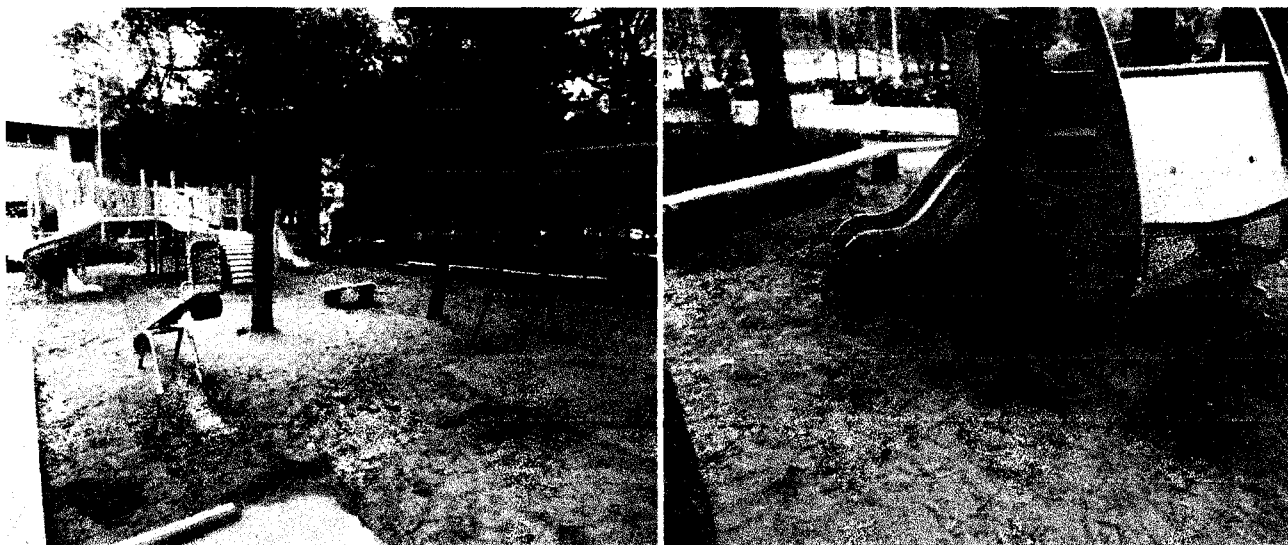

Территория детской площадки МАУ ДО «ВГ ДДТ» после ремонта
(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края 10.06.2019)

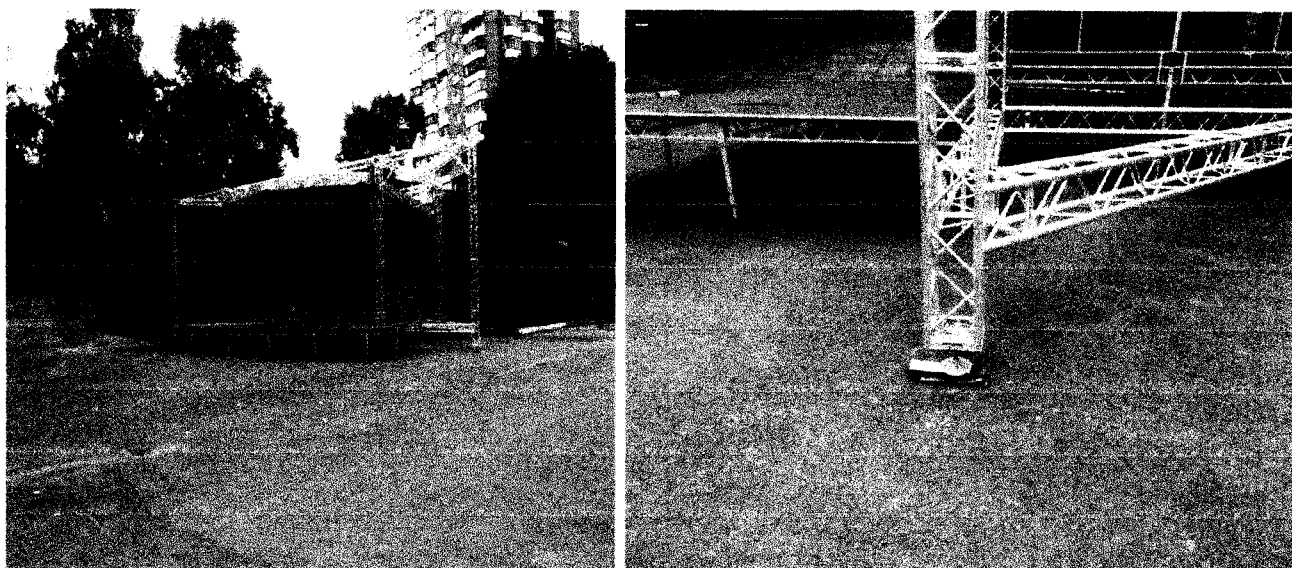

Сцена

(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края 10.06.2019)



Состояние лестницы к спортивной (костровой) площадке после ремонта

(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края 10.06.2019)



Состояние территории МАУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества» после ремонта
(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края 10.06.2019)

Контрольно-счетной палатой города Владивостока при проведении контрольного мероприятия установлены аналогичные замечания, а также:

МАУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества» приняты и оплачены фактически невыполненные подрядной организацией ООО СК «Автобан-ДВ» работы по установке 3 бортовых камней в районе тротуара в зеленой зоне территории на сумму 2,2 тыс. рублей (средства субсидии из краевого бюджета – 1,7 тыс. рублей, средства местного бюджета – 0,5 тыс. рублей) и работы по устройству одномаршевой лестницы (13 ступеней) с двумя площадками к спортивной (костровой) площадке стоимостью 42,2 тыс. рублей (субсидия из краевого бюджета – 33,7 тыс. рублей, средства местного бюджета – 9,1 тыс. рублей);

в рамках договора на капитальный ремонт территории МАУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества» оплачены подрядной организации ООО СК «Автобан-ДВ» затраты на временные здания и сооружения. Расчет произведен в процентном отношении (0,9 %) от сметной стоимости, включая стоимость оборудования, что является нарушением пункта 1.2 «Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений» (ГСН 81-05-01-2001). Таким образом, МАУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества» неправомерно оплачены подрядной организации ООО СК «Автобан-ДВ» затраты на временные здания и сооружения в сумме 5,0 тыс. рублей (субсидия из краевого бюджета – 4,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1,0 тыс. рублей);

при выполнении работ по устройству ограждения по 2 договорам подряда от 23.10.2018 с ООО СК «Автобан-ДВ», от 10.12.2018 с ООО «АГАТ» не осуществлен возврат 192,7 тыс. рублей – разница между стоимостью возвратных материалов от демонтажа металлического

ограждения (протяженностью 233 м и 30 м) и стоимостью демонтажных работ;

не выполнены работы по устройству разгрузочных (промежуточных) и нижних площадок лестниц, оплаченные в сумме 23,2 тыс. рублей (субсидия из краевого бюджета – 18,2 тыс. рублей, средства местного бюджета – 5,0 тыс. рублей). В ходе авторского надзора принято решение об изменении проектных решений, вместо 3 отдельных лестниц разместить одну лестницу из 3-х ступеней по ширине, в результате изменений лестница состоит из 51 ступени, вместо 39. Вместе с тем, строительство лестницы с большим количеством ступеней, чем было предусмотрено проектно-сметной документацией (с 13 до 17 ступеней) на откосном спуске к спортивной площадке в месте резкого перепада рельефа, в отсутствие разгрузочных (промежуточных) площадок, без поручней (не предусмотрены проектно-сметной документацией), не исключает возможности наступления несчастных случаев и получения травм в результате падения в процессе пользования спуском к спортивной (костровой) площадке, и является нарушением требований статьи 11 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

приобретенные в целях проведения спортивных мероприятий щиты информационные, спортивное оборудование, флагштоки уличные, тренажер для пресса, стенка шведская и т.д. на общую сумму 311,7 тыс. рублей (субсидии из краевого бюджета – 244,8 тыс. рублей, средства местного бюджета 66,9 тыс. рублей) находятся на складе учреждения. Тем самым не обеспечена результативность затраченных на их приобретение бюджетных средств.


МАУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества» письмом от 09.07.2019 № 16/14-231 представлены возражения на акт контрольного мероприятия контрольно-счетной палаты города Владивостока, в которых указано, что в период контрольного мероприятия ряд замечаний устранен, а именно:

территория детской площадки подсыпана песком;

оплаченные, но не установленные в декабре 2018 года бортовые камни, установлены подрядной организацией ООО СК «Автобан-ДВ» после установления факта нарушения;

устранен провал асфальтобетонного покрытия вокруг опоры освещения, установленной на территории плаца;

опора металлической конструкции сцены установлена на бетонный брус. Подрядной организацией ООО СК «Автобан-ДВ» рассматривается вопрос о возможности изготовления металлического анкера нужного размера;

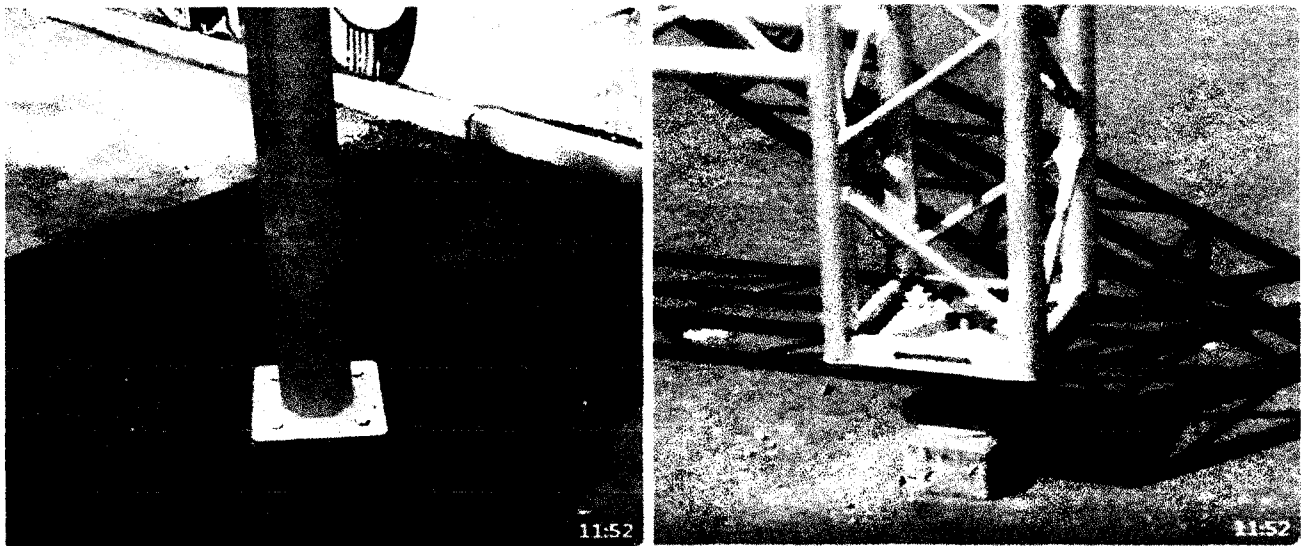

Устранение замечаний

(фото сделано сотрудниками МАУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества» 09.07.2019)

лестница в районе главной площади восстановлена;
с откосов лестницы и территории спортивной (костровой) площадки строительный мусор убран;

платежным поручением от 08.07.2019 ООО СК «Автобан-ДВ» произведен возврат в бюджет Владивостокского городского округа 42,2 тыс. рублей за фактически невыполненные работы по устройству одномаршевой лестницы (13 ступеней) с двумя площадками к спортивной (костровой) площадке.

8. Результаты анкетирования жителей многоквартирных домов, показали, что основные замечания жителей к благоустройству дворов связаны:

в 2017 году – с отсутствием ливневых стоков, уклонов при асфальтировании, которое влечет скопление воды во время и после дождя возле подъездов и придомовой территории, образование трещин в асфальте; отсутствие «лежачих полицейских»;

в 2018 году - с отсутствием покрытия, ограждения, заездов на площадку для колясок, дренажа для отвода ливневых стоков с территории детской площадки, информационных табличек, игрового комплекса для детей раннего возраста и спортивного комплекса; наличием не демонтированных остатков металлоконструкций, камней, отсутствием (недостаточностью) освещения, разрушением ливневых стоков, отсутствием песка в песочницах.

9. При реализации программных мероприятий на территории Владивостокского городского округа не обеспечен комплексный подход к благоустройству дворовых территорий, предусматривающий одновременное использование различных элементов благоустройства, в целях повышения удобства использования и визуальной привлекательности благоустраиваемой

территории⁴⁵, в то время как Минстроем России рекомендовано муниципальным образованиям осуществлять разработку муниципальных программ исходя из принципа приоритета комплексности работ при проведении благоустройства.

Учитывая сложный рельеф города Владивостока и наличие грунтовых вод, выходящих на дворовые территории, требуется решение вопроса по их отведению для сохранения асфальтирования, обеспечения комфортности дворов, например по ул. Нейбута, 81в. Вместе с тем устройство (реконструкция) водоотводных сооружений в рамках муниципальной программы не предусматривалось, поскольку субсидии из краевого бюджета предоставлялись по виду расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности». Кроме того, перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, установленный Правилами № 5, не предусматривает реализацию иных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в том числе по ремонту и устройству водоотводных сооружений на придомовых территориях, что в условиях наличия проблем с водоотведением на территории дворов может привести к подтоплениям и разрушениям дорожного и тротуарного покрытия и в результате не позволит обеспечить надлежащий уровень комфорта при реализации мероприятий по благоустройству придомовых территорий.

В связи с чем, Контрольно-счетная палата города Владивостока считает целесообразным расширить указанный перечень видов работ за счет включения в него мероприятий по ремонту и устройству водоотводных сооружений.

В отсутствие комплексного подхода к благоустройству территорий остались не решенными проблемы, связанные с не обустроенностью дворовых территорий необходимыми элементами благоустройства. Так, согласно паспортам дворовых территорий по 27⁴⁶ из 44 дворов, по которым в 2018 году выполнено благоустройство (в виде асфальтирования или установки детских площадок), имеется потребность в устройстве освещения, по 5 площадкам⁴⁷, где выполнено асфальтирование, необходимы детские площадки. Таким образом, надлежащий уровень комфорта этих дворовых территорий не достигнут.

10. По данным отчета о достижении целевых показателей результативности предоставления субсидий из краевого бюджета на

⁴⁵ пункт 2.3 приказа Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»

⁴⁶ ул. Славянская, 17, Часовитина, 11, Луговая, 64, 66, 70, М. Расковой, 7, Вилкова, 12, Борисенко, 10/7, Спиридонова, 28, Вострецова, 10, Иртышская, 4а, Постышева, 11, пр. Красного Знамени, 91, 102, 104, ул. Нейбута, 63, 81а, Крыгина, 86в, Гризодубовой, 51, Горная, 33, Громова, 12, Каплунова, 8, 23, Сафонова, 24, Русская, 11, 58а, 94

⁴⁷ пр. Красного Знамени, 102, 104, ул. Луговая, 70, Русская, 11, 94

поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018 году в рамках реализации Государственной программы в полном объеме (100,0 %) достигнуты все целевые показатели, в том числе:

«количество дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами)» (факт - 44 двора, при плане – 44 двора).

Вместе с тем, как указано выше, 27 из 44 дворов полностью не освещены, по 5 дворам необходимы детские площадки, кроме того, по данным адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, по всем 44 дворам требовалась установка скамеек и урн⁴⁸. При этом в 2018 году в рамках муниципальной программы работы по освещению дворов не осуществлялись, детские площадки по этим 5 адресам не устанавливались, а урны и скамейки установлены только в 28 из 44 дворов. Таким образом, учитывая сохранившуюся потребность в благоустройстве по отдельным элементам, плановое значение показателя фактически не достигнуто.

«доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий» (план-100,0 %, факт – 100,0 %). При расчете фактических значений указанного показателя управлением градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока учтены 3 общественных территории: «Зона отдыха «Площадь Спортивная Гавань». Общественный туалет», сквер им. А.С. Пушкина и территория МАУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества». Вместе с тем, учитывая что часть работ по вышеуказанным объектам, предусмотренная проектной документацией, в 2018 году не выполнялась (по общественной территории «Зона отдыха «Площадь Спортивная Гавань». Общественный туалет» – устройство канализации, технологическое присоединение, установка ограждений, озеленение; территории МАУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества» – ремонт подпорных стен, озеленение; скверу им. А.С. Пушкина – озеленение), сохранилась потребность в устройстве (ремонте) отдельных элементов благоустройства общественных территорий.

Дальнегорский городской округ

В 2017 году в Дальнегорском городском округе благоустроено 3 дворовые территории, 2 территории общего пользования – территория, прилегающая к общественному зданию МБУ «Централизованная библиотечная система», сквер на проспекте 50 лет Октября и обустройство 1 места массового отдыха - парк «Березка».

⁴⁸ приложение № 10 к МП «Формирование современной городской среды на территории ВГО» на 2018-2024 годы

В 2018 году благоустроено 3 дворовых территории, 1 территория общего пользования – центральная площадь, а также продолжены работы по благоустройству парка «Березка».

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы № 10 и Государственной программы в 2017 - 2018 годах составили 29 721,7 тыс. рублей (ФБ – 24 593,2 тыс. рублей, КБ - 3 793,1 тыс. рублей, МБ – 1 335,4 тыс. рублей), в том числе:

 благоустройство дворовых территорий – 11 024,2 тыс. рублей (ФБ – 9 138,2 тыс. рублей, КБ – 1 508,5 тыс. рублей, МБ – 377,5 тыс. рублей);

 благоустройство общественных территорий – 14 309,3 тыс. рублей (ФБ – 11 786,7 тыс. рублей, КБ – 1 708,6 тыс. рублей, МБ – 814,0 тыс. рублей);

 обустройство мест массового отдыха населения – 4 388,2 тыс. рублей (ФБ – 3 668,3 тыс. рублей, КБ – 576,0 тыс. рублей, МБ – 143,9 тыс. рублей).

В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Дальнегогорского городского округа установлено следующее.

1. Сметные расчеты, обосновывающие стоимость работ по муниципальным контрактам от 18.09.2017 № 0120300020017000044_168140, от 03.09.2018 № 0120300020018000034_168140, заключенным Администрацией Дальнегогорского городского округа с ООО ДВСК «Армада» на выполнение работ по благоустройству общественных территорий г. Дальнегогорска, а также от 11.09.2017 № 0120300020017000641_168140, заключенному Администрацией Дальнегогорского городского округа с ООО «Дальград» на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов № 9 и № 7 по ул. Пионерская и № 1 по ул. Менделеева в г. Дальнегогорск (ремонт дворовых проездов с оборудованием автомобильных парковок) и от 25.10.2017 № 012030002001700061_168140, заключенному Администрацией Дальнегогорского городского округа с ООО УО «Гарант» на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с установкой малых форм, не соответствуют сметным расчетам, прошедшим ценовую экспертизу.

Кроме того, в сметный расчет, обосновывающий стоимость работ по муниципальному контракту от 03.09.2018 № 0120300020018000034_168140, заключенному Администрацией Дальнегогорского городского округа с ООО ДВСК «Армада» на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Центральная площадь», включены непредвиденные затраты в сумме 165,8 тыс. рублей и затраты на осуществление строительного контроля в сумме 211,4 тыс. рублей, не предусмотренные сметной документацией, прошедшей ценовую экспертизу и утвержденной и.о. Главы Дальнегогорского городского округа.

Необходимо отметить, что из совокупности нормативных положений, приведенных в статье 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положении о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов

капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 следует, что строительный контроль, проводимый заказчиком, не подлежит финансированию по договору строительного подряда, поскольку финансируется за счет накладных расходов подрядчика, предусмотренных в цене договора.

2. Администрацией Дальнегорского городского округа не приняты меры к взысканию с подрядной организации – ООО ДВСК «Армада» пени в сумме 7,5 тыс. рублей за просрочку исполнения муниципального контракта от 18.09.2017 № 0120300020017000044_168140.

Расчет неустойки за нарушение подрядной организацией – ООО ДВСК «Армада» условий муниципального контракта от 03.09.2018 № 0120300020018000034_168140 произведен Администрацией Дальнегорского городского округа с нарушением пункта 9.6 муниципального контракта, в результате чего размер неустойки занижен на 10,2 тыс. рублей.

В период проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Дальнегорского городского округа проведены осмотры выполненных работ, в результате которых установлено:

парк «Березка» - частичное отсутствие цветов на клумбе и подвесных деталей у качелей на детских площадках, повреждение бетонного основания на волейбольной площадке;

территория, прилегающая к общественному зданию МБУ «Централизованная библиотечная система» - наличие металлических штырей, торчащих из земли и несущих угрозу жизни и здоровью граждан;



г. Дальнегорск территория МБУ «Централизованная библиотечная система» после благоустройства

(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты Дальнегорского городского округа 20.05.2019)

детская площадка на придомовой территории по ул. Пионерская, 9 – частичное отсутствие подвесных деталей качелей.

В период проведения контрольного мероприятия сотрудниками Контрольно-счетной палаты Дальнегорского городского округа проведено анкетирование жителей домов, дворовые территории которых были благоустроены.

Участие в анкетировании приняли 19 человек. Результаты анкетирования показали следующее:

качество работ по благоустройству детской площадки в целом оценивается на 4,8 балла (по 5-балльной шкале), в том числе: обустройство – 5 баллов, ограждение – 4,5 балла, озеленение – 4,8 балла, обеспечение доступности для инвалидов – 5 баллов;

качество работ по благоустройству дворовой территории в целом также оценивается на 4,8 балла, в том числе: асфальтовое покрытие – 5 баллов, обустройство – 5 баллов, ограждение – 4 балла, озеленение – 4,8 балла; обеспечение доступности для инвалидов – 5 баллов.

Во время проведения анкетирования от граждан получены следующие предложения по улучшения благоустройства: строительство дополнительных тротуаров, увеличение площади озеленения дворовых территорий, установка декоративных ограждений дворовых территорий.

Дальнереченский городской округ

В 2017 году в Дальнереченском городском округе благоустроено 6 дворовых территорий, 1 территория общего пользования – Аллея «Победы» и городской парк.

В 2018 году благоустроено 2 дворовые территории, продолжены работы по благоустройству Аллеи «Победы» и городского парка.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы № 10 и Государственной программы в 2017 - 2018 годах составили 28 097,5 тыс. рублей (ФБ – 22 972,2 тыс. рублей, КБ - 3 938,6 тыс. рублей, МБ – 988,2 тыс. рублей, ВНБ – 198,5 тыс. рублей), в том числе:

благоустройство дворовых территорий – 12 778,4 тыс. рублей (ФБ – 10 233,4 тыс. рублей, КБ – 1 875,5 тыс. рублей, МБ – 471,0 тыс. рублей, ВНБ – 198,5 тыс. рублей);

благоустройство общественных территорий – 10 057,0 тыс. рублей (ФБ – 8 433,4 тыс. рублей, КБ – 1 298,4 тыс. рублей, МБ – 325,2 тыс. рублей);

обустройство мест массового отдыха населения – 5 262,1 тыс. рублей (ФБ – 4305,4 тыс. рублей, КБ – 764,7 тыс. рублей, МБ – 192,0 тыс. рублей).

В период проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Дальнереченского городского округа проведены осмотры и контрольные обмеры выполненных работ (выборочно), в результате которых установлено следующее.

По благоустройству территорий Аллеи Победы и городского парка нарушений не установлено.

Муниципальные контракты на благоустройство придомовых территорий заключены МКУ «Управление жилищно-коммунального

хозяйства Дальнереченского городского округа» с подрядной организацией ООО «Стройтехнологии».

При осмотре выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Графская, 8, ул. Героев Даманского, 40, пер. Прямой, 7, в с. Лазо по ул. Стрелковая, 3, ул. Сергея Лазо, 29а, 35а отмечены факты некачественно выполненных работ – трещины асфальтобетонного покрытия, лужи. По факту разрушения асфальтобетонного покрытия придомовой территории по ул. Графская, 8 МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» подготовило претензию подрядной организации ООО «Стройтехнологии» о ненадлежащем исполнении условий контракта. В отношении других территорий претензионная работа не ведется.

В результате контрольного обмера выполненных работ по благоустройству придомовой территории по ул. Ленина, 70 установлен факт приемки и оплаты фактически невыполненных работ по установке бортовых камней (11,6 м) на сумму 19,5 тыс. рублей, по ул. Уссурийская, 50 – отсутствие 13 м бортовых камней в результате кражи.

В период проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Дальнереченского городского округа проведено анкетирование жителей домов, дворовые территории которых были благоустроены.

Участие в анкетировании приняли 71 человек. Результаты анкетирования показали следующее:

качество работ по благоустройству дворовых территорий в целом оценивается на 4,4 балла (по 5-балльной шкале), в том числе: асфальтовое покрытие – 4,3 балла, обустройство – 4,5 балла.

По результатам анкетирования, можно сделать вывод, о том, что жители г. Дальнереченска в целом удовлетворены проведенными работами по благоустройству дворовых территорий.

Во время проведения анкетирования от граждан получены следующие предложения по улучшения благоустройства: установка бордюрного камня, установка дополнительного оборудования и лавочек на детской площадке, установка ограждения вокруг детской площадки, мусорного контейнера.

Лесозаводский городской округ

В 2017 году в Лесозаводском городском округе благоустроено 8 дворовых территорий и 1 территория общего пользования – пешеходная зона с обустройством зоны отдыха по ул. Пушкинская.

В 2018 году благоустроено 4 дворовые территории и 3 территории общего пользования – сквер «Планета», Парк «Ружино», продолжены работы по благоустройству пешеходной зоны по ул. Пушкинская.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы № 10 и Государственной программы в 2017 - 2018 годах составили 23 112,6 тыс. рублей (ФБ – 18 038,7 тыс. рублей, КБ – 2 943,0 тыс. рублей, МБ – 1 713,1 тыс. рублей, ВНБ – 418,1 тыс. рублей), в том числе:

благоустройство дворовых территорий – 15 408,1 тыс. рублей (ФБ – 12 396,3 тыс. рублей, КБ – 2 074,4 тыс. рублей, МБ – 519,3 тыс. рублей, ВНБ – 418,1 тыс. рублей);

благоустройство территорий общего пользования – 7 704,5 тыс. рублей (ФБ – 5 642,4 тыс. рублей, КБ – 868,3 тыс. рублей, МБ – 1 193,8 тыс. рублей).

В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Лесозаводского городского округа установлено следующее:

- в нарушение подпункта б) пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» дополнительным соглашением от 09.10.2017 № 348 к муниципальному контракту от 13.09.2017 № 268, заключенному администрацией Лесозаводского городского округа с ООО «Хабаровскдорснаб» на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, предусмотрено увеличение объемов работ более чем на 10 % (дополнительно предусмотрено устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей на придомовой территории по ул. Путейская, 10 в количестве 110 м², что составляет 14,7 % от первоначальной площади асфальтирования (750 м²);

- Администрацией Лесозаводского городского округа не приняты меры к взысканию с исполнителей муниципальных контрактов пени за просрочку исполнения муниципальных контрактов в сумме 40,3 тыс. рублей.

В период проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Лесозаводского городского округа проведены осмотры и контрольные обмеры (выборочно) выполненных работ, в результате чего установлено следующее:

- в результате контрольного обмера выполненных работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам по ул. Сибирцева, 88, Спортивная, 4, Урицкого, 7, Мира 1, 2, 3, Путейская, 11 и общественных территорий – парк «Ружино» и сквер «Планета» установлен факт приемки и оплаты фактически невыполненных работ на общую сумму 1 565,7 тыс. рублей (средства субсидии – 1 449,5 тыс. рублей, МБ – 43,5 тыс. рублей, ВНБ – 72,7 тыс. рублей);

- по дворовым территориям по ул. Путейская, 11, Мира, 1, 2, 3, Спортивная, 4, Урицкого, 7 отмечено практически полное выкрашивание асфальтобетонного покрытия. На оплату работ по асфальтированию данных территорий затрачено 1 541,9 тыс. рублей бюджетных средств;

- по результатам выполнения работ по ремонту освещения парка «Ружино» и сквера «Планета» установлено, что монтаж опор освещения проведен по примыкающим улицам Ленинская и Урицкого. Из запланированных к установке 2 железобетонных опор и 13 стальных установлены 1 железобетонная и 11 стальных опор. Из 24 светильников установлено 20. Освещение подключено только на территории ул. Ленинской, угол ул. Урицкого к освещению не подключен. Согласно

данным анкетирования жителей мкр. Ружино пользоваться парковой зоной и территорией сквера «Планета» в темное время суток невозможно.

В период проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Лесозаводского городского округа проводился опрос граждан о выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий. В опросе приняли участие 28 человек.

Положительные отзывы были получены по благоустройству дворовых территорий, проведенному в 2017 году, а также по благоустройству пешеходной зоны по ул. Пушкинская.

По благоустройству дворовых территорий, проводимому в 2018 году, отзывы граждан негативные из-за большого количества невыполненных работ, а также ненадлежащего качества выполненных.

Первому этапу благоустройства сквера «Планета» и парка «Ружино» также не дано положительных отзывов.

Находкинский городской округ

В 2017 году в Находкинском городском округе благоустроено 4 дворовых территории, 1 территория общего пользования – сквер 100-летия образования пограничных войск России.

В 2018 году благоустроено 4 территории общего пользования – сквер по ул. Свердлова, сквер по ул. Ленинской, сквер по ул. Спортивная, а также продолжены работы по благоустройству сквера 100-летия образования пограничных войск России. Благоустройство дворовых территорий в 2018 году не производилось.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы № 10 и Государственной программы в 2017 - 2018 годах составили 83 898,1 тыс. рублей (ФБ – 57 300,0 тыс. рублей, КБ - 8 312,0 тыс. рублей, МБ – 18 232,1 тыс. рублей), в том числе:

благоустройство дворовых территорий – 7 046,5 тыс. рублей (ФБ – 5 608,7 тыс. рублей, КБ – 1 148,8 тыс. рублей, МБ – 289 тыс. рублей); благоустройство общественных территорий – 78 146,3 тыс. рублей (ФБ – 53 009,7 тыс. рублей, КБ – 7 433,3 тыс. рублей, МБ – 17 703,3 тыс. рублей).

В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Находкинского городского округа установлено следующее.

1. В нарушение пункта 1.3. «Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» перечня территорий общего пользования, подлежащих ремонту», утвержденного постановлением администрации Находкинского городского округа от 29.03.2017 № 384, предложений на включение территорий общего пользования в адресный перечень для организации благоустройства сквера по ул. Лермонтова не поступало. Таким образом, выбор сквера по ул. Лермонтова для включения в Муниципальную

программу на 2017 год не обоснован, поскольку мнение граждан не учитывалось.

2. Благоустройство сквера 100-летия образования пограничных войск России в районе ул. Лермонтова проводилось двумя этапами – в 2017 и в 2018 годах. В ходе проведения выездной проверки Контрольно-счетной палатой Находкинского городского округа установлено, что на элементах благоустройства имеются различные дефекты, не устраненные в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту от 20.06.2017 № 01203000102170001110060336-01, заключенному с ООО «НАБО»; не осуществляется текущее содержание устроенной ливневой канализации.

3. Благоустройство сквера по ул. Свердлова, 45 производилось в 2018 году. В ходе проведенного в рамках контрольного мероприятия визуального осмотра территории сквера было установлено, что результаты работ по благоустройству сквера на ул. Свердлова, 45 в целом достигнуты. Однако Контрольно-счетной палатой Находкинского городского округа установлено, что в рамках проведения мероприятий по благоустройству сквера проведены дополнительные работы по валке деревьев, обрезке крон деревьев и кустарников, погрузочно-разгрузочные работы и перевозка веток, засыпка траншей землей растительной механизированной заготовки. Указанные работы не были предусмотрены проектно-сметной документацией на выполнение работ по благоустройству сквера. Акты о необходимости производства дополнительных работ заказчиком не составлялись. Сметная стоимость дополнительных работ не определялась и экспертизе не подвергалась. При этом указанные дополнительные работы приняты и оплачены заказчиком.

Кроме того, кустарники жасмина и снежноягодника были заменены на саженцы форзиции и спиреи без подтверждения качественных характеристик данных изменений. На установленной детской площадке имеются дефекты, не устраненные в рамках гарантийных обязательств по контракту. Все работы производились по муниципальному контракту от 13.08.2018 № 01203000102180002090060336-01, заключенному с ООО «Мастер».

4. Благоустройство сквера по ул. Ленинская производилось в 2018 году (муниципальный контракт от 13.08.2018 № 01203000102180002110060336-02, заключенный с ООО «Мастер»). В результате визуального осмотра установлено, что зеленые насаждения отсутствуют на большей части благоустраиваемой территории, а количество высаженных многолетних цветов на территории сквера на момент осмотра не соответствует густоте посадки в 16 ед. на 1 м². Общая стоимость работ по озеленению территории сквера составила 1 969,6 тыс. рублей. Также установлено несоблюдение рекомендуемых сроков озеленения.

5. В рамках работ по комплексному благоустройству сквера по ул. Ленинская (муниципальный контракт с ООО «Мастер» от 13.08.2018 № 01203000102180002110060336-02) произведено строительство детской игровой площадки. Детская площадка расположена между

многоквартирными домами. С территории сквера наличие детской площадки не просматривается. Кроме того, в составе работ по устройству детской площадки выполнено асфальтирование пешеходной дорожки с установкой бортовых камней и строительство наружной лестницы (стоимость работ 136,7 тыс. рублей), ведущих к многоквартирному дому по № 5 по ул. Владивостокская (в другую сторону от сквера). А также, выполнены работы по ремонту бельевой площадки: установлены стойки для сушки белья, заасфальтирована территория бельевой площадки площадью 106,8 м² с установкой бортовых камней (стоимость работ составила 202,2 тыс. рублей).

Согласно выписке из реестра муниципального имущества Находкинского городского округа от 11.06.2019 № 1/1, предоставленной Контрольно-счетной палате Находкинского городского округа, в территорию сквера по ул. Ленинская построенная детская площадка не входит. Перечень работ по скверу по ул. Ленинской, указанный в приложении 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа на 2018 - 2024 годы», содержит работы по комплексному благоустройству территории сквера. Таким образом, направление бюджетных средств на строительство детской площадки в сумме 2 617,7 тыс. рублей (в том числе средства субсидии – 2 541,8 тыс. рублей) не соответствует целям предоставления субсидий в рамках реализации Приоритетного проекта, а также целям и задачам муниципальной программы, и в соответствии со статьей 306.4. Бюджетного Кодекса Российской Федерации признается нецелевым использованием бюджетных средств.

В период проведения контрольного мероприятия сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края и сотрудниками Контрольно-счетной палаты Находкинского городского округа осуществлены выезды для осмотра благоустроенных территорий. При осмотре установлено:

1. **Общественные территории**


Сквер по ул. Ленинская (заказчик – Администрация Находкинского городского округа, подрядчик – ООО «Мастер»)



Сквер по ул. Ленинская

(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края 03.06.2019)

В ходе осмотра установлено, что в рамках работ по благоустройству сквера выполнены работы по устройству детской и бельевой площадок на территории близлежащих домов, которые не относятся к территории сквера.

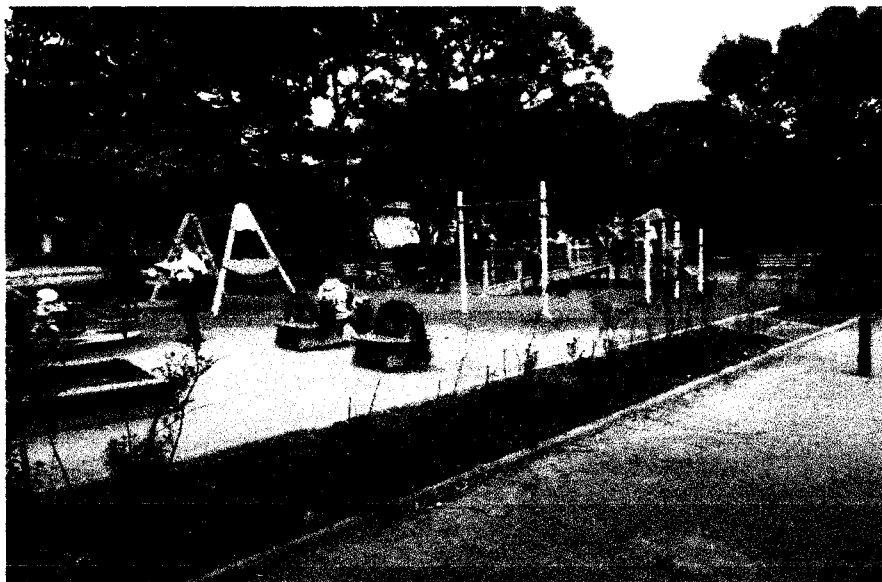

Детская и бельевая площадки во дворе жилого дома по ул. Ленинской

(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края 03.06.2019)

Сквер 100-летия образования пограничных войск России (заказчик – Администрация Находкинского городского округа, подрядчик – ООО «НАБО»)

В ходе осмотра отмечены повреждения облицовки мемориального комплекса, стекла светильников у основания стелы имеют трещины.



Сквер 100-летия образования пограничных войск России
(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края 03.06.2019)

2. Дворовые территории

ул. Гагарина 17, Арсеньева 3 (заказчик - Администрация Находкинского городского округа, подрядчик – ООО «НАБО»).

В ходе визуального осмотра недостатков и замечаний к качеству выполненных работ не установлено.



Ул. Гагарина, 17

Ул. Арсеньева, 3

(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края 03.06.2019)

Анкетирование граждан об их удовлетворенности результатами благоустройства придомовых и общественных территории Находкинского городского округа, проведенное Контрольно-счетной палатой Находкинского городского округа во время выездной проверки, показало, что в целом граждане удовлетворены проведенными работами по благоустройству придомовых и общественных территорий.

Участие в опросе приняли 29 человек.

Результаты анкетирования показали следующее:

качество работ по благоустройству дворовых территорий в целом оценивается на 4,8 балла (по 5-балльной шкале), в том числе: асфальтовое покрытие – 4,8 балла, обустройство – 4,7 балла;

качество работ по благоустройству скверов в целом оценивается на 4,6 балла, в том числе: асфальтовое покрытие – 5 баллов, обустройство – 4,8 балла, ограждение - 4,4 балла, озеленение – 4 балла, обеспечение доступности для инвалидов – 4,7 балла.

Во время проведения анкетирования от граждан получены следующие предложения по улучшения благоустройства: строительство «лежачих полицейских» во дворах; увеличение площади озеленения дворовых и общественных территорий; увеличение количества детских площадок; установка на территории парковых зон и скверов фонтанов и общественных туалетов.

Партизанский городской округ

В 2017 году в Партизанском городском округе благоустроено 7 дворовых территорий, в 2018 году 1 территория общего пользования – городской парк.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы № 10 и Государственной программы в 2017 - 2018 годах составили 23 212,7 тыс. рублей (ФБ – 19 488,6 тыс. рублей, КБ – 2 977,5 тыс. рублей, МБ – 746,6 тыс. рублей), в том числе:

благоустройство дворовых территорий – 5 872,0 тыс. рублей (ФБ – 4 673,9 тыс. рублей, КБ – 957,3 тыс. рублей, МБ – 240,8 тыс. рублей);

благоустройство территорий общего пользования – 17 340,7 тыс. рублей (ФБ – 14 814,7 тыс. рублей, КБ – 2 020,2 тыс. рублей, МБ – 505,8 тыс. рублей).

В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Партизанского городского округа установлено следующее:

- в перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве на территории Партизанского городского округа, утвержденный постановлением администрации Партизанского городского округа от 25.07.2018 № 873-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» на 2018 – 2022 годы», включены 4 общественные территории - стела «Партизанск», сквер в районе жилых домов по ул. Калинина, 13-15 в с. Углекаменск, сквер «Лозовый» по ул. Индустриальная, 11, городская площадь, не входящие в состав муниципального имущества Партизанского городского округа и не состоящие на учете в реестре муниципальной казны;

- отбор дворовых территорий, запланированных к благоустройству в 2019 году, осуществлялся без учета критериев оценки предложений заинтересованных лиц, что нарушает требования пункта 3 Порядка

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в благоустройство дворовых территорий в программу, утвержденного постановлением администрации Партизанского городского округа от 06.07.2017 №1176-па (в редакции от 08.11.2017 № 1736-па);

- в нарушение статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», части 2 статьи 8, части 5 статьи 24 Федерального закона № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Управлением жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа раздроблена сделка на сумму 587,2 тыс. рублей по ремонту дворовых территорий 7 многоквартирных домов (ул. Нагорная, 4, ул. Центральная, 15, ул. Гоголевская 9, 13, ул. Тепличная 1, 2, ул. Павлова, 3а), путем заключения 7 договоров с одним и тем же исполнителем (ООО «ОРАНЖ-ГРУПП»), одной датой и идентичными работами, что является не конкурентным способом и не позволило организации снизить цену сделки, что повлекло к выбору неконкурентного способа определения подрядчика (поставщика);

- в нарушение требований пункта 2.2. Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу, утвержденного постановлением администрации Партизанского городского округа от 28.02.2017 № 293-па, Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Партизанского городского округа не приняты меры по передаче в состав общего имущества многоквартирных домов малых архитектурных форм с учетом работ по их установке на общую сумму 587,2 тыс. рублей.

В период проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Партизанского городского округа проведены осмотры и контрольные обмеры (выборочно) выполненных работ.

По результатам контрольных обмеров нарушений не установлено, при этом установлены факты некачественно выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия и установке малых архитектурных форм по 6 дворовым территориям, благоустроенным в 2017 году.

По работам, произведенным в 2018 году в Городском парке, отмечено неустойчивое положение установленных 56 опор освещения (3 опоры имеют значительный уклон), а также дефекты асфальтобетонного покрытия.

По результатам осмотра Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Партизанского городского округа (заказчик) в адрес подрядчика (ООО «Нарек») направлена претензия о ненадлежащем качестве выполненных работ.

В период проведения контрольного мероприятия сотрудниками Контрольно-счетной палаты Партизанского городского округа проведено анкетирование жителей домов, дворовые территории которых были благоустроены.

Участие в анкетировании приняли 39 человек. Результаты анкетирования показали следующее:

качество работ по благоустройству дворовой территории в целом оценивается на 4,1 балла (по 5-балльной шкале), в том числе: асфальтовое покрытие – 4,0 балла, обустройство – 3,9 балла, установка скамеек и урн – 4,3 балла.

Во время проведения анкетирования от граждан получены следующие предложения по улучшению благоустройства: устранение подтоплений дворовых территорий, образующихся из-за несоблюдения уклона при укладке асфальта, установка площадок для сушки белья, озеленение зон отдыха во дворах, установка детских и спортивных площадок.

Уссурийский городской округ

В 2017 году в Уссурийском городском округе благоустроено 20 дворовых территорий, 1 территория общего пользования – парк имени А.К. Чумака.

В 2018 году благоустроено 28 дворовых территорий, 1 территория общего пользования – сквер имени В. Кузьменчука.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы № 10 и Государственной программы в 2017 - 2018 годах составили 94 318,3 тыс. рублей (ФБ – 66 043,1 тыс. рублей, КБ - 10 361,2 тыс. рублей, МБ – 16 249,9 тыс. рублей, ВНБ – 1 664,1 тыс. рублей), в том числе:

благоустройство дворовых территорий – 59 566,0 тыс. рублей (ФБ – 40 797,9 тыс. рублей, КБ – 6 506,7 тыс. рублей, МБ – 10 597,3 тыс. рублей, ВНБ – 1 664,1 тыс. рублей);

благоустройство общественных территорий – 34 752,3 тыс. рублей (ФБ – 25 245,2 тыс. рублей, КБ – 3 854,5 тыс. рублей, МБ – 5 652,6 тыс. рублей).

В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Уссурийского городского округа установлено:

1. В нарушение пункта 2.6 договора от 24.07.2017 № 6/н с ООО «Вершина» (выполнение работ по благоустройству парка имени А.К. Чумака) заключено дополнительное соглашение от 29.08.2017 на выполнение дополнительных работ на сумму 300,0 тыс. рублей, которым предусмотрено увеличение объемов работ по ранее заключенному договору (окраска ограждения, установка бортового камня) и дополнительного вида работ (разметка дорожки). Стоимость принятых и оплаченных работ, не предусмотренных предметом основного договора, составляет 4,8 тыс. рублей.

2. В нарушение пункта 2.6 договора от 04.10.2018 № 77 с ООО «ДальСтройСервис» (выполнение работ по благоустройству сквера имени В. Кузьменчука) заключено дополнительное соглашение от 22.11.2018 № 1 на выполнение дополнительных работ на сумму 750,0 тыс. рублей, которое предусматривает увеличение объема работ по ранее заключенному договору

(устройство тротуара из брусчатки, устройство бортового камня) и выполнение дополнительных видов работ (установка подпорной стены и фундамента под арку). Стоимость принятых и оплаченных работ, не предусмотренных предметом основного договора, составляет 316,9 тыс. рублей.

В период проведения контрольного мероприятия сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края и сотрудниками Контрольно-счетной палаты Уссурийского городского округа осуществлены выезды для осмотра благоустроенных территорий. При осмотре установлено:

1. Дворовые территории

ул. Афанасьева, 11 (заказчик – Администрация Уссурийского городского округа, подрядчик – ООО «ДСУ-2»). В ходе осмотра установлено наличие трещин асфальтобетонного покрытия по линии прохождения теплотрассы. По результатам осмотра администрацией городского округа в лице управления жилищной политики направлено письмо ООО «ДСУ-2» (подрядной организации, выполняющей работы по муниципальному контракту от 30.08.2017 № 0120300006517000145-0151796-01) с требованием устранить выявленные дефекты (продольные трещины асфальтобетонного покрытия в районе подъезда № 1) в срок до 01.07.2019;



Ул. Афанасьева, 11

(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края 05.06.2019)

ул. Кушнера, 30 (получатель субсидии – ООО «УЖИК-1», исполнитель работ – ООО «Фриз БК»)

В ходе осмотра установлено, что асфальтобетонное покрытие территории местами выкрашивается, имеются трещины, ямы. По результатам осмотра ООО «УЖИК-1» (получатель бюджетной субсидии) направил письмо от 07.06.2019 № 254 в адрес подрядной организации ООО «Фриз БК» с требованием устранить выявленные дефекты в срок до 30.06.2019 в рамках исполнения гарантийных обязательств;



Ул. Кушнера, 30


(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края 05.06.2019)

ул. Комсомольская, 6. В ходе осмотра установлено выкрашивание асфальтобетонного покрытия вокруг колодца.

2. Общественные территории

Сквер имени В. Кузьменчука (заказчик – МАУК «Городские парки УГО», подрядчик – ООО «Дальстройсервис»)

В ходе осмотра установлено, что выполнение мероприятий по благоустройству сквера позволило создать новую общественную территорию, имеющую завершенный и эстетически привлекательный внешний вид.

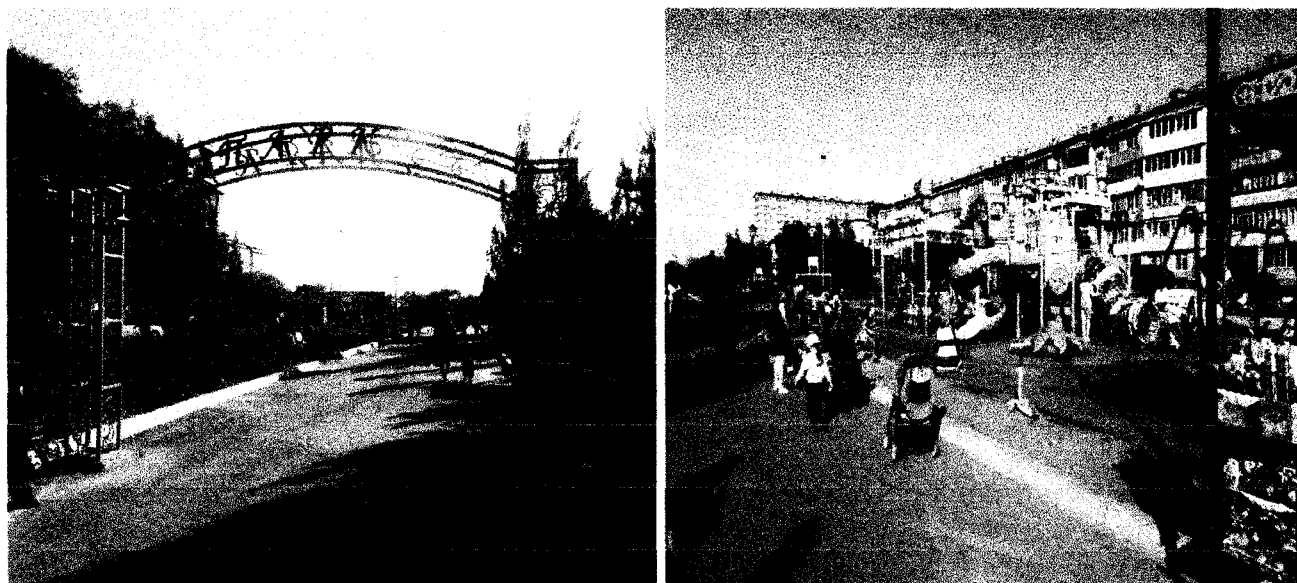

Сквер имени В. Кузьменчука

(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края 05.06.2019)

Следует отметить, что правилами благоустройства и содержания территории Уссурийского городского округа, являющимися приложением к решению Думы Уссурийского городского округа от 31.10.2017 года № 687-НПА предусмотрено размещение туалетных кабин на активно посещаемых территориях Уссурийского городского округа при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации, в местах установки АЗС, на автостоянках, а также при некапитальных нестационарных сооружениях питания⁴⁹.

Осуществленные муниципалитетом программные мероприятия позволили сделать общественные территории Уссурийского городского округа уютными и комфортными, что отвечает приоритетам государственной политики в области формирования комфортной городской среды. Подтверждением тому является, в том числе мнение жителей городского округа (учитывая результаты анкетирования), а также признание проекта благоустройства парка имени А.К. Чумака, презентованного на региональном конкурсе лучших практик реализации муниципальных программ «Формирование современной городской среды» в Приморском крае, проводимом Минстроем России, одним из лучших. За презентацию лучших практик благоустройства общественных мест и дворовых территорий по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» администрация Уссурийского городского округа награждена дипломом.

По результатам анкетирования граждан по вопросу удовлетворенности населения городского округа уровнем благоустройства общественных территории, в целом, можно сделать вывод об удовлетворенности населения комфортностью благоустроенных парка имени А.К. Чумака и сквера имени В. Кузьменчука. В тоже время у жителей городского округа присутствует мнение о необходимости наличия в парках, скверах, с достаточно высокой посещаемостью, туалетных комнат. Кроме того выражено мнение о потребности привлечения правоохранительных органов в целях соблюдения правопорядка, а также безопасности, либо наличие видеонаблюдения, что, в свою очередь, будет способствовать безопасности жизнедеятельности населения и сохранению муниципального имущества от вандализма.

В ходе проведения анкетирования граждан, проживающих в многоквартирных домах, благоустройство дворовых территорий которых было осуществлено при реализации программы формирования городской среды, по вопросу удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий, жителями многоквартирных домов выражено мнение, что собственники помещений многоквартирных домов за счет собственных

⁴⁹пункт 13.11. Правил благоустройства и содержания территории Уссурийского городского округа

средств не в состоянии нести расходы в полном объеме - участие бюджета позволяет улучшить уровень комфортного проживания в Уссурийском городском округе, гражданами программа признается эффективной. Но при этом отмечены недостатки по ряду дворовых территорий, в частности к качеству асфальтобетонного покрытия. Кроме того, жителями отдельных многоквартирных домов, в которых выполнены работы по минимальному перечню, выражено желание на выполнение работ по дополнительному перечню: устройство детских и спортивных площадок, оборудование бельевых площадок, автопарковок.

В целях получения мнения граждан по вопросу удовлетворенности населения городского округа уровнем благоустройства территории округа опрошено 16 жителей из 6 домов и 3 посетителя общественной территории сквера имени В. Кузьменчука.

Опрос жителей Уссурийского городского округа о выполнении работ по благоустройству, проведенных в 2017-2018 годах, в виде анкетирования показал следующее (оценка по 5-балльной шкале):

1) качество работ по благоустройству детских площадок в целом оценивается на 5,0 баллов, в том числе: обустройство – 5 баллов, ограждение – 5 баллов;

2) качество работ по благоустройству дворовых территорий в целом оценивается на 4,2 балла, в том числе: асфальтовое покрытие - 4,2 балла; обеспечение доступности для инвалидов - 4,1 балла;

3) качество работ по благоустройству общественной территории оценивается в целом на 4,4 балла, в том числе: обустройство – 5 баллов; ограждение – 4 балла; озеленение – 4 балла; обеспечение доступности для инвалидов - 4,7 балла.

Городской округ Спасск-Дальний

В 2017 году в городском округе Спасск-Дальний выполнено благоустройство городского парка культуры и отдыха им. А. Борисова, благоустройство дворовых территорий не производилось.

В 2018 году благоустроено 5 дворовых территорий, 1 территория общего пользования – центральная площадь и продолжены работы по благоустройству городского парка культуры и отдыха им. А. Борисова.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы № 10 и Государственной программы в 2017 - 2018 годах составили 19 395,6 тыс. рублей (ФБ – 15 618,9 тыс. рублей, КБ – 2 314,8 тыс. рублей, МБ – 1 169,5 тыс. рублей, ВНБ – 292,4 тыс. рублей), в том числе:

благоустройство дворовых территорий – 5 847,7 тыс. рублей (ФБ – 4 746,9 тыс. рублей, КБ – 647,3 тыс. рублей, МБ – 161,1 тыс. рублей, ВНБ – 292,4 тыс. рублей);

благоустройство территорий общего пользования – 7 081,1 тыс. рублей (ФБ – 5 750,6 тыс. рублей, КБ – 784,2 тыс. рублей, МБ – 546,3 тыс. рублей);

обустройство мест массового отдыха населения – 6 466,8 тыс. рублей (ФБ – 5 121,4 тыс. рублей, КБ – 883,3 тыс. рублей, МБ – 462,1 тыс. рублей).

В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой городского округа Спасск-Дальний установлено следующее.

1. Администрацией городского округа Спасск-Дальний не применялись штрафные санкции к подрядным организациям ООО «Альтастрой», ИП Мокий С.В., ООО РО «СпасскКоммуналСервис» при нарушении сроков выполнения работ, предусмотренные условиями муниципальных контрактов. Общая сумма неустойки, подлежащая взысканию с подрядных организаций, составляет 48,5 тыс. руб.

2. В процессе исполнения муниципального контракта от 17.09.2018 № 012030001821800039-0096892-03 на выполнение работ по ремонту освещения городского парка культуры и отдыха им. А. Борисова в 2018 году, заключенного с ИП Мокий С.В., произошло изменение технологии работ, предусмотренных техническим заданием, а именно: подземные работы по прокладке кабеля КЛ-0,4 кВ заменены на подвеску самонесущего изолированного провода СИП 4х16 и СИП 2х16 (общей протяженностью 400 м) по причине большого износа существующих кабельных сетей, а также необходимостью вскрытия асфальта.

Следует отметить, что устройство асфальтового покрытия в городском парке культуры и отдыха им. А. Борисова производилось за счет средств субсидий в 2017 году. То есть, при планировании благоустройства городского парка не учитывалась синхронизация работ. Сметная документация на монтаж самонесущего изолированного провода не проходила ценовую экспертизу, предусмотренную Правилами предоставления субсидии.

А также в нарушение подпункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» произведено изменение существенных условий контракта от 17.09.2018 № 012030001821800039-0096892-03 при его исполнении.

3. В нарушение протокола заседания общественной комиссии от 28.06.2017, которым утвержден дизайн-проект благоустройства городского парка культуры и отдыха им. А. Борисова, в 2018 году произведены работы по демонтажу декоративного ограждения дорожек.

При этом в 2017 году произведены расходы по окраске декоративного забора, скамеек и опор освещения на общую сумму 173,7 тыс. рублей, которые в следующем году были демонтированы, что, по мнению Контрольно-счетной палаты городского округа Спасск-Дальний, является неэффективным использованием средств субсидий.

4. В период проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой городского округа Спасск-Дальний проведены контрольные обмеры выполненных работ, в результате которых установлены случаи приемки и оплаты фактически не выполненных работ на общую сумму 245,3

тыс. рублей по муниципальным контрактам, заключенным с ООО РО «СпасскКоммуналСервис» на выполнение работ благоустройству территории городского парка им. Борисова (ремонт танцевальной площадки) и благоустройство территории многоквартирного дома по пер. Мухинскому, 8 и с ООО «Альтастрой» на благоустройство территории многоквартирного дома по ул. Нагорная, 3.

В период проведения контрольного мероприятия сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края и Контрольно-счетной палатой городского округа Спасск-Дальний осуществлены выезды для осмотра благоустроенных территорий.


Дворовые территории

пер. Мухинский, 8 (заказчик – Администрация городского округа Спасск-Дальний, подрядчик - ООО РО «СпасскКоммуналСервис»)

В ходе осмотра установлено:

асфальтирование придомовой территории (минимальный перечень видов работ) выполнено частично: проезд отремонтирован в полном объеме, тротуар – отдельными местами. При невыполненном минимальном перечне видов работ выполнены работы по устройству ограждения клумб (дополнительный перечень работ);

провал асфальтобетонного покрытия тротуара в районе колодца.

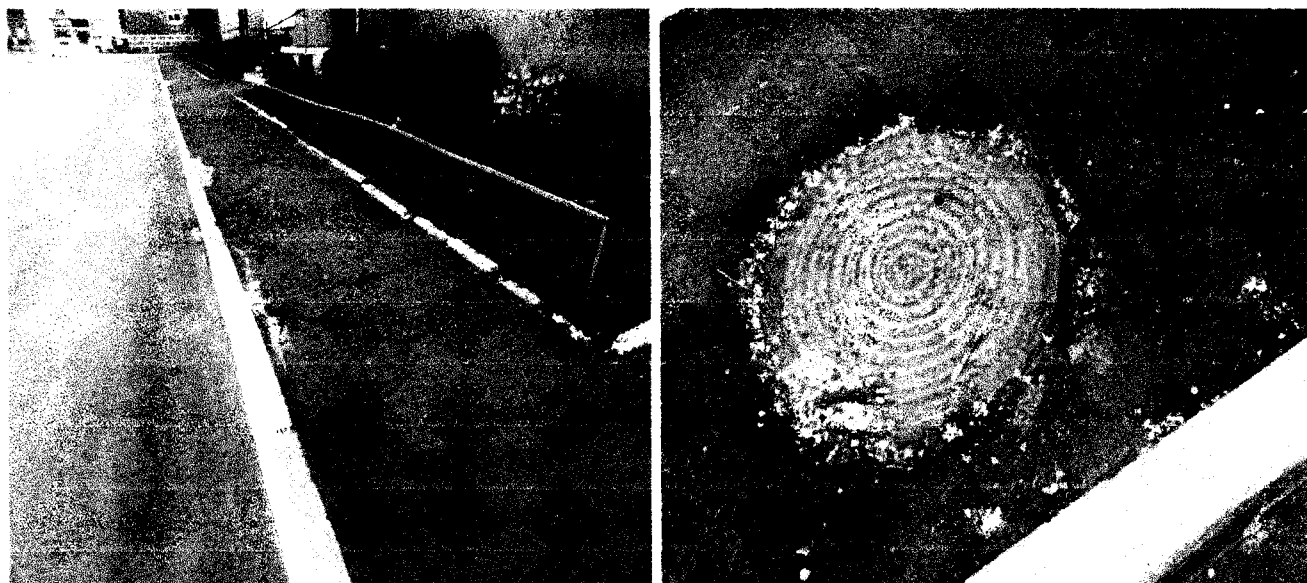

пер. Мухинский, 8

(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края 05.06.2019)

ул. Нагорная, 3 (заказчик – Администрация городского округа Спасск-Дальний, подрядчик - ООО «Альтастрой»)

В ходе осмотра установлено, что асфальтобетонное покрытие имеет дефекты, разрушается от воздействия при передвижении транспорта по дворовой территории, крошится, в месте стыков с установленными бортовыми камнями проваливается.




Ул. Нагорная, 3

(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края 05.06.2019)

Общественные территории

Центральная площадь по ул. Ленинская (заказчик – Администрация городского округа Спасск-Дальний, подрядчики - ООО РО «СпасскКоммуналСервис», ИП Мокий С.В., ФКУ ИК -33 ГУФСИН России по Приморскому краю)

В ходе осмотра установлено, что асфальтобетонное покрытие территории местами выкрашивается, имеются трещины;

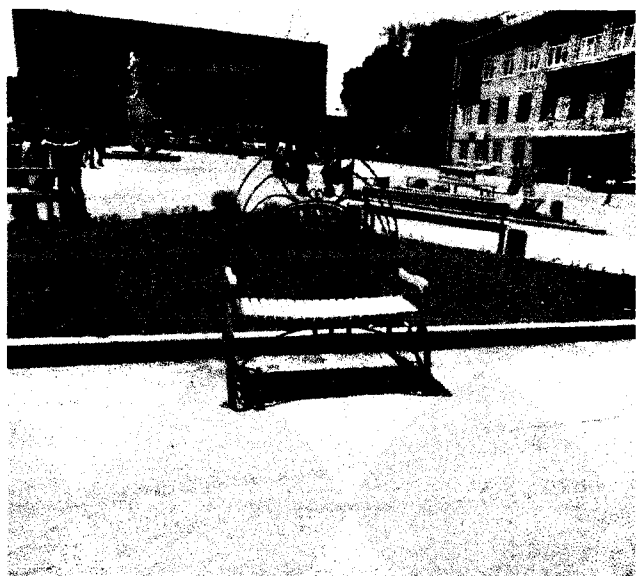

Центральная площадь г. Спасск-Дальний

(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края 05.06.2019)

Парк культуры и отдыха им. А. Борисова (заказчик – Администрация городского округа Спасск-Дальний, подрядные организации - ООО «Альтастрой», ООО РО «СпасскКоммуналСервис»)

В ходе осмотра установлено:

асфальтобетонное покрытие танцевальной площадки местами выкрашивается, продавливается каблуком;

кромки асфальтобетонного покрытия дорожек в парке разрушаются.

При выполнении работ по благоустройству парка произведена замена навеса танцплощадки и ремонт полов на сцене танцплощадки. Вместе с тем, стены сцены не отремонтированы, что нивелирует общее впечатление от сделанной работы. Синхронизация проведенных работ с текущим ремонтом стен сцены позволила бы получить цельный, завершенный объект благоустройства.



Пешеходная дорожка в городском парке
(фото сделано сотрудниками Контрольно-
счетной палаты городского округа
Спасск-Дальний 03.06.2019)



Сцена летней танцевальной площадки
(фото сделано сотрудниками Контрольно-
счетной палаты Приморского края
05.06.2019)

Контрольно-счетной палатой городского округа Спасск-Дальний при самостоятельных выездах и осмотре объектов, благоустройство которых проведено в рамках реализации государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» установлены аналогичные замечания по качеству выполненного асфальтового покрытия: имеются сколы и трещины, частичное разрушение бортовых камней, происходит крошение асфальтобетонного полотна, имеются локальные нарушения ровности (пучины). Кроме этого, во всех актах выполненных работ устройство асфальтобетонного покрытия указано из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, однако при смотре покрытия обнаружены участки асфальтобетонной смеси с крупной фракцией наполнителя.

В период проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой городского округа Спасск-Дальний проводилось анкетирование граждан о выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, произведенных в 2018 году. В опросе приняло участие 156 граждан. Большинство граждан принимали участие в обсуждении предложений о

проведении работ по благоустройству дворовой территории. Общее количество граждан, удовлетворенных уровнем благоустройства придомовых территорий (оценка 4 и 5) составляет 75 человек или 48%.

Кавалеровское городское поселение

В 2017 году в Кавалеровском городском поселении благоустроено 8 дворовых территорий и 2 территории общего пользования – территория у общественного здания ККЗ «Россия» и территория общего пользования у общественного здания автостанции пгт Кавалерово.

В 2018 году выполнено благоустройство 1 территории общего пользования - парка культуры и отдыха, благоустройство дворовых территорий не производилось.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы № 10 и Государственной программы за 2017-2018 годы составили 25 382,0 тыс. рублей (ФБ – 20 533,1 тыс. рублей, КБ – 3 808,2 тыс. рублей, МБ – 1 040,7 тыс. рублей), в том числе:

на благоустройство дворовых территорий – 12 771,1 тыс. рублей (ФБ – 10 165,4 тыс. рублей, КБ – 2 082,1 тыс. рублей, МБ – 523,6 тыс. рублей);

на благоустройство территорий общего пользования – 12 610,9 тыс. рублей (ФБ - 10 367,7 тыс. рублей, КБ – 1 726,1 тыс. рублей, МБ – 517,1 тыс. рублей).

В период проведения контрольного мероприятия ревизионной комиссией Кавалеровского муниципального района выборочно проведены контрольные обмеры выполненных работ. По результатам контрольного обмера по объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: пгт Кавалерово, ул. Кузнечная, 7, 9» установлен факт приемки и оплаты фактически невыполненных работ по установке бетонных бортовых камней в количестве 96,6 мп на сумму 57,3 тыс. рублей⁵⁰ (заказчик – Администрация Кавалеровского городского поселения, подрядчик – АО «Акционерное строительное общество № 1»).

При осмотре выполненных работ ревизионной комиссией Кавалеровского муниципального района установлены факты некачественно выполненных работ.

По благоустройству придомовых территорий в пгт Кавалерово:

- по ул. Больничная, д. 35 (заказчик – Администрация Кавалеровского городского поселения, подрядчик – АО «Акционерное строительное общество № 1») – наличие провалов и трещин асфальтобетонного покрытия, урны не закреплены по месту установки. Территория детской площадки не спланирована, на момент осмотра установлено отсутствие 30 м² покрытия площадки, в месте съезда с горки образовалась яма, в дождь заполняемая водой, болтовые соединения одной из двойных качелей расшатаны.

⁵⁰ Стоимость бортовых камней без учета стоимости невыполненных работ по их установке

Ограждение спортивной площадки в четырех пролетах разрушено, конструкции спортивных снарядов не укреплены;

- по ул. Арсеньева, д. 53, 55, ул. Кузнечная, д. 4, 26 (заказчик – Администрация Кавалеровского городского поселения, подрядчик – АО «Акционерное строительное общество № 1») – из 1014 м установленных бортовых камней 41 м отличаются по цвету и форме.

По благоустройству территории общего пользования – Парка культуры и отдыха (заказчик – Администрация Кавалеровского городского поселения, подрядчик – АО «Акционерное строительное общество № 1») – множественные дефекты, заключающиеся в просадке бетонных плит тротуаров, нестыковка плит с бортовыми камнями, невыровненное асфальтобетонное покрытие пешеходных дорожек, на которых во время дождя образуются лужи.

В ходе контрольного мероприятия ревизионной комиссией Кавалеровского муниципального района проведено анкетирование жильцов многоквартирных домов для анализа удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий.

Участие в анкетировании приняли 13 человек. Результаты анкетирования показали следующее:

благоустройство детских площадок в целом оценивается на 1,2 балла (по 5-балльной шкале), в том числе: обустройство – 3,5 балла, ограждение – 1,1 балла, озеленение – 0 баллов, обеспечение доступности для инвалидов – 0 баллов;

благоустройство дворовых территорий в целом также оценивается на 1,5 балла (по 5-балльной шкале), в том числе: асфальтовое покрытие – 3,8 балла, обустройство – 2,9 балла, ограждение – 1,0 балла, озеленение – 0 баллов, обеспечение доступности для инвалидов – 0 баллов.

Владими́ро-Алекса́ндровское сельское поселение

В 2017 году во Владимиро-Александровском сельском поселении благоустроено 2 дворовые территории и 1 территория общего пользования – сквер «Молодежный».

В 2018 году продолжены работы по благоустройству сквера «Молодежный», благоустройство дворовых территорий не производилось.


Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы № 10 и Государственной программы в 2017 - 2018 годах составили 26 204,7 тыс. рублей (ФБ – 19 994,2 тыс. рублей, КБ – 3 953,4 тыс. рублей, МБ – 2 257,1 тыс. рублей), в том числе:

благоустройство дворовых территорий – 9 473,3 тыс. рублей (ФБ – 7 540,5 тыс. рублей, КБ – 1 544,4 тыс. рублей, МБ – 388,4 тыс. рублей);

благоустройство территорий общего пользования – 16 731,4 тыс. рублей (ФБ – 12 453,7 тыс. рублей, КБ – 2 409,0 тыс. рублей, МБ – 1 868,7 тыс. рублей).

В ходе контрольного мероприятия ревизионной комиссией Партизанского муниципального района установлено, что экономия по результатам электронных аукционов при проведении администрацией Владимиро-Александровского сельского поселения закупок товаров, работ, услуг с участием средств субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2017 – 2018 годах составила 234,3 тыс. рублей.


Объект «Благоустройство сквера «Молодежный» с. Владимиро-Александровское» прошел отбор на Конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству, реализованных в 2017 году. Ассоциация «Совет муниципальных образований Приморского края» 31.12.2017 наградила Администрацию Владимиро-Александровского сельского поселения и Волонтерскую организацию поселения Дипломом 1 степени за победу в конкурсе «Лучшая общественная инициатива»: строительство сквера Молодежный в с. Владимиро-Александровское». Департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края в адрес Администрации Владимиро-Александровского сельского поселения 27.09.2018 направлено «Благодарственное письмо» «За профессионализм, инициативу и творческий подход при реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

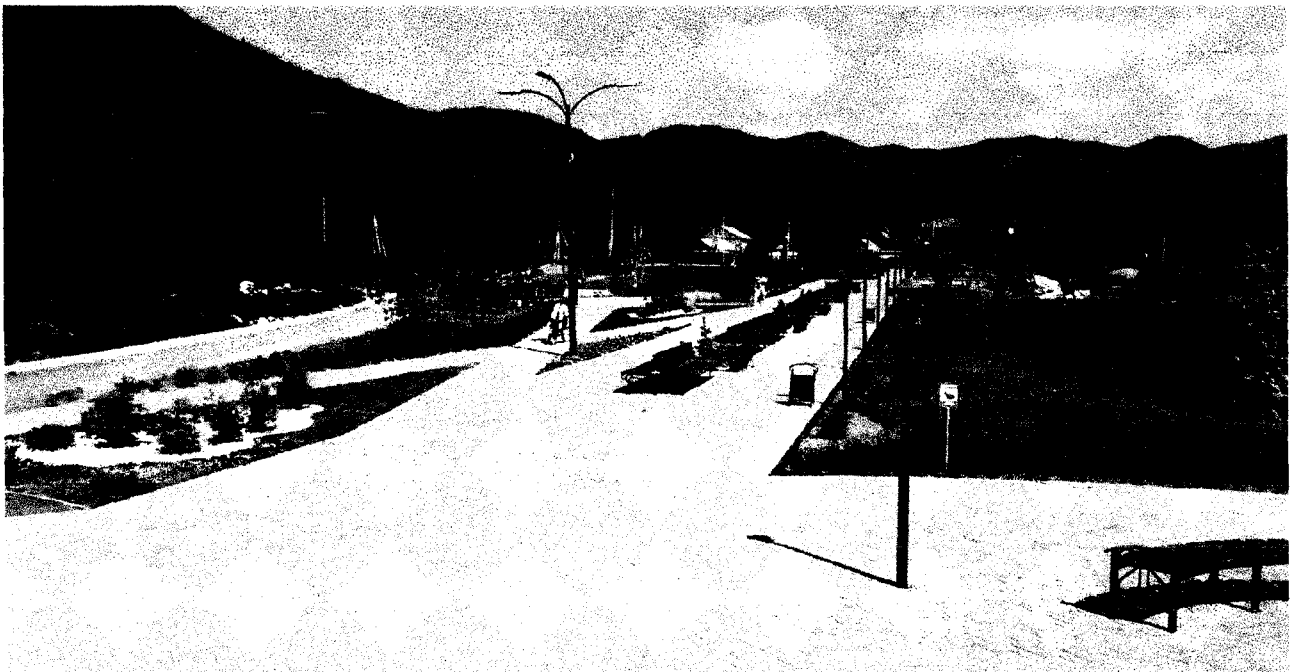

Сквер «Молодежный»

(фото сделано сотрудниками ревизионной комиссии Партизанского муниципального района 13.06.2019)

В ходе контрольного мероприятия ревизионной комиссией Партизанского муниципального района на трех объектах проведены контрольные обмеры, по результатам которых нарушений не установлено.

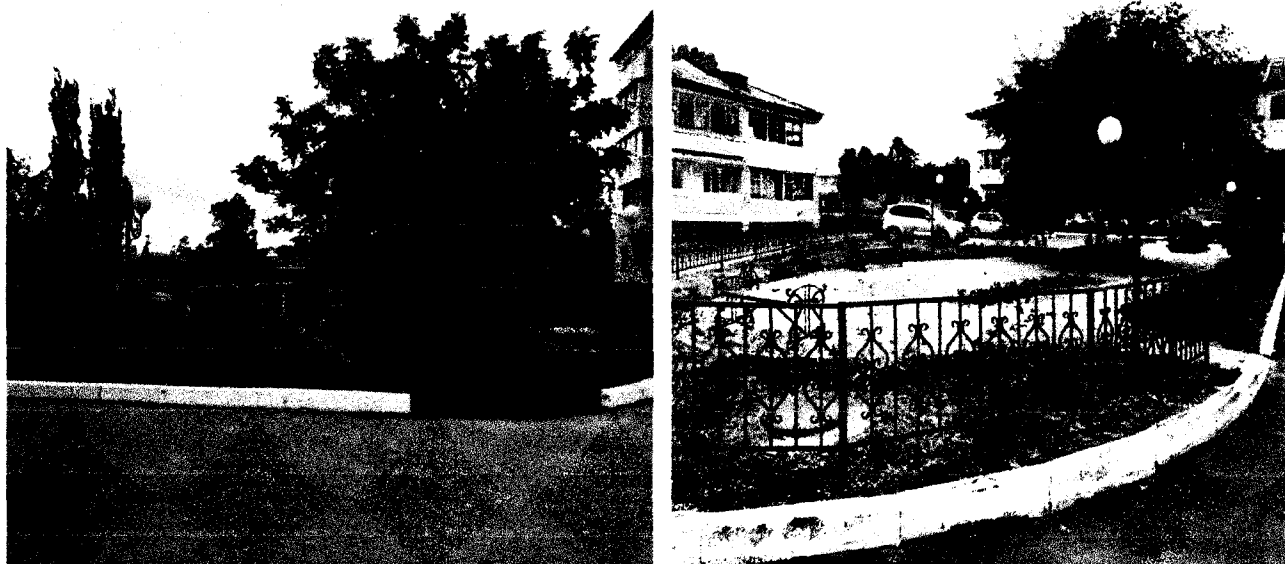

Благоустройство дворовых территорий по ул. Кости Рослого
дом 50 дом 57

(фото сделано сотрудниками ревизионной комиссии Партизанского муниципального района 13.06.2019)

В период проведения контрольного мероприятия сотрудниками ревизионной комиссии Партизанского муниципального района проведено анкетирование граждан для анализа удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий и территории общего пользования.

Участие в анкетировании приняли 28 человек.

Качество работ по благоустройству дворовых территорий оценено в среднем на 4,2 балла (по 5-балльной шкале). Основное замечание и предложение – укрепить откосы, оборудовать детскую площадку.

Качество работ по благоустройству территории общего пользования – сквера «Молодежный» оценено всеми участниками опроса на 5 баллов (по 5-балльной шкале). Замечаний к качеству выполненных работ нет, основное предложение – оборудовать общественный туалет и завершить все работы, предусмотренные прошедшим общественное обсуждение проектом.

Екатериновское сельское поселение

Субсидии бюджету Екатериновского сельского поселения на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2017 году не предоставлялись.

В 2018 году в Екатериновском сельском поселении благоустроена 1 дворовая территория.

Кассовые расходы на реализацию мероприятия Государственной программы по благоустройству дворовых территорий в 2018 году составили 2 317,2 тыс. рублей (ФБ – 1 877,4 тыс. рублей, КБ – 256,0 тыс. рублей, МБ – 68,0 тыс. рублей, ВНБ – 115,8 тыс. рублей).

В ходе контрольного мероприятия ревизионной комиссией Партизанского муниципального района установлено следующее.

Для выполнения работ по благоустройству придомовой территории многоквартирного дома по ул. Советская, № 3а в с. Екатериновка Администрацией Екатериновского сельского поселения заключен муниципальный контракт с ООО «МАССИС». По итогам электронного аукциона цена муниципального контракта снижена на 57,7 тыс. рублей.

За счет средств экономии, образовавшейся в результате проведения электронного аукциона, Администрацией Екатериновского сельского поселения заключен муниципальный контракт с ООО «МАССИС» от 17.09.2018 № 1/9 на сумму 67,3 тыс. рублей (в редакции дополнительного соглашения от 22.09.2018 № 1) на выполнение дополнительных работ по благоустройству придомовой территории многоквартирного дома по ул. Советская, № 3а в с. Екатериновка.

В нарушение пункта 17 Правил № 3 Администрацией Екатериновского сельского поселения не внесены изменения в сметную документацию по объекту «Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по ул. Советская, № 3а в с. Екатериновка Приморского края».

В период проведения контрольного мероприятия сотрудниками ревизионной комиссии Партизанского муниципального района проведено анкетирование граждан для анализа удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовой территории.

Участие в анкетировании приняли 9 человек. Качество работ по благоустройству оценено в среднем на 4,2 балла (по 5-балльной шкале). Основное замечание и предложение – укрепить откосы, провести озеленение, установить площадку для детей младшего возраста.

Сельское поселение Новицкое

В 2018 году в поселении Новицкое благоустроена 1 территория общего пользования – сквер по ул. Лазо.

Кассовые расходы на реализацию мероприятия Государственной программы по благоустройству территории общего пользования в 2018 году составили 2 062,5 тыс. рублей (ФБ – 1 762,4 тыс. рублей, КБ - 240,3 тыс. рублей, МБ – 59,8 тыс. рублей).

В ходе контрольного мероприятия ревизионной комиссией Партизанского муниципального района установлено, что закупки товаров, работ, услуг, произведенные с участием средств субсидии в 2018 году, произведены администрацией Новицкого сельского поселения неконкурентным способом.

Для выполнения работ по благоустройству сквера за зданием администрации до Дома культуры Администрацией Новицкого сельского поселения заключен муниципальный контракт с ООО «Хэппи Айленд» от 09.07.2018 № 1 на сумму 138,0 тыс. рублей. В рамках контракта предусмотрены работы по приобретению и установке уличного тренажера (площадка для воркаута). В соответствии с пунктом 5 Правил на 2018 год Администрация Новицкого сельского поселения предоставила письменную

гарантию по выполнению обязательств, предусмотренных пунктом 3 Правил на 2018 год, в том числе наличие обязательства муниципального образования по утверждению с учетом прохождения ценовой экспертизы сметной документации на проведение работ по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой, до их начала.

В ходе контрольного мероприятия ревизионной комиссией Партизанского муниципального района установлено, что сметная документация на Объект не составлялась.



Площадка для воркаута

(фото сделано сотрудниками ревизионной комиссии Партизанского муниципального района 13.06.2019)

В период проведения контрольного мероприятия сотрудниками ревизионной комиссии Партизанского муниципального района проведено анкетирование граждан для анализа удовлетворенности населения уровнем благоустройства объекта.

Участие в анкетировании приняли 7 человек. Качество работ по благоустройству оценено в среднем на 4,4 балла (по 5-балльной шкале). Замечания к качеству выполненных работ у опрошиваемых отсутствуют, предложения следующие: добавить озеленение, освещение, установить дополнительное спортивное оборудование и лавочки.

Золотодолинское сельское поселение

В 2017 году в Золотодолинском сельском поселении благоустроена 1 территория общего пользования – сквер у клуба с. Золотая Долина.

В 2018 году благоустроено 2 территории общего пользования – сквер «Воинам интернационалистам» и продолжены работы по скверу у клуба с. Золотая Долина.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы № 10 и Государственной программы по благоустройству территорий общего пользования в 2017 - 2018 годах составили 7 195,9 тыс. рублей (ФБ – 5 800,0 тыс. рублей, КБ – 1 115,4 тыс. рублей, МБ – 280,5 тыс. рублей).

В ходе контрольного мероприятия ревизионной комиссией Партизанского муниципального района установлено следующее.

В проверяемом периоде закупки товаров, работ и услуг, произведенные с участием средств субсидии бюджету Золотодолинского сельского поселения на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на сумму 7 195,9 тыс. рублей, произведены неконкурентным способом.


Контрольным мероприятием установлено нарушение статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ в части не направления информации и документов, подлежащих включению в реестр контрактов, по двум муниципальным контрактам:

- муниципальный контракт от 10.09.2018 № 2 с ООО «Птах» на выполнение работ по объекту «Благоустройство общественной территории сквера у клуба с. Золотая Долина (расположенный по адресу: Приморский край, Партизанский район, с. Золотая Долина, ул. Центральная, д. 68). 2 этап (малые формы, освещение, туалеты», цена контракта 246,8 тыс. рублей;

- муниципальный контракт от 14.09.2018 № 3 с ООО «Веста» на выполнение работ объекту «Сквер «Войнам интернационалистам» с. Золотая Долина (1 этап)» на сумму 935,9 тыс. рублей.

Информация о данном нарушении направлена в контрольный орган в сфере закупок Партизанского муниципального района.

В период проведения контрольного мероприятия ревизионной комиссией Партизанского муниципального района на объектах проведены контрольные обмеры, по результатам которых нарушений не установлено. При этом отмечено, что две скамьи парковых на чугунных опорах «Голландия» находятся в подсобном помещении для проведения ремонта обрешетки, тренажер «Велосипедист» находится в неисправном состоянии, 2 кабинки биотуалета стоят у здания клуба не подключенные, ввиду вандальных действий неустановленных лиц.

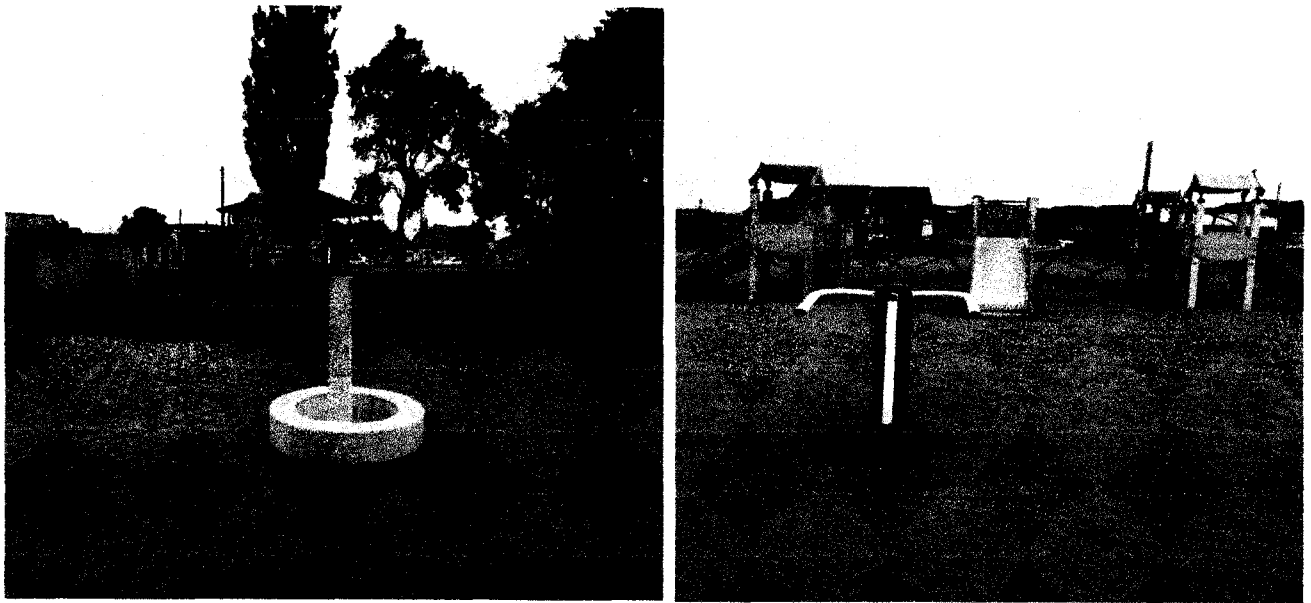

Благоустройство территории сквера у клуба с. Золотая Долина
(фото сделано сотрудниками ревизионной комиссии Партизанского муниципального района 04.06.2019)

В период проведения контрольного мероприятия сотрудниками ревизионной комиссии Партизанского муниципального района проведено анкетирование граждан для анализа удовлетворенности населения уровнем благоустройства объектов.

Участие в анкетировании приняли 10 человек. Качество работ по благоустройству оценено в среднем на 4 балла (по 5-балльной шкале). Замечания к качеству выполненных работ у опрашиваемых отсутствуют, предложения следующие: установить антивандальные лавочки и урны, детскую спортивную площадку, диван-качели для взрослых, летний кинотеатр и добавить озеленения.

Сергеевское сельское поселение

В 2017 году в Сергеевском сельском поселении благоустроено 4 территории общего пользования – три пешеходные зоны по ул. Шоссейной и сквер по ул. Пушкина.

В 2018 году благоустроена 1 территория общего пользования – сквер по ул. Кооперативная.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы № 10 и Государственной программы по благоустройству территорий общего пользования в 2017 - 2018 годах составили 6 350,6 тыс. рублей (ФБ – 4 851,1 тыс. рублей, КБ – 911,1 тыс. рублей, МБ – 588,4 тыс. рублей).


В ходе контрольного мероприятия ревизионной комиссией Партизанского муниципального района установлено следующее.

В проверяемом периоде закупки товаров, работ и услуг, произведенные с участием средств субсидии бюджету Сергеевского сельского поселения на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на сумму 6 350,6 тыс. рублей, произведены неконкурентным способом.

Использование средств субсидий, выделенных бюджету Сергеевского сельского поселения, осуществлялось муниципальным казенным учреждением «Управление благоустройства и технического обеспечения» Сергеевского сельского поселения Партизанского муниципального района (далее – МКУ «УБТО» ССП ПМР).

При исполнении муниципального контракта от 15.08.2017 № 0820300009117000002-0440358-01, заключенного с ООО «НАБО» на сумму 1 148,1 тыс. рублей для выполнения работ по объекту «Благоустройство сквера по ул. Пушкина в с. Сергеевка, Партизанского района, Приморского края», на основании обращения подрядной организации в ведомость объемов работ и сметную документацию, обосновывающую стоимость работ, были внесены изменения на сумму 386,1 тыс. рублей (дополнительное соглашение от 30.10.2017 № 1). Измененная смета ценовую экспертизу не проходила.


В ходе контрольного мероприятия ревизионной комиссией Партизанского муниципального района на пяти объектах проведены контрольные обмеры, по результатам которых нарушений не установлено.

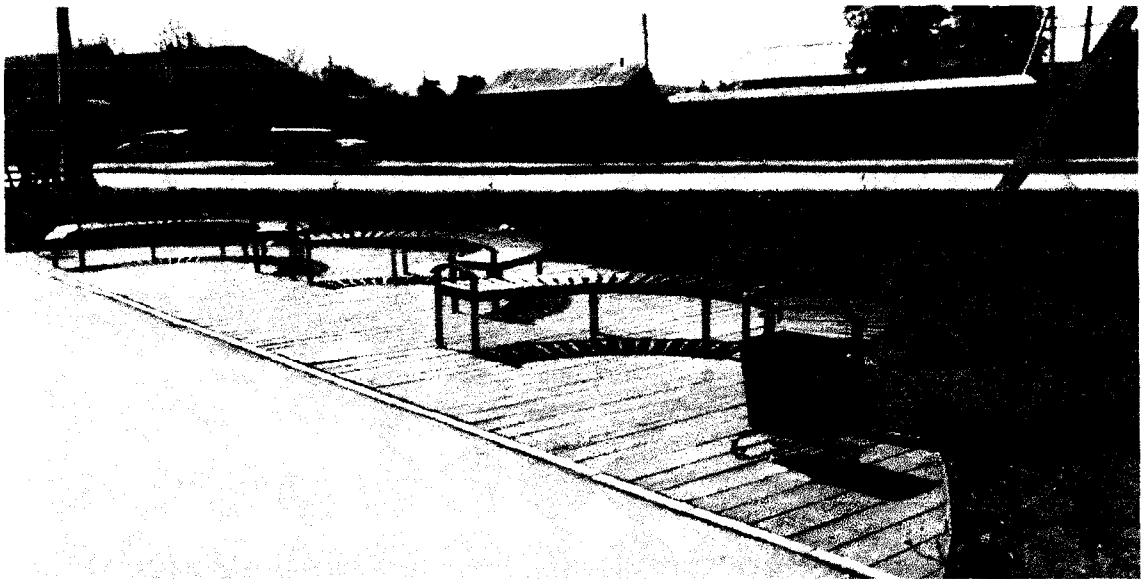

Благоустройство территории сквера по ул. Пушкина
(фото сделано сотрудниками ревизионной комиссии Партизанского муниципального района 04.06.2019)



Благоустройство территории сквера по ул. Кооперативная
(фото сделано сотрудниками ревизионной комиссии Партизанского муниципального района 04.06.2019)

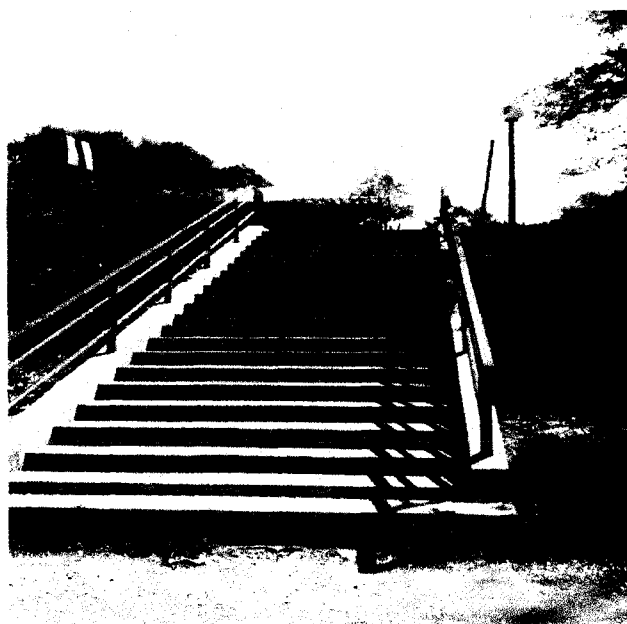

Благоустройство пешеходных территорий по ул. Шоссейная
(фото сделано сотрудниками ревизионной комиссии Партизанского муниципального района 04.06.2019)

В период проведения контрольного мероприятия сотрудниками ревизионной комиссии Партизанского муниципального района проведено анкетирование граждан для анализа удовлетворенности населения уровнем благоустройства объектов.

Участие в анкетировании приняли 10 человек. Качество работ по благоустройству оценено в среднем на 4,4 балла (по 5-балльной шкале). Замечания к качеству выполненных работ у опрошиваемых отсутствуют, предложения следующие: добавить озеленение, в сквере установить дополнительные карусели, качели.

Чугуевское сельское поселение

В 2017-2018 годах в Чугуевском сельском поселении благоустроено 4 дворовых территории и 5 территорий общего пользования.

Кассовые расходы за 2017-2018 годы на реализацию мероприятий Подпрограммы № 10 и Государственной программы составили 11 135,8 тыс. рублей (ФБ – 9 084,4 тыс. рублей, КБ – 1 546,1 тыс. рублей, МБ – 393,3 тыс. рублей, ВНБ – 112,0 тыс. рублей), из них:

на благоустройство дворовых территорий – 4 428,0 тыс. рублей (ФБ - 3 554,3 тыс. рублей, КБ – 607,2 тыс. рублей, МБ – 154,5 тыс. рублей, ВНБ – 112,0 тыс. рублей);

на благоустройство территорий общего пользования – 6 707,8 тыс. рублей (ФБ - 5 530,1 тыс. рублей, КБ – 938,9 тыс. рублей, МБ – 238,8 тыс. рублей).

В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетным комитетом Чугуевского муниципального района установлено следующее.

1. Администрацией Чугуевского сельского поселения не соблюден пункт 2 Порядка голосования по общественным территориям: Главой Администрации не принято постановление о назначении голосования по общественным территориям с обязательным указанием сведений, поименованных в пункте 3 Порядка голосования по общественным территориям.

2. Администрацией Чугуевского сельского поселения не соблюден Порядок проведения инвентаризации благоустройства дворовых и общественных территорий Чугуевского сельского поселения: описи не подписаны комиссией по проведению инвентаризации; по итогам проведенной инвентаризации не составлены паспорта благоустройства обследуемой территории по форме, утвержденной приложением № 1, и паспорт благоустройства населенного пункта по форме приложения № 2 к указанному Порядку.

3. В нарушение пункта 5.1. муниципальных контрактов от 11.08.2017 № 0120300023617000002-0310833-01 и от 19.08.2017 № 0120300023617000003-0310833-01 (подрядная организация МКП «Энергетик») рабочая комиссия для приемки выполненных работ Администрацией не создавалась, акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) подписаны только главой Администрации, акт проверки противопожарного состояния объекта не составлен, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество использованных материалов и оборудования, подрядчиком МКП «Энергетик» в Администрацию не представлены.

4. При исполнении муниципального контракта от 11.08.2017 № 0120300023617000002-0310833-01 на благоустройство дворовых территорий Чугуевского сельского поселения (подрядная организация МКП «Энергетик»):

- в нарушение части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрацией Чугуевского сельского поселения вместо требования об уплате пени за нарушение срока выполнения работ в адрес подрядчика направлена претензия от 27.12.2017 № 4516 о взыскании пени за нарушение срока выполнения работ в сумме 32,2 тыс. рублей;

- администрацией Чугуевского сельского поселения не соблюден Порядок расчета пени за просрочку исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, установленный пунктом 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, в связи с чем размер пени, подлежащей взысканию с подрядчика МКП «Энергетик», занижен администрацией на 37,1 тыс. рублей.

В ходе выездов сотрудников Контрольно-счетного комитета Чугуевского муниципального района установлено следующее.

1. Общественная территория, расположенная по ул. Советская, 35 в с. Соколовка, благоустроена в октябре 2018 года (муниципальный контракт от 27.07.2018 № 0120300023618000002-0310833-01, подрядная организация ООО «Хэппи Айленд»): не установлено наличие камней бортовых в количестве 8 штук на сумму 6,8 тыс. рублей.

2. Придомовая территория многоквартирного дома, расположенного по ул. Титова, 63 в с. Чугуевка, благоустроена в октябре 2017 года (муниципальный контракт от 11.08.2017 № 0120300023617000002-0310833-01, подрядная организация МКП «Энергетик»):

- при визуальном осмотре отмечено некачественное устройство кромки асфальтового покрытия автомобильной парковки и пешеходной дорожки - периметр указанных элементов благоустройства не выровнен;

- Администрацией Чугуевского сельского поселения приняты и оплачены фактически не выполненные работы на общую сумму 101,0 тыс. рублей, в том числе:

работы по устройству леерных ограждений в объеме 14,5 мп на сумму 30,5 тыс. рублей⁵¹,

работы по устройству цветников площадью 13,8 м² на сумму 22,2 тыс. рублей⁵²,

работы по асфальтированию автомобильной парковки площадью 40,04 м² на сумму 48,3 тыс. рублей.

В период контрольного мероприятия Контрольно-счетным комитетом Чугуевского муниципального района проведено анкетирование граждан для анализа удовлетворенности населения уровнем благоустройства городской среды. Участие в опросе приняли 27 человек.

Результаты проведенного анкетирования показали, что удовлетворенность населения уровнем благоустройства городской среды в

⁵¹ акт о приемке выполненных работ (КС-2) б/н от 26.12.2017 на сумму 40,0 тыс. рублей

⁵² акт о приемке выполненных работ (КС-2) б/н от 26.12.2017

селе Чугуевка Чугуевского сельского поселения не высока и в среднем оценивается на уровне 2,8 баллов (по 5-балльной шкале), в том числе:

детские площадки – 2,8 балла, из них: обустройство - 3 балла, ограждение - 2,8 балла, озеленение - 2,8 балла, обеспечение доступности для инвалидов - 2,5 балла;

дворовая территория – 2,8 балла, из них: асфальтовое покрытие - 3,1 балла, обустройство - 3 балла, ограждение - 2,6 балла, озеленение - 2,5 балла, обеспечение доступности для инвалидов - 2,9 балла.

Большинство респондентов (14 человек) не устраивает качество планировки детской площадки - не убраны камни после установки объектов, грунт вокруг площадки и на площадке не выровнен, не убраны старые автомобильные покрышки, качели сломаны.



Цветник, расположенный на территории многоквартирного дома по ул. Титова, д.63
с. Чугуевка

(фото сделано сотрудниками Контрольно-счетного комитета Чугуевского муниципального района 05.06.2019)

8. Выводы

По цели 1

1. Подпрограмма № 10 «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2017 год государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 – 2020 годы⁵³ (далее – Подпрограмма № 10), государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского

⁵³ утверждена постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 – 2020 годы»

края» на 2018 – 2024 годы⁵⁴ (далее – Государственная программа) реализуются в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»⁵⁵, федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», включенного в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

Между Минстроем России, осуществляющим функции руководителя федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», и департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края (далее – Департамент), осуществляющим функции руководителя регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Приморский край)», заключено соглашение о реализации регионального проекта⁵⁶.

В нарушение пункта 2.2.1 Соглашения о реализации регионального проекта и пункта 2.2.2.4. Порядка принятия решений о разработке государственных программ Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края⁵⁷ (в редакции постановления Администрации приморского края от 07.05.2019 № 272-па), Департаментом не обеспечено включение в государственную программу Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018 – 2024 годы» регионального проекта, как основного мероприятия государственной программы.

2. Мероприятия Государственной программы реализуются посредством предоставления субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края (далее – субсидии из краевого бюджета).

Размер бюджетных ассигнований, утвержденный Законами Приморского края о краевом бюджете на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды муниципальных образований

⁵⁴ утверждена постановлением Администрации Приморского края от 31.08.2017 № 356-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018 – 2022 годы

⁵⁵ основное мероприятие государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323. С 2018 года приоритетный проект государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710

⁵⁶ от 01.02.2019 № 069-2019-F20036-1

⁵⁷ утвержден постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2014 № 566-па (в редакции постановления Администрации Приморского края от 07.05.2019 № 272-па)

Приморского края в проверяемом периоде, составил в общей сумме 2 798 524,7 тыс. рублей, в том числе:

- на 2017 год – 485 966,6 тыс. рублей;
- на 2018 год – 466 549,2 тыс. рублей;
- на 2019 год – 1 846 008,9 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по данному направлению, утвержденные Законом Приморского края на 2019 год, на 14 850,0 тыс. рублей превышают размер назначений, предусмотренных Государственной программой⁵⁸.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Приморского края на финансовое обеспечение расходного обязательства, направленного на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды муниципальных образований Приморского края, в 2019 году в 3,8 раза превышает объем бюджетных ассигнований, утвержденных в 2017 году.

Наряду с ежегодным увеличением доли финансового участия федерального бюджета: 2017 год – 83 %, 2018 год – 88 %, 2019 год – 98 %, в 2019 году Приморским краем приняты обязательства, почти в 2 раза превышающие объем бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета (ФБ - 618 535,7 тыс. рублей, КБ - 1 227 473,2 тыс. рублей).

3. Департаментом и муниципальными образованиями при предоставлении субсидий выполнены все условия их предоставления, закрепленные Правилами предоставления и расходования субсидий. Вместе с тем, не исполнены отдельные обязательства в части соблюдения сроков внесения изменений в муниципальные программы, сроков утверждения и содержания дизайн-проектов благоустройства общественных и дворовых территорий, проведения ценовой экспертизы сметной документации и ее утверждению и т.д.

4. В нарушение пункта 10 Правил предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018 году⁵⁹, распределение субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018 году утверждено⁶⁰ на 12 рабочих дней позже установленного срока (до 1 апреля).

⁵⁸ в редакции постановления Администрации Приморского края от 08.02.2019 № 69-па

⁵⁹ Приложение № 4 к государственной программе Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018 – 2024 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 31.08.2017 № 356-па

⁶⁰ постановление Администрации Приморского края от 17.04.2018 № 168-па «Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018 году»

5. В нарушение требований Правил предоставления и расходования субсидий⁶¹ соглашения о предоставлении субсидий, заключенные Департаментом с муниципальными образованиями в 2018 и 2019 годах не содержат реквизиты муниципальных правовых актов о местном бюджете, предусматривающих собственные средства бюджетов муниципальных образований на исполнение расходных обязательств по направлениям предоставления субсидий и мероприятий, предусмотренных муниципальными программами.

По цели 2

1. Кассовое исполнение мероприятий Подпрограммы № 10 в 2017 году составило 548 284,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 385 062,9 тыс. рублей (97,7 % от утвержденный бюджетных назначений);

за счет средств краевого бюджета – 86 851,5 тыс. рублей (94,4 % от утвержденных бюджетных назначений);

за счет средств местных бюджетов - 76 370,2 тыс. рублей.

В 2017 году субсидии предоставлялись по двум направлениям.

«Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды»

В реализации мероприятия приняли участие 57 муниципальных образований⁶², из которых 49 (86 %) исполнили субсидии в полном объеме. Кассовое исполнение субсидии по данному направлению в 2017 году составило 458 152,2 тыс. рублей (федеральный бюджет – 373 640,3 тыс. рублей, краевой бюджет – 84 511,9 тыс. рублей). В 2017 году субсидии не исполнены 9 муниципальными образованиями на общую сумму 12 994,5 тыс. рублей (федеральный бюджет - 8 063,5 тыс. рублей, краевой бюджет - 4 931,0 тыс. рублей). Кассовое исполнение за счет средств местных бюджетов составило 74 034,3 тыс. рублей.

«Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»

В реализации мероприятия приняли участие 6 муниципальных образований, 5 из которых исполнили субсидии в полном объеме. Кассовое исполнение субсидии по данному направлению составило 13 762,1 тыс. рублей (федеральный бюджет – 11 422,5 тыс. рублей, краевой бюджет – 2 339,6 тыс. рублей). В 2017 году субсидии не исполнены 1 муниципальным образованием в сумме 1 057,7 тыс. рублей (федеральный бюджет – 878,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 179,7 тыс. рублей). Кассовое исполнение за счет средств местных бюджетов составило 2 335,9 тыс. рублей.

⁶¹ подпункт г) пункта 14 Правил № 3 и Правил № 5; подпункт е) пункта 14 Правил № 3 и Правил № 5, подпункт д) пункта 9 Правил № 4, абзац шестой пункта 12 Правил № 6

⁶² 11 городских округов, 20 городских поселений и 26 сельских поселений

Кассовое исполнение мероприятий Государственной программы в 2018 году составило 545 761,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 409 384,2 тыс. рублей (99,7 % от утвержденных бюджетных назначений);

за счет средств краевого бюджета – 55 825,1 тыс. рублей (99,7 % от утвержденных бюджетных назначений);

за счет средств местных бюджетов составило 70 142,1 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств – 10 410,5 тыс. рублей.

«Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды»

В реализации мероприятия приняли участие 45 муниципальных образований Приморского края⁶³, из которых 43 (99,7 %) исполнили субсидии в полном объеме. Кассовое исполнение субсидии по данному направлению в 2018 году составило 451 374,4 тыс. рублей (федеральный бюджет – 397 209,4 тыс. рублей, краевой бюджет – 54 164,9 тыс. рублей). Остаток неиспользованных субсидий по состоянию на 01.01.2019 году составил 1 339,9 тыс. рублей (федеральный бюджет – 1 179,1 тыс. рублей, краевой бюджет – 160,8 тыс. рублей). Кассовое исполнение за счет средств местных бюджетов составило 68 669,5 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 10 410,5 тыс. рублей.

«Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»

В реализации мероприятия приняли участие 5 муниципальных образований. Субсидии по данному направлению исполнены в 2018 году в полном объеме. Кассовое исполнение субсидии составило 13 835,0 тыс. рублей (федеральный бюджет – 12 174,8 тыс. рублей, краевой бюджет – 1 660,2 тыс. рублей). Кассовое исполнение за счет средств местных бюджетов составило 1 472,6 тыс. рублей.

2. Значения показателей результативности, установленные соглашениями о предоставлении субсидии из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды и на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), заключенными Департаментом с администрациями муниципальных образований в 2017 и 2018 годах, достигнуты в полном объеме.

При этом установленные Соглашениями показатели, как то «Утверждение муниципальных программ формирования современной городской среды», «Утверждение и опубликование нормативно правовых актов, направленных на реализацию мероприятий», «Утверждение дизайн-проектов», «Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий», «Доля дворовых территорий, благоустройство которых

⁶³ 12 городских округов, 14 городских поселений и 19 сельских поселений

выполнено при участии граждан» и т.п. не позволяют оценить непосредственные результаты реализаций мероприятий, результативность вложения бюджетных средств.

Между тем, в результате изучения документов, подтверждающих расходы, предоставленных муниципальными образованиями, контрольным мероприятием установлено, что в 2017 году в Приморском крае благоустроено 254 дворовые территории, 58 территорий общего пользования и 6 городских парков, в 2018 году благоустроено 139 дворовых территорий, 55 территорий общего пользования и 5 городских парков.

3. Контрольным мероприятием установлены следующие нарушения и недостатки:

3.1. принятие и оплата фактически невыполненных работ на общую сумму 2 063,2 тыс. рублей (в том числе средства субсидии – 1 912,7 тыс. рублей), из них:

МАУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества» – 67,6 тыс. рублей, в том числе средства субсидии – 53,6 тыс. рублей⁶⁴;

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» – 19,5 тыс. рублей, в том числе средства субсидии – 18,7 тыс. рублей;

администрацией Лесозаводского городского округа – 1 565,7 тыс. рублей, в том числе средства субсидии – 1 449,5 тыс. рублей;

администрацией городского округа Спасск-Дальний – 245,3 тыс. рублей, в том числе средства субсидии – 232,5 тыс. рублей;

администрацией Кавалеровского городского поселения – 57,3 тыс. рублей, в том числе средства субсидии – 55,0 тыс. рублей;

по Чугуевскому сельскому поселению – 107,8 тыс. рублей, в том числе средства субсидии – 103,4 тыс. рублей;

3.2. нецелевое использование бюджетных средств в сумме 2 617,7 тыс. рублей (в том числе средства субсидии – 2 541,8 тыс. рублей) администрацией Находкинского городского округа;

3.3. управлением содержания жилищного фонда администрации города Владивостока возмещены управляющим компаниям неправомерные затраты (приемка и оплата фактически невыполненных работ, неправомерное завышение цены и объемов работ) на общую сумму 1 290,1 тыс. рублей, в том числе средств субсидии на сумму 962,5 тыс. рублей⁶⁵;

3.4. администрацией городского округа Спасск-Дальний допущено неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 173,7 тыс. рублей (в том числе средства субсидии – 166,4 тыс. рублей), затраченных в 2017

⁶⁴ в период проведения контрольного мероприятия подрядной организацией ООО СК «Автобан-ДВ» произведен возврат в бюджет Владивостокского городского округа 42,2 тыс. рублей за фактически невыполненные работы

⁶⁵ в ходе контрольного мероприятия управляющими компаниями произведен возврат в бюджет Владивостокского городского округа неправомерно оплаченных бюджетных средств в сумме 533,3 тыс. рублей

году на окраску декоративного ограждения дорожек, скамеек и опор освещения, которые в 2018 году демонтированы;

3.5. при выполнении работ по устройству ограждения по двум договорам подряда, заключенным МАУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества» с ООО СК «Автобан-ДВ» и ООО «АГАТ» в 2018 году, не осуществлен возврат 192,7 тыс. рублей от реализации металлолома, полученного в результате демонтажа металлического ограждения;

3.6. в сметный расчет, обосновывающий стоимость работ по муниципальному контракту, заключенному Администрацией Дальнегорского городского округа с ООО ДВСК «Армада» на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Центральная площадь», включены непредвиденные затраты в сумме 165,8 тыс. рублей и затраты на осуществление строительного контроля в сумме 211,4 тыс. рублей, не предусмотренные сметной документацией, прошедшей ценовую экспертизу и утвержденной и.о. Главы Дальнегорского городского округа;

3.7. МАУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества» не обеспечена результативность использования бюджетных средств на общую сумму 311,7 тыс. рублей (в том числе субсидии из краевого бюджета в сумме 244,8 тыс. рублей): приобретенные в целях проведения спортивных мероприятий щиты информационные, спортивное оборудование, флажки уличные, тренажер для пресса, стенка шведская и т.д., не установлены, на момент проверки находятся на складе учреждения;

3.8. на объекте «Благоустройство ландшафтно-парковой зоны ДВФУ о. Русский», отремонтированном с привлечением средств субсидии в 2017 году, результат работ утрачен (субсидии из краевого бюджета – 655,8 тыс. рублей, средства местного бюджета – 194,3 тыс. рублей): один из откосов, озеленение которого было выполнено, в настоящее время перекопан, территория огорожена металлическим забором, сторонней организацией ведутся земляные работы;

3.9. рядом муниципальных образований не обеспечено прохождение ценовой экспертизы сметных расчетов, обосновывающих стоимость работ по муниципальным контрактам, предусмотренной Правилами предоставления и расходования субсидий:

управлением дорог и благоустройства администрации города Владивостока - по благоустройству 17 дворовых и 2 общественных территорий в 2017 году (в части работ по ремонту территории по ул. Набережной от ул. Светланская до пер. Красноармейский, ландшафтно-парковой зоны ДВФУ);

администрацией городского округа Спасск-Дальний - на ремонт освещения городского парка культуры и отдыха им. А. Борисова в 2018 году, отсутствует сметная документация, прошедшая ценовую экспертизу, на изготовление и монтаж малых архитектурных форм для территории парка и для центральной площади, поставку и монтаж светодиодного экрана;

администрацией Дальнегорского городского округа - на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2017 году и благоустройству общественной территории «Центральная площадь» в 2018 году;

администрацией Находкинского городского округа – на выполнение дополнительных работ по скверу по ул. Свердлова, 45 в 2018 году;

администрацией Сергеевского сельского поселения - на выполнение дополнительных работ по объекту «Благоустройство сквера по ул. Пушкина в с. Сергеевка, Партизанского района, Приморского края»;

3.10. установлены нарушения положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрациями Лесозаводского, Партизанского городских округов, городского округа Спасск-Дальний, Золотодолинского и Чугуевского сельских поселений;

3.11. администрациями муниципальных образований не принимались меры к взысканию с подрядных организаций пени за нарушение сроков исполнения обязательств по муниципальным контрактам, предусмотренные их условиями, на общую сумму 96,3 тыс. рублей, в том числе:

администрацией Дальнегорского городского округа в сумме 7,5 тыс. рублей;

администрацией Лесозаводского городского округа в сумме 40,3 тыс. рублей;

администрацией городского округа Спасск-Дальний в сумме 48,5 тыс. рублей.

Кроме того в нарушение условий муниципальных контрактов администрациями Дальнегорского городского округа и Чугуевского сельского поселения размер пени занижен на общую сумму 47,3 тыс. рублей, в том числе:

администрацией Дальнегорского городского округа на сумму 10,2 тыс. рублей;

администрацией Чугуевского сельского поселения на сумму 37,1 тыс. рублей.

4. Контрольным мероприятием отмечено отсутствие комплексного подхода к решению вопросов благоустройства, в результате чего остались не решенными проблемы, связанные с не обустроенностью как придомовых, так и общественных территорий и территорий парков.

В Уссурийском городском округе выполнены работы по благоустройству сквера имени В. Кузьменчука, что позволило создать новую общественную территорию, имеющую завершенный и эстетически привлекательный внешний вид. В то же время жители городского округа отмечают, что отсутствие общественных туалетов на территории сквера свидетельствует о том, что надлежащий уровень комфорта благоустроенной территорий не достигнут.

По 27 придомовым территориям Владивостокского городского округа из 44, по которым в 2018 году выполнено асфальтирование и устройство детских площадок, имеется потребность в устройстве освещения, по 5 дворовым территориям, на которых выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия, отсутствуют детские площадки, на 13 территориях из 24, по которым выполнено устройство детских площадок в неудовлетворительном состоянии находились дороги и тротуары.

Кроме того, контрольным мероприятием установлено, что перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, установленный Правилами № 5, не предусматривает иных мероприятий по благоустройству, в том числе по ремонту и устройству водоотводных сооружений, что, в условиях наличия проблем с водоотведением на придомовых территориях, не позволит обеспечить надлежащий уровень комфорта при реализации мероприятий по благоустройству придомовых территорий.

5. При осмотре выполненных работ контрольным мероприятием установлены факты некачественно выполненных работ: по Артемовскому, Владивостокскому, Дальнегорскому, Дальнереченскому, Лесозаводскому, Находкинскому, Партизанскому, Уссурийскому городским округам, городскому округу Спасск-Дальний, Кавалеровскому городскому поселению, Чугуевскому сельскому поселению: повреждения, разрушение асфальтобетонного покрытия; отсутствие планировки территорий детских площадок (крутые уклоны, наличие крупных, острых камней).

Установлены факты повреждений и кражи элементов благоустройства неустановленными лицами.

6. Проект благоустройства парка имени А.К. Чумака в г. Уссурийске, презентованного на региональном конкурсе лучших практик реализации муниципальных программ «Формирование современной городской среды» в Приморском крае, проводимом Минстроем России, признан одним из лучших. За презентацию лучших практик благоустройства общественных мест и дворовых территорий по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» администрация Уссурийского городского округа награждена дипломом.

Объект «Благоустройство сквера «Молодежный» с. Владимиро-Александровское» прошел отбор на Конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству, реализованных в 2017 году. Ассоциация «Совет муниципальных образований Приморского края» 31.12.2017 наградила Администрацию Владимиро-Александровского сельского поселения и Волонтерскую организацию поселения Дипломом 1 степени за победу в конкурсе «Лучшая общественная инициатива»: строительство сквера Молодежный в с. Владимиро-Александровское».

7. Результаты анкетирования граждан, проведенного контрольно-счетными органами муниципальных образований в период проведения совместного контрольного мероприятия, позволяют сделать вывод, что в целом удовлетворенность населения проводимыми мероприятиями по

формированию современной городской среды выше среднего уровня – по большинству муниципальных образований выше 4 баллов (по 5-балльной шкале).

При этом жители ряда муниципальных образований дали более сдержанные оценки:

средняя оценка участников опроса в Чугуевском сельском поселении составила 2,8 балла, в Кавалеровском городском поселении – от 1,2 до 1,5 балла;

менее 50 % респондентов в Спасском городском округе оценили уровень благоустройства придомовых территорий на 4 и 5 баллов;

негативные отзывы в отношении выполненных в 2018 году работ по благоустройству придомовых территорий и первому этапу благоустройства сквера «Планета» и парка «Ружино» получены от жителей Лесозаводского городского округа.

9. Предложения (рекомендации)

1. Департаменту по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, муниципальным образованиям Приморского края принять меры по недопущению в дальнейшем и устранению выявленных нарушений и недостатков.

2. Департаменту по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края:

2.1. усилить контроль за целевым использованием субсидий, предоставленных муниципальным образованиям;

2.2. обеспечить проверку документов, подтверждающих произведенные бюджетом муниципального образования расходы, на возмещение которых предоставляются субсидии;

2.3. рассмотреть вопрос по внесению изменений в Правила предоставления и расходования субсидий в части дополнения перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов за счет включения в него мероприятий по ремонту (устройству) водоотводных сооружений.

3. Муниципальным образованиям Приморского края:

3.1. усилить контроль за целевым использованием субсидий, полученных из краевого бюджета;

3.2. в целях повышения качества выполняемых работ и предотвращения случаев приемки и оплаты фактически невыполненных работ усилить контроль за соблюдением подрядными организациями условий муниципальных контрактов (договоров);

3.3. принять меры по обеспечению сохранности элементов благоустройства территорий;

3.4. обеспечить участие граждан (общественности) в приемке выполненных в рамках муниципальных программ мероприятий по формированию современной комфортной среды.

4. Направить представления:

Контрольно-счетной палаты Приморского края - и.о. директора департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;

Контрольно-счетной палаты Арсеньевского городского округа - главе администрации Арсеньевского городского округа;

Контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа - главе администрации Артемовского городского округа;

Контрольно-счетной палаты Дальнегорского городского округа - главе администрации Дальнегорского городского округа;

ревизионной комиссии Кавалеровского муниципального района - главе администрации Кавалеровского городского поселения;

Контрольно-счетной палаты Лесозаводского городского округа - главе Лесозаводского городского округа;

Контрольно-счетной палаты Находкинского городского округа - главе администрации Находкинского городского округа;

Контрольно-счетной палаты Партизанского городского округа - главе администрации Партизанского городского округа;

ревизионной комиссии Партизанского муниципального района - главам администраций Владимиро-Александровского, Екатериновского, Сергеевского, Золотодолинского сельских поселений, сельского поселения Новицкое;

Контрольно-счетной палаты городского округа Спасск-Дальний - главе администрации городского округа Спасск-Дальний;

Контрольно-счетной палаты Уссурийского городского округа - главе администрации Уссурийского городского округа;

Контрольно-счетного комитета Чугуевского муниципального района - главе администрации Чугуевского сельского поселения;

Контрольно-счетной палаты города Владивостока - начальнику управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока, начальнику управления содержания жилищного фонда администрации города Владивостока;

Контрольно-счетной палаты Дальнереченского городского округа - начальнику управления МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа».

Контрольно-счетным органам муниципальных образований уведомить Контрольно-счетную палату Приморского края о результатах рассмотрения и исполнения представлений.

5. Направить отчет о совместном контрольном мероприятии в Законодательное Собрание Приморского края, Губернатору Приморского края, прокуратуру Приморского края.

Копии отчетов направить контрольно-счетным органам, участвующим в совместном контрольном мероприятии.

Приложения.

1. Перечень законодательных и других нормативных правовых актов, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия, на 1 л.
2. Информация о кассовом исполнении субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2017 году в разрезе муниципальных образований на 3 л.
3. Информация о кассовом исполнении муниципальными образованиями субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2017 году на 1 л.
4. Информация о кассовом исполнении муниципальными образованиями субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018 году на 2 л.
5. Информация о кассовом исполнении муниципальными образованиями субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2018 году на 1 л.
6. Информация о количестве объектов, благоустроенных в 2017 году, на 2 л.
7. Информация о количестве объектов, благоустроенных в 2018 году, на 2 л.

Руководитель
контрольного мероприятия
Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Приморского края



В.А. Шитц

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Арсеньевского городского округа




Н.П. Казаченко

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Артемовского городского округа



Е.Г. Герасимова

Председатель
Контрольно-счетной палаты
города Владивостока



А.В. Егорова

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Дальнегорского городского округа



Е.А. Пушанкина

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Дальнереченского городского округа




О.Н. Тупиленко

Председатель
Ревизионной комиссии
Кавалеровского муниципального района



В.В. Соломина

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Лесозаводского городского округа



Е.Ф. Глушук

Заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты
Находкинского городского округа



И.В. Карабанова

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Партизанского городского округа



Л.И. Аношина

Председатель
Ревизионной комиссии
Партизанского муниципального района



С.Ф. Беляева

Председатель
Контрольно-счетной палаты
городского округа Спасск-Дальний



М.И. Губенко

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Уссурийского городского округа



И.В. Костарева

Председатель
Контрольно-счетного комитета
Чугуевского муниципального района



М.А. Тимофеева

Перечень законодательных и других нормативных правовых актов, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

Закон Приморского края от 23.12.2016 № 52-КЗ «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

Закон Приморского края от 21.12.2017 № 218-КЗ «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

Закон Приморского края от 24.12.2018 № 418-КЗ «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 – 2020 годы»;

постановление Администрации Приморского края от 31.08.2017 № 356-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018 – 2022 годы»;

постановление Администрации Приморского края от 30.12.2014 № 566-па «Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных программ Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края»;

иные документы.

Информация о кассовом исполнении субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2017 году в разрезе муниципальных образований

тыс. рублей

№ п/ п	Наименование муниципального образования	Кассовое исполнение за 2017 год							
		на благоустройство дворовых территорий				на благоустройство территорий общего пользования			
		Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
			ФБ	КБ	МБ		ФБ	КБ	МБ
1	Арсеньевский ГО	17 224,5	13 710,2	2 808,1	706,2	6 654,8	5 297,0	1 084,9	272,9
2	Артемовский ГО	26 230,6	19 163,1	3 925,0	3 142,5	8 262,2	6 219,2	1 273,8	769,2
3	ГО Большой Камень	7 222,6	5 749,0	1 177,5	296,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Владивостокский ГО	52 228,9	33 440,2	6 849,2	11 939,5	62 555,6	32 060,7	14 549,7	15 945,2
5	Дальнегорский ГО	4 815,0	3 832,6	785,0	197,4	2 245,9	1 480,8	303,3	461,8
6	Дальнереченский ГО	8 808,0	7 010,9	1 436,0	361,1	2 722,4	2 166,9	443,9	111,6
7	Лесозаводский ГО	7 046,5	5 608,7	1 148,8	289,0	1 896,1	1 444,6	295,9	155,6
8	Находкинский ГО	5 751,8	4 290,3	878,7	582,8	8 602,4	2 990,0	612,4	5 000,0
9	Партизанский ГО	5 872,0	4 673,9	957,3	240,8	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Уссурийский ГО	26 284,0	13 781,0	2 822,6	9 680,4	12 250,7	6 018,1	1 232,6	5 000,0
11	ГО ЗАТО город Фокино	4 379,6	3 271,8	670,1	437,7	1 361,3	1 083,5	221,9	55,9
	Кавалеровский МР								
12	Кавалеровское ГП	12 771,1	10 165,4	2 082,1	523,6	5 732,8	4 563,1	934,6	235,1
13	Устиновское СП	0,0	0,0	0,0	0,0	930,9	696,6	142,8	91,5
	Кировский МР								
14	Горноключевское ГП	5 918,6	4 673,9	957,3	287,4	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Кировское ГП	0,0	0,0	0,0	0,0	2 439,6	1 765,3	361,5	312,8
	Красноармейский МР								
16	Востокское ГП	15 719,2	12 511,8	2 562,7	644,7	5 835,4	4 644,8	951,3	239,3
	Лазовский МР								
17	Преображенское ГП	0,0	0,0	0,0	0,0	5 058,7	1 599,6	327,7	3 131,4
	Михайловский МР								
18	Ивановское СП	4 879,8	3 884,2	795,5	200,1	180,9	138,6	28,4	13,9
19	Михайловское СП	1 926,0	1 533,0	314,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Новошахтинское ГП	7 614,4	6 060,8	1 241,4	312,2	179,1	142,6	29,2	7,3
21	Сунятсенское СП	814,1	648,0	132,7	33,4	569,3	432,3	88,6	48,4
	Надеждинский МР								
22	Надеждинское СП	6 942,8	5 526,2	1 131,9	284,7	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Раздольненское СП	3 914,7	3 116,0	638,2	160,5	1 512,5	1 203,9	246,6	62,0
24	Тавричанское СП	4 110,4	3 271,8	670,1	168,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Октябрьский МР								
25	Липовецкое ГП	1 894,3	1 507,8	308,8	77,7	2 287,8	1 821,0	373,0	93,8

№ п/ п	Наименование муниципального образования	Кассовое исполнение за 2017 год							
		на благоустройство дворовых территорий				на благоустройство территорий общего пользования			
		Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
			ФБ	КБ	МБ		ФБ	КБ	МБ
26	Покровское СП	5 872,0	4 673,9	957,3	240,8	3 629,9	2 889,3	591,8	148,8
	Ольгинский МР								
27	Веселояровское СП	1 857,0	1 472,0	301,5	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Ольгинское ГП	1 642,7	1 307,5	267,8	67,4	832,0	662,3	135,6	34,1
29	Тимофеевское СП	1 545,0	1 229,8	251,9	63,3	176,0	130,6	26,8	18,6
	Партизанский МР:								
30	Владими́ро-Александровское СП	9 473,3	7 540,5	1 544,4	388,4	14 308,7	10 383,5	2 126,7	1 798,5
31	Золото́долинское СП	0,0	0,0	0,0	0,0	5 954,3	4 739,1	970,7	244,5
32	Сергеевское СП	0,0	0,0	0,0	0,0	4 583,4	3 645,1	746,6	191,7
	Пограничный МР:								
33	Пограничное ГП	2 015,9	1 579,0	323,4	113,5	1 500,5	1 184,6	242,6	73,3
	Пожарский МР:								
34	Лучего́рское ГП	18 125,0	14 425,7	2 954,6	744,7	1 268,3	1 009,5	206,8	52,0
35	Светлогорское СП	14 582,0	11 497,9	2 355,0	729,1	5 633,9	4 442,3	909,9	281,7
	Спасский МР								
36	Хвалынское СП	0,0	0,0	0,0	0,0	3 725,3	2 961,5	606,6	157,2
	Тернейский МР:								
37	Пласту́нское ГП	1 213,4	965,8	197,8	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Тернейское городское поселение	0,0	0,0	0,0	0,0	652,9	519,7	106,4	26,8
	Ханка́йский МР								
39	Камень-Рыболовское СП	4 325,4	3 378,0	691,9	255,5	1 082,8	725,8	148,6	208,4
	Хасанский МР								
40	Зарубинское ГП	2 615,1	2 081,6	426,3	107,2	3 701,8	2 946,6	603,5	151,7
41	Посе́тьское ГП	5 681,7	4 522,5	926,2	233,0	948,9	755,3	154,7	38,9
42	Приморское ГП	1 944,9	1 244,3	254,9	445,7	737,1	507,1	103,9	126,1
43	Славя́нское ГП	2 146,5	1 708,6	349,9	88,0	265,9	211,7	43,4	10,8
44	Хасанское ГП	1 446,8	1 149,8	235,4	61,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Хоро́льский МР								
45	Хоро́льское СП	3 206,3	2 436,5	499,0	270,8	2 403,5	1 776,9	363,9	262,7
46	Яросла́вское ГП	8 425,6	6 706,5	1 373,6	345,5	2 210,2	1 518,9	311,1	380,2
	Черниговский МР								
47	Дмитрие́вское СП	450,2	344,9	70,7	34,6	784,7	592,3	121,3	71,1
48	Реттихо́вское СП	1 866,8	1 485,9	304,4	76,5	474,8	377,9	77,4	19,5
49	Черниговское СП	2 162,4	1 711,7	350,7	100,0	3 424,8	1 431,6	293,2	1 700,0
	Чугуе́вский МР								
50	Чугуе́вское СП	2 253,6	1 791,9	367,0	94,7	3 398,1	2 701,9	553,4	142,8
	Шкото́вский МР								
51	Новоне́жинское СП	765,6	609,4	124,8	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0
52	Подъя́польское СП	722,3	574,9	117,8	29,6	374,3	296,2	60,6	17,5
53	Романо́вское СП	1 887,0	1 494,7	306,2	86,1	227,1	177,7	36,4	13,0

№ п/ п	Наименование муниципального образования	Кассовое исполнение за 2017 год							
		на благоустройство дворовых территорий				на благоустройство территорий общего пользования			
		Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
			ФБ	КБ	МБ		ФБ	КБ	МБ
54	Смоляниновское ГП	3 920,1	3 120,3	639,1	160,7	153,0	121,8	24,9	6,3
55	Шкотовское ГП	3 212,1	2 556,4	523,6	132,1	1 301,3	986,2	202,1	113,0
56	Штыковское СП	704,7	560,9	114,9	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0
57	Центральненское СП	722,3	574,8	117,8	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по муниципальным образованиям:	337 154,6	250 176,3	51 240,9	35 737,4	195 031,9	123 464,0	33 271,0	38 296,9

Приложение 3
к отчету о совместном контрольном мероприятии
от 19 августа 2019 года

Информация о кассовом исполнении муниципальными образованиями
субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков) в 2017 году

тыс. рублей

№ п/ п	Наименование муниципального образования	Размер субсидии, предоставленной бюджетам муниципальных образований			Исполнение за 2017 год				Остаток неиспользованных средств субсидий на 01.01.2018		
		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:			Всего	в том числе:	
			ФБ	КБ		ФБ	КБ	МБ		ФБ	КБ
1	Арсеньевский ГО	3 279,9	2 722,3	557,6	3 420,1	2 722,3	557,6	140,2	0,00	0,00	0,00
2	Артемовский ГО	1 691,5	1 404,0	287,5	663,5	526,0	107,8	29,7	1 057,7	878,0	179,8
3	ГО Большой Камень	2 135,1	1 772,1	363,0	3 887,3	1 772,1	363,0	1 752,2	0,00	0,00	0,00
4	Дальнегорский ГО	1 334,4	1 107,6	226,8	1 391,4	1 107,6	226,8	57,0	0,00	0,00	0,00
5	Дальнереченский ГО	3 124,4	2 593,2	531,2	3 258,0	2 593,3	531,2	133,6	0,00	0,00	0,00
6	ГО Спасск-Дальний	3 254,6	2 701,3	553,3	3 477,7	2 701,3	553,3	223,1	0,00	0,00	0,00
Всего		14 819,9	12 300,5	2 519,4	16 098,0	11 422,5	2 339,6	2 335,9	1 057,8	878,0	179,8

**Информация о кассовом исполнении муниципальными образованиями
субсидий на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды в 2018 году**

тыс. рублей

№ п/ п	Наименование муниципального образования	Кассовое исполнение за 2018 год								
		на благоустройство дворовых территорий					на благоустройство территорий общего пользования			
		Всего	в том числе:				Всего	в том числе:		
			ФБ	КБ	МБ	ВНБ		ФБ	КБ	МБ
1	Арсеньевский ГО	22 715,4	18 439,3	2 514,5	625,8	1 135,8	717,6	610,7	83,3	23,6
2	Артемовский ГО	24 829,6	18 818,4	2 566,1	2 203,6	1 241,5	13 367,2	10 560,4	1 440,1	1 366,7
3	ГО Большой Камень	10 698,4	9 141,6	1 246,6	310,2	0,0	4 576,3	3 910,4	533,2	132,7
4	Владивостокский ГО	81 779,8	53 689,3	7 321,3	16 680,2	4 089,0	53 689,8	28 338,8	3 864,4	21 486,6
5	Дальнегорский ГО	6 209,2	5 305,6	723,5	180,1	0,0	12 063,4	10 305,9	1 405,3	352,2
6	Дальнереченский ГО	3 970,4	3 222,5	439,5	109,9	198,5	7 334,6	6 266,5	854,5	213,6
7	Лесозаводский ГО	8 361,6	6 787,6	925,6	230,3	418,1	5 808,4	4 197,8	572,4	1 038,2
8	Находкинский ГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69 543,9	50 019,7	6 820,9	12 703,3
9	Партизанский ГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 340,7	14 814,7	2 020,2	505,8
10	ГО Спасск-Дальний	5 847,7	4 746,9	647,3	161,1	292,4	7 081,1	5 750,6	784,2	546,3
11	Уссурийский ГО	33 282,0	27 016,9	3 684,1	916,9	1 664,1	22 501,6	19 227,1	2 621,9	652,6
12	ГО ЗАТО город Фокино	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 328,8	7 971,3	1 087,0	270,5
	Кавалеровский МР									
13	Кавалеровское ГП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 878,1	5 804,6	791,5	282,0
	Красноармейский МР									
14	Востокское ГП	1 317,1	1 067,5	145,6	38,2	65,8	377,7	322,7	44,0	11,0
	Михайловский МР									
15	Новошахтинское ГП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 121,8	2 663,8	363,2	94,8
	Надеждинский МР									
16	Надеждинское СП	4 123,3	3 150,5	429,6	337,0	206,2	3 698,7	3 160,4	431,0	107,3
17	Раздольненское СП	4 622,3	3 514,3	479,2	377,7	251,1	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Тавричанское СП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 376,0	2 884,7	393,4	97,9
	Октябрьский МР									
19	Липовецкое ГП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 948,8	2 461,4	335,7	151,7
20	Покровское СП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 101,1	6 794,5	926,5	380,1
	Партизанский МР									
21	Владимиرو-Александровское СП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 422,7	2 070,2	282,3	70,2
22	Екатериновское СП	2 317,2	1 877,4	256,0	68,0	115,8	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Золотолинское СП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 241,6	1 060,9	144,7	36,0
24	Новицкое СП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 062,5	1 762,4	240,3	59,8
25	Сергеевское СП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 767,2	1 206,0	164,5	396,7
	Пограничный МР									
26	Пограничное ГП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 301,7	4 480,9	611,0	209,8

№ п/ п	Наименование муниципального образования	Кассовое исполнение за 2018 год								
		на благоустройство дворовых территорий					на благоустройство территорий общего пользования			
		Всего	в том числе:				Всего	в том числе:		
			ФБ	КБ	МБ	ВНБ		ФБ	КБ	МБ
27	Сергеевское СП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 655,2	1 993,6	271,9	389,7
	Пожарский МР									
28	Лучегорское ГП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 697,5	6 991,6	953,4	752,5
29	Пожарское СП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	680,0	471,0	64,2	144,8
30	Светлогорское СП	543,7	440,8	60,1	15,0	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Губеровское СП	574,3	466,1	63,6	15,8	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Верхнеперевальское СП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	853,1	413,8	56,4	382,9
	Спасский МР									
33	Хвалынское СП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 099,1	1 704,3	232,4	162,4
	Тернейский МР									
34	Пластунское ГП	2 056,6	1 666,8	227,3	56,6	105,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ханкайский МР									
35	Камень-Рыболовское СП	4 536,5	3 291,0	448,8	569,9	226,8	2 257,0	1 928,3	263,0	65,7
	Хасанский МР									
36	Зарубинское ГП	1 506,3	1 222,8	166,7	41,5	75,3	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Посъетское ГП	924,9	750,8	102,4	25,5	46,2	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Приморское ГП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 827,7	640,1	87,3	1 100,3
	Хорольский МР									
39	Ярославское ГП	1 016,9	825,4	112,6	28,0	50,9	3 329,4	2 844,9	387,9	96,6
40	Хорольское СП	1 170,8	950,4	129,6	32,3	58,5	4 448,0	3 798,2	517,9	131,9
	Черниговский МР									
41	Сибирцевское ГП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 544,2	3 580,0	488,2	476,0
	Чугуевский МР									
42	Чугуевское СП	2 174,4	1 762,4	240,2	59,8	112,0	3 309,7	2 828,2	385,5	96,0
	Шкотовский МР									
43	Смоляниновское ГП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 018,6	2 219,7	302,7	496,2
44	Шкотовское ГП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 923,4	1 643,5	224,1	55,8
	Яковлевский МР									
45	Яковлевское СП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 581,7	1 351,5	184,3	45,9
	Всего	224 578,4	168 154,3	22 930,2	23 083,4	10 410,5	305 875,9	229 055,1	31 234,7	45 586,1

Приложение 5
к отчету о совместном контрольном мероприятии
от 19 августа 2019 года

**Информация о кассовом исполнении муниципальными образованиями
субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков) в 2018 году**

тыс. рублей

№ п/ п	Наименование муниципального образования	Размер субсидии, предоставленной бюджетам муниципальных образований			Исполнение за 2018				Остаток неиспользованных средств субсидий на 01.01.2019		
		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:			Всего	в том числе:	
			ФБ	КБ		ФБ	КБ	МБ		ФБ	КБ
1	Арсеньевский ГО	3 553,4	3 127,0	426,4	3 660,0	3 127,0	426,4	106,6	0,0	0,0	0,0
2	ГО Большой Камень	2 676,0	2 354,9	321,1	3 657,7	2 354,9	321,1	981,7	0,0	0,0	0,0
3	Дальнегорский ГО	2 909,9	2 560,7	349,2	2 996,8	2 560,7	349,2	86,9	0,0	0,0	0,0
4	Дальнереченский ГО	1 945,6	1 712,1	233,5	2 004,0	1 712,1	233,5	58,4	0,0	0,0	0,0
5	ГО Спасск-Дальний	2 750,1	2 420,1	330,0	2 989,1	2 420,1	330,0	239,0	0,0	0,0	0,0
	Всего	13 835,0	12 174,8	1 660,2	15 307,6	12 174,8	1 660,2	1 472,6	0,0	0,0	0,0

Информация о количестве объектов, благоустроенных в 2017 году

№ п/п	Наименование муниципального образования	Благоустроенные дворовые территории, ед.	Благоустроенные территории общего пользования, ед.	Благоустроенные городские парки, ед.
1	Арсеньевский ГО	10	1	1
2	Артемовский ГО	18	1	1
3	ГО Большой Камень	14		1
4	ГО Спасск-Дальний			1
5	Владивостокский ГО	17	3	
6	Дальнегорский ГО	3	2	1
7	Дальнереченский ГО	6	1	1
8	Лесозаводский ГО	8	1	
9	Находкинский ГО	4	1	
10	Партизанский ГО	7		
11	Уссурийский ГО	20	1	
12	ГО ЗАТО город Фокино	4	1	
	Кавалеровский МР			
13	Кавалеровское ГП	3	2	
14	Устиновское СП		2	
	Кировский МР			
15	Горноключевское ГП	6		
16	Кировское ГП		1	
	Красноармейский МР			
17	Востокское ГП	6	4	
	Лазовский МР			
18	Преображенское ГП		1	
	Михайловский МР			
19	Ивановское СП	3	1	
20	Михайловское СП	1		
21	Новошахтинское ГП	8	1	
22	Сунятсенское СП	2	1	
	Надеждинский МР			
23	Надеждинское СП	1		
24	Раздольненское СП	2	1	
25	Тавричанское СП	3		
	Октябрьский МР			
26	Липовецкое ГП	2	1	
27	Покровское СП	7	1	
	Ольгинский МР			
28	Веселояровское СП	5		
29	Ольгинское ГП	3	1	
30	Тимофеевское СП	9	1	
	Партизанский МР:			
31	Владими- ро- Александровское СП	2	1	
32	Золото- долинское СП		1	

№ п/п	Наименование муниципального образования	Благоустроенные дворовые территории, ед.	Благоустроенные территории общего пользования, ед.	Благоустроенные городские парки, ед.
33	Сергеевское СП		4	
	Пограничный МР:			
34	Пограничное ГП	1	1	
	Пожарский МР:			
35	Лучегорское ГП	7	1	
36	Светлогорское СП	3	1	
	Спасский МР			
37	Хвалынское СП		1	
	Тернейский МР:			
38	Пластунское ГП	1		
39	Тернейское городское поселение		1	
	Ханкайский МР			
40	Камень-Рыболовское СП	6	1	
	Хасанский МР			
41	Зарубинское ГП	3	1	
42	Посъетское ГП	4	1	
43	Приморское ГП	3	1	
44	Славянское ГП	4	1	
45	Хасанское ГП	4		
	Хорольский МР			
46	Хорольское СП	7	1	
47	Ярославское ГП	10	1	
	Черниговский МР			
48	Дмитриевское СП	1	1	
49	Реттиховское СП	5	1	
50	Черниговское СП	1	1	
	Чугуевский МР			
51	Чугуевское СП	3	2	
	Шкотовский МР			
52	Новонежинское СП	3		
53	Подъяпольское СП	10	3	
54	Романовское СП	4	1	
55	Смоляниновское ГП	3	1	
56	Шкотовское ГП	2	1	
57	Штыковское СП	1		
58	Центральненское СП	2		
	Итого:	254	58	6

Информация о количестве объектов, благоустроенных в 2018 году

№ п/п	Наименование муниципального образования	Благоустроенные дворовые территории, ед.	Благоустроенные территории общего пользования, ед.	Благоустроенные городские парки, ед.
1	Арсеньевский ГО	9	1	1
2	Артемовский ГО	17	1	
3	ГО Большой Камень	4	1	1
4	Владивостокский ГО	44	3	
5	Дальнегорский ГО	3	1	1
6	Дальнереченский ГО	2	1	1
7	Лесозаводский ГО	4	3	
8	Находкинский ГО		4	
9	Партизанский ГО		1	
10	ГО Спасск-Дальний	5	1	1
11	Уссурийский ГО	28	1	
12	ГО ЗАТО город Фокино		1	
	Кавалеровский МР			
13	Кавалеровское ГП		1	
	Красноармейский МР			
14	Востокское ГП	1	2	
	Михайловский МР			
15	Новошахтинское ГП		3	
	Надеждинский МР			
16	Надеждинское СП	2	1	
17	Раздольненское СП	2		
18	Тавричанское СП		1	
	Октябрьский МР			
19	Липовецкое ГП		1	
20	Покровское СП		1	
	Партизанский МР			
21	Владими- ро- Александровское СП		1	
22	Екатериновское СП	1		
23	Золотолинское СП		2	
24	Новицкое СП		1	
25	Сергеевское СП		1	
	Пограничный МР			
26	Пограничное ГП		1	
27	Сергеевское СП		1	
	Пожарский МР			
28	Лучегорское ГП		1	
29	Пожарское СП		1	
30	Светлогорское СП	1		
31	Губеровское СП	1		
32	Верхнеперевальское СП		1	
	Спасский МР			

№ п/п	Наименование муниципального образования	Благоустроенные дворовые территории, ед.	Благоустроенные территории общего пользования, ед.	Благоустроенные городские парки, ед.
33	Хвалынское СП		1	
	Тернейский МР			
34	Пластунское ГП	1		
	Ханкайский МР			
35	Камень-Рыболовское СП	4	1	
	Хасанский МР			
36	Зарубинское ГП	2		
37	Посъетское ГП	1		
38	Приморское ГП		1	
	Хорольский МР			
39	Ярославское ГП		4	
40	Хорольское СП	1	2	
	Черниговский МР			
41	Сибирцевское ГП		1	
	Чугуевский МР			
42	Чугуевское СП	1	3	
	Шкотовский МР			
43	Смоляниновское ГП		1	
44	Шкотовское ГП		1	
	Яковлевский МР			
45	Яковлевское СП		1	
	Всего	139	55	5
