



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Алеутская, 45а, г. Владивосток, 690091
Тел.: (423) 243-32-60, факс: (423) 243-32-60
E-mail: pk@ksp25.ru
ОКПО 38557372, ОГРН 1122540000670
ИНН/КПП 2540178592/254001001

Председателю
Законодательного Собрания
Приморского края

Волошко А.А.

27.12.2023 № 02-01/1001

На № _____ от _____

О направлении отчета о
контрольном мероприятии

Уважаемый Антон Анатольевич!

В соответствии с Законом Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ «О Контрольно-счетной палате Приморского края», пунктом 2.5.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2023 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Приморского края от 27.12.2022 № 127-П, Контрольно-счетной палатой Приморского края проведено контрольное мероприятие «Проверка результативности и целевого расходования бюджетных средств на развитие сети учреждений культурно-досугового типа», за 2022 год и истекший период 2023 года», в результате которого установлено следующее.

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности является мероприятием регионального проекта «Культурная среда» (далее – РП «Культурная среда»¹), входящего в состав подпрограммы «Поддержка культуры в Приморском крае» государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 936-па (далее – ГП «Развитие культуры Приморского края»).

При этом паспортом РП «Культурная среда» предусмотрено, что к концу 2024 года будет построено (капитально отремонтировано) 30 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (пункт 7 раздела I Паспорта РП «Культурная среда»), что на 10 объектов больше, чем запланировано ГП «Развитие культуры Приморского края» (20 объектов)².

¹Паспорт регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Приморский край)» утвержден Губернатором Приморского края от 31.01.2023.

²Разделом 3 ГП «Развитие культуры Приморского края» в рамках подпрограммы «Поддержка культуры в Приморском крае» предусмотрена реализация мероприятия регионального проекта «Культурная среда» – развитие сети учреждений культурно-досугового типа с ожидаемыми результатами: к 2026 году будет отремонтировано 17 объектов культурно-досугового типа, к 2024 году будет построено и введено в эксплуатацию 2 объекта культуры, к 2025 году будет построен и введен в эксплуатацию 1 объект культуры.

В краевом бюджете предусмотрены субсидии муниципальным образованиям Приморского края в объеме 414 116,84 тыс. рублей (2022 год – 181 597,98 тыс. рублей, 2023 год³ – 232 518,86 тыс. рублей), из них освоено 310 684,71 тыс. рублей (за 2022 год – 181 553,77 тыс. рублей, или 99,9 %; за 9 месяцев 2023 года – 129 130,94 тыс. рублей, или 55,54 %).

За проверяемый период показатели, установленные министерством культуры и архивного дела Приморского края в соглашениях, заключенных с муниципальными образованиями – получателями субсидий, достигнуты следующим образом: из 27 объектов за 2022 год и 9 месяцев 2023 года отремонтировано и построено 23 объекта, начато строительство 1 объекта, в том числе:

за 2022 год: отремонтированы 12 учреждений культурно-досугового типа, расположенные в сельской местности; начато строительство 2 зданий сельских Домов культуры в с. Сергеевка Пограничного муниципального округа и с. Светлогорье Пожарского муниципального округа, срок сдачи которых – 2023 год;

за 9 месяцев 2023 года: отремонтированы 9 из 12 объектов культуры, завершается строительство 2 сельских домов культуры в с. Сергеевка Пограничного муниципального округа и в с. Светлогорье Пожарского муниципального округа, начато строительство Дома культуры в Артемовском городском округе (срок сдачи 2024 год).

Следует отметить, что в 2022 году подрядными организациями осуществлялись ремонтные и строительные работы на объектах с нарушением сроков, установленных муниципальными контрактами, от 1 дня (4 этап капитального ремонта клуба с. Улитовка Уссурийского городского округа, подрядчик ООО «ОКЕАН ЛОДЖИСТИК») до 280 дней (I – III этапы строительства сельского Дома культуры в с. Сергеевка Пограничного муниципального округа, подрядчик ООО «СК «Левада»). За нарушение сроков выполнения работ подрядчикам предъявлены пени на общую сумму 409,42 тыс. рублей, из них на 01.10.2023 оплачено 44,20 тыс. рублей.

Нецелевого использования субсидий на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в проверяемом периоде не установлено.

При этом установлены факты авансирования ремонтных и строительных работ в нарушение Порядка предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности – Приложение № 25 к ГП «Развитие культуры Приморского края» (далее – Порядок):

- аванс на капитальный ремонт сцены большого зала Дома культуры Пожарского муниципального округа (подрядчик – ООО «Стройбыт»)

³ С изменениями, внесенными Законом Приморского края от 25.10.2023 № 448-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

составил 40 % от цены контракта, или 9 013,10 тыс. рублей, при том что авансирование данных работ Порядком не предусмотрено;

- аванс на строительство сельского Дома культуры в с. Сергеевка (подрядчик – ООО «ПСП») составил 40 % от цены контракта, что на 10 %, или на 5 346,84 тыс. рублей превышает допустимый Порядком размер авансирования.

Кроме того, в нарушение требований законодательства в сфере закупок Администрацией Пограничного муниципального округа заключен муниципальный контракт на строительство сельского Дома культуры в с. Сергеевка от 23.12.2022 № 268 с единственным поставщиком – ООО «Полимерстройпроект» без проведения конкурентной процедуры.

По результатам контрольного мероприятия министерству культуры и архивного дела Приморского края и Администрации Пограничного муниципального округа внесены представления об устранении недостатков и нарушений.

Материалы контрольного мероприятия в части нарушений требований законодательства в сфере закупок, допущенных Администрацией Пограничного муниципального округа, направлены в прокуратуру Приморского края.

Отчет о контрольном мероприятии и копии представлений, внесенных по итогам контрольного мероприятия, направлены Губернатору Приморского края.

Приложение: на 22 л. в 1 экз.

И.о. председателя



В.В. Волкова

ОТЧЕТ

о контрольном мероприятии «Проверка результативности и целевого расходования бюджетных средств на развитие сети учреждений культурно-досугового типа», за 2022 год и истекший период 2023 года
(утвержден коллегией Контрольно-счетной палаты Приморского края,
протокол от 26.12.2023 № 19)

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.5.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2023 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Приморского края от 27.12.2022 № 127-П, распоряжения Контрольно-счетной палаты Приморского края от 25.09.2023 № 32 «О проведении контрольного мероприятия в министерстве культуры и архивного дела Приморского края», от 30.11.2023 № 32/1 «О проведении контрольного мероприятия в Администрации Пограничного муниципального округа Приморского края».

2. Предмет контрольного мероприятия: средства краевого бюджета, предоставленные министерством культуры и архивного дела Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на развитие сети учреждений культурно-досугового типа.

3. Объекты контрольного мероприятия: министерство культуры и архивного дела Приморского края, Администрация Пограничного муниципального округа Приморского края.

4. Проверяемый период деятельности: 2022 год и истекший период 2023 года.

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 25.09.2023 по 25.12.2023.

6. Цель контрольного мероприятия:

Проверить результативность и целевое расходование субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.

Объем проверенных средств: 310 684,71 тыс. рублей (2022 год – 181 553,77 тыс. рублей, 9 месяцев 2023 года – 129 130,94 тыс. рублей).

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования средств краевого бюджета.

Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении основ государственной культурной политики» (далее – Указ № 808) определены задачи государственной культурной политики в области осуществления всех видов культурной деятельности, включая сохранение и развитие единого культурного пространства России, из них:

развитие инфраструктуры культурной деятельности, создание благоприятной культурной среды в малых городах и сельских поселениях;

создание развитой сети театральных, концертных, выставочных залов, многофункциональных культурных центров и иных культурно-досуговых учреждений.

Во исполнение основ государственной культурной политики, утвержденных Указом № 808, разработана Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р (далее – Стратегия), предусматривающая мероприятия в целях активизации культурного потенциала территорий и сглаживания региональных диспропорций, из них:

выравнивание региональных диспропорций в уровнях обеспеченности объектами культуры, финансирования и условиях доступности культурных благ для широких слоев населения;

разработка и реализация программ поддержки культурной инфраструктуры малых городов и сельских поселений, содействующих развитию городской и сельской культурной среды.

В Приморском крае основным источником, обеспечивающим реализацию Стратегии, является государственная программа Приморского края «Развитие культуры Приморского края», утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 936-па (далее – ГП «Развитие культуры Приморского края»), в состав которой входит подпрограмма «Поддержка культуры в Приморском крае».

Согласно оценке текущего состояния сферы культуры Приморского края, приведенной в разделе I ГП «Развитие культуры Приморского края», в Приморском крае остаются нерешенными многие проблемы в сфере культуры, из них:

высокая степень изношенности зданий муниципальных учреждений культуры;

значительное сокращение сети культурно-досуговых учреждений и ухудшение ассортимента и качества предоставляемых услуг.

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

1.1. Разделом 3 ГП «Развитие культуры Приморского края» в рамках подпрограммы «Поддержка культуры в Приморском крае» предусмотрена реализация мероприятия регионального проекта «Культурная среда» – развитие сети учреждений культурно-досугового типа с ожидаемыми результатами: к 2026 году будет отремонтировано 17 объектов культурно-досугового типа, к 2024 году будет построено и введено в эксплуатацию 2 объекта культуры, к 2025 году будет построен и введен в эксплуатацию 1 объект культуры, т.е. общее количество построенных, отремонтированных (реконструированных) объектов – 20.

При этом Паспортом регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Приморский край)», утвержденным Губернатором

Приморского края от 31.01.2023 (далее – РП («Культурная среда»), предусмотрены результаты регионального проекта для получения гражданами дополнительных возможностей для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкого доступа к культурным ценностям – к концу 2024 года (с 01.01.2018) построено (капитально отремонтировано) 30 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (пункт 7 раздела I Паспорта РП «Культурная среда»), т.е. на 10 объектов больше, чем запланировано ГП «Развитие культуры Приморского края».

1.2. ГП «Развитие культуры Приморского края» содержит Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности – Приложение № 25 к ГП «Развитие культуры Приморского края» (далее – Порядок).

Порядок определяет цель, условия предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, в целях реализации регионального проекта «Культурная среда», направленного на реализацию национального проекта «Культура».

Целью предоставления субсидии является создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий.

Пунктом 6 Порядка предусмотрено, что распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований, соответствующих условиям и критериям, установленным пунктами 3 и 4 Порядка, предоставивших в Министерство в срок до 1 июня года, предшествующего году предоставления субсидии, перечень документов на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию объектов культуры согласно пункту 5 Порядка, утверждается законом Приморского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Министерством и муниципальным образованием в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (пункт 8 Порядка).

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные Порядком (пункт 12 Порядка).

Ответственность за результативность, целевое использование субсидий, достоверность предоставляемых в Министерство документов и

отчетов, предусмотренных настоящим Порядком, возлагается на органы местного самоуправления (пункт 14 Порядка).

2.1. Объем субсидий на развитие сети учреждений культурно-досугового типа предусмотрен в краевом бюджете в рамках подпрограммы «Поддержка культуры в Приморском крае» ГП «Развитие культуры Приморского края» по ведомству 806 «Министерство культуры и архивного дела Приморского края» и утвержден:

на 2022 год Законом Приморского края от 21.12.2021 № 31-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Закон № 31-КЗ) – в сумме 181 597,98 тыс. рублей, в том числе 101 197,5 тыс. рублей (55,7 %) составляют средства федерального бюджета, предоставленные Приморскому краю на основании Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключенному Министерством культуры Российской Федерации с Правительством Приморского края от 24.12.2021 № 054-09-2022-690, в редакции Дополнительного соглашения от 07.11.2022 № 054-09-2022-690/3 (далее – Соглашение от 24.12.2021 № 054-09-2022-690);

на 2023 год Законом Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Закон № 253-КЗ)¹ – в сумме 232 518,86 тыс. рублей, в том числе 143 176,0 тыс. рублей (61,6 %) составляют средства федерального бюджета, предоставленные Приморскому краю на основании Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключенному Министерством культуры Российской Федерации с Правительством Приморского края от 27.12.2022 № 054-09-2023-837 (далее – Соглашение от 27.12.2022 № 054-09-2023-837).

За проверяемый период освоено субсидий в сумме 310 684,71 тыс. рублей, в том числе:

за 2022 год – 181 553,77 тыс. рублей, или на 99,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (181 597,98 тыс. рублей);

за 9 месяцев 2023 года – 129 130,94 тыс. рублей, или на 55,54 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (232 518,86 тыс. рублей).

Данные об объеме субсидий, распределенном между муниципальными образованиями и освоенном получателями за 2022 год и девять месяцев 2023 года, приведены в таблице 1.

Таблица 1

2022 год					2023 год				
наименование объекта	уточненный бюджет, тыс. руб.	кассовое исполнение, тыс. руб.	% исполнения	отклонение (гр. 2 – гр. 3), тыс. руб.	наименование объекта	уточненный бюджет, тыс. руб.	кассовое исполнение за 9 мес. 2023 года	% исполнения	отклонение (гр. 7 – гр. 8), тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

¹ С изменениями, внесенными Законом Приморского края от 25.10.2023 № 448-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

городские округа									
кап. ремонт ДК «Любава» с. Суражевка, ДК «Диана» с. Артемовский Артемовского г/о;	17 803,84	17 803,84	100	0	строительство Центра культурного развития на территории Артемовского г/о в с. Кневичи;	67 683,67	36 539,88	54,0	31 143,79
кап. ремонт здания клуба в с. Улитовка Уссурийского г/о	9 014,05	9 014,05	100	0	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	кап. ремонт здания МАУК «Ливадийский дом культуры» Находкинского г/о структурного подразделения «Клуб с. Анна»	2 503,68	2 503,68	100,0	0
муниципальные районы и округа									
кап. ремонт Информационно - досугового центра Анучинского м/о	16 026,95	16 026,95	100	0	-	-	-	-	-
строительство сельского Дома культуры в с. Сергеевка Пограничного м/о	18 947,07	18 947,07	100	0	строительство сельского Дома культуры в с. Сергеевка; кап. ремонт сельского Центра досуга с. Барановское и Дома культуры с. Духовское;	64 804,72	18 298,89	28,2	46 505,83
кап. ремонт фасада Дома культуры с. Хороль	16 465,36	16 465,36	100	0	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	кап. ремонт зданий с. Ильинка и с. Камень-Рыболов Ханкайского м/о	4 977,08	4 977,08	100	0
-	-	-	-	-	кап. ремонт сельского Дома культуры с. Серафимовка Ольгинского м/о	11 964,0	11 962,21	99,9	1,79
кап. ремонт МБУ «Дворец культуры», строительство сельского дома культуры на 101 место в с. Светлогорье Пожарского м/о	74 855,63	74 811,42	99,9	44,21	строительство сельского дома культуры на 101 место в с. Светлогорье;	26 600,0	10 538,08	39,6	16 061,92
кап. ремонт здания МБУ «Социально-культурный центр» с. Спасское	12 265,15	12 265,15	100	0	-	-	-	-	-
кап. ремонт Дома культуры с. Центральное и Культурно - досугового центра в д. Речица;	3 910,12	3 910,12	100	0	кап. ремонт здания дома культуры с. Стеглянуха Шкотовского м/р	1 685,12	1 685,12	100	0
-	-	-	-	-	кап. ремонт районного центра культуры и досуга с. Черниговска	30 888,92	21 385,31	69,2	9 503,61
городские и сельские поселения									
кап. ремонт МКУК «Металлург» п. Восток Красноармейского района	2 358,21	2 358,21	100	0	-	-	-	-	-
кап. ремонт Дома	5 407,43	5 407,43	100	0	-	-	-	-	-

культуры п. Ново-шахтинский Михайловского района									
-	-	-	-	-	кап. ремонт сельского дома культуры с. Павло-Федоровка Кировского м/р	4 810,0	4 810,0	100	0
кап. ремонт клуба филиала № 1 МКУ «Раздольненский центр культуры и досуга» Надеждинского м/р	4 544,17	4 544,17	100	0	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	кап. ремонт здания в с. Веденка Дальнереченского м/р	5 305,84	5 305,84	100	0
-	-	-	-	-	кап. ремонт Домов культуры с. Перетино и с. Золотая Долина Золотодолинского сельского поселения Партизанского м/р	11 295,83	11 124,85	98,5	170,98
итого:	181 597,98	181 553,77	99,9	-44,21		232 518,86	129 130,94	55,54	103 387,92

3. При проверке результативности использования субсидий установлено, что муниципальными образованиями – получателями субсидий показатели, установленные Министерством в Соглашениях, достигнуты следующим образом: из 27 объектов за 2022 год и 9 месяцев 2023 года всего отремонтировано и построено 23 объекта, начато строительство 1 объекта, в том числе:

за 2022 год: отремонтированы 12 учреждений культурно-досугового типа, расположенные в сельской местности; начато строительство 2 зданий сельских Домов культуры в с. Сергеевка Пограничного муниципального округа и с. Светлогорье Пожарского муниципального округа;

за 9 месяцев 2023 года: произведен капитальный ремонт 9 объектов культуры из 12 объектов, завершается строительство 2 сельских домов культуры в с. Сергеевка Пограничного муниципального округа (осуществляется приемка объекта) и в с. Светлогорье Пожарского муниципального округа (получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 11.12.2023 № 25-15-03-2023), начато строительство Дома культуры в Артемовском городском округе (срок сдачи 2024 год).

В проверяемом периоде нецелевого использования субсидий на развитие сети учреждений культурно-досугового типа не установлено.

3.1. При этом проверкой установлено, что отдельными муниципальными образованиями осуществлялось авансирование ремонтных и строительных работ в нарушение действующего Порядка, а именно:

- пунктом 2.8 муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта (сцена большого зала ДК Пожарского МР), расположенного по адресу: Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, ул. Общественный Центр, 2, от 04.07.2022 № 5/2022 (далее – контракт от 04.07.2022 № 5/2022), заключенным заказчиком – МБУ «ДК

Пожарского МР» с подрядчиком – Общество с ограниченной ответственностью «Стройбыт» (далее – ООО «Стройбыт»), предусмотрена выплата аванса ООО «Стройбыт» в размере 40 % от цены контракта (22 532,75 тыс. рублей), что составляет 9 013,10 тыс. рублей. Аванс перечислен подрядчику в полном объеме (платежное поручение от 22.08.2022 № 808870).

Авансирование ремонтных работ, предусмотренное контрактом от 04.07.2022 № 5/2022, является нарушением части 4.1 Порядка, так как субсидии на капитальный ремонт предоставляются при условии заключения органами местного самоуправления муниципальных контрактов (договоров) на осуществление закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по вопросам местного значения, на софинансирование которых предоставляются субсидии на условиях, не предусматривающих авансовые платежи;

- пунктом 3.6 муниципального контракта № 268 (Типовые условия муниципального контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству объекта капитального строительства), заключенному Администрацией Пограничного муниципального округа с подрядчиком – ООО «Полимерстройпроект» (далее – ООО «ПСП») от 23.12.2022 (далее – контракт от 23.12.2022 № 268), предусмотрена выплата аванса на строительство сельского Дома культуры в с. Сергеевка подрядчику в размере 40 % от цены контракта (53 468,43 тыс. рублей), или в сумме 21 387,37 тыс. рублей.

В соответствии с частью 4.2 Порядка при заключении договоров (муниципальных контрактов) о выполнении работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства муниципальной собственности, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, возможно установление авансовых платежей в размере, не превышающем 30 % суммы соответствующего договора (муниципального контракта).

Учитывая вышеизложенное, авансирование следовало предусмотреть в размере 30 % от цены контракта от 23.12.2022 № 268 (53 468,43 тыс. рублей), что составляет 16 040,53 тыс. рублей.

В нарушение части 4.2 Порядка авансовый платеж, установленный пунктом 3.6 контракта от 23.12.2022 № 268, превышает допустимое значение на 10 %, или на 5 346,84 тыс. рублей.

3.2. В 2022 году в нарушение условий муниципальных контрактов подрядными организациями осуществлялись ремонтные и строительные работы на объектах с нарушением сроков, установленных муниципальными контрактами, от 1 дня (4 этап капитального ремонта клуба с. Улитовка Уссурийского городского округа, подрядчик ООО «ОКЕАН ЛОДЖИСТИК») до 280 дней (строительство сельского Дома культуры в с. Сергеевка Пограничного муниципального округа, подрядчик ООО «Левада»).

За нарушение сроков выполнения работ заказчиками – получателями субсидий предъявлены пени подрядным организациям на общую сумму 409,42 тыс. рублей, из них оплачено подрядчиками 44,20 тыс. рублей, таблица 2.

Таблица 2

Наименование объекта	Муниципальный контракт:		Срок завершения работ			К-во дней просрочки обязательств	Пени, тыс. руб.	Платежное поручение	
	дата, № (наименование подрядчика)	сумма, тыс. руб.	план	факт	не выполнены работы на:			дата, №	сумма, тыс. руб.
<i>Артемовский городской округ</i>									
кап. ремонт ДК «Любава» с. Суражевка	12.05.2022 № 07-2022, доп. соглашение от 07.09.2022 № 4 (ООО «Примводо каналналадка»)	20 548,75	09.08.2022	12.09.2022	-	34	25,13	29.09.2022 № 1	25,13
кап. ремонт ДК «Диана» пос. Артемовский	25.02.2022 № 01-2022 (ООО «АРХ-СТРОЙ 27»)	1 484,99	06.05.2022	23.06.2022	-	48	5,55	24.06.2022 № 119	5,55
итого	-	22 033,74	-	-	-	82	30,68	-	30,68
<i>Уссурийский городской округ</i>									
кап. ремонт клуба с. Улитовка	21.02.2022 № 161/22, д. соглашение от 30.05.2022 № 3 (ООО «ОКЕАН ЛОДЖИСТИК»)	8 266,69	8 этап – 15.05.2022	-	15.06.2022	31	2,31	14.09.2022 № 524	2,31
			4 этап – 20.06.2022	-	21.06.2022	1	1,69	14.09.2022 № 523	1,69
итого	-	8 266,69	-	-	-	32	4,0	-	4,0
<i>Пограничный муниципальный округ</i>									
строительство сельского Дома культуры в с. Сергеевка	08.04.2022 № 012030000672 20000340002 (ООО «Левада»)	51 031,41	1 этап – 30.06.2022	-	02.12.2022	155	37,22	-	0
			2 этап – 31.08.2022	-	02.12.2022	93	155,32	-	0
			3 этап – 31.10.2022	-	02.12.2022	32	121,23	-	0
итого	-	51 031,41	-	-	-	280	313,77	-	0
<i>Пожарский муниципальный округ</i>									
кап. ремонт МБУ «ДК Пожарского района», ремонт крыльца	17.06.2022 № 7/2022 (ИП Учайкина)	2 140,70	01.09.2022	24.11.2022	-	95	51,45	-	0
итого	-	2 140,70	-	-	-	95	51,45	-	0
<i>Шкотовский муниципальный округ</i>									
кап. ремонт Дома культуры в с. Центральное	12.01.2022 № 012030001452 10000500001 (ООО «Шкотрис»)	1 402,79	30.06.2022	22.07.2022	-	22	9,52	08.08.2022 № 27	9,52
итого	-	1 402,79	-	-	-	22	9,52	-	9,52
ИТОГО 2022 ГОД		-	-	-	-	511	409,42	-	44,20

Согласно данным, приведенным в таблице 2, двумя из шести подрядчиков не произведена уплата пени на сумму 365,22 тыс. рублей, а именно:

1) по результатам проведения электронного аукциона (протокол подведения итогов от 06.06.2022 № 0320300055622000002-2) между

заказчиком – МБУ «ДК Пожарского МР» и подрядчиком – Индивидуальным предпринимателем Учайкиной (далее – ИП Учайкина) заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту крыльца здания ДК Пожарского МР по адресу: Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, ул. Общественный центр, д. 2, от 17.06.2022 № 7/2022, на сумму 2 140,70 тыс. рублей (далее – контракт от 17.06.2022 № 7/2022).

Сроки выполнения работ предусмотрены пунктом 3.1 контракта от 17.06.2022 № 7/2022: начало выполнения работ – с момента заключения контракта, окончание выполнения работ – 01.09.2022.

Фактически работы выполнены 24.11.2022, что подтверждено актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) от 24.11.2022 № 1 на сумму 2 140,70 тыс. рублей. Оплата подрядчику – ИП Учайкиной произведена заказчиком – МБУ «ДК Пожарского МР» в полном объеме (платежное поручение от 16.12.2022 № 91936).

За просрочку выполнения ремонтных работ на 95 дней (с 02.09.2022 по 05.12.2022) подрядчику – ИП Учайкиной предъявлено требование (претензия) об уплате пени (штрафа, неустойки) в связи с просрочкой исполнения (ненадлежащим исполнением) обязательств (гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, при осуществлении закупки товара (работы, услуги) от 20.12.2022 № 279, в сумме 51,45 тыс. рублей. До настоящего времени уплата неустойки не произведена;

2) по результатам проведения электронного аукциона (протокол от 25.03.2022 № 0120300006722000034-1) между заказчиком – Администрацией Пограничного муниципального округа и подрядчиком – Обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «Левада» (далее – ООО «СК «Левада») заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству сельского Дома культуры в с. Сергеевка Приморского края от 08.04.2022 № 01203000067220000340002 (далее – контракт от 08.04.2022 № 01203000067220000340002).

Объем и содержание работ определены ведомостями объемов работ, проектно-сметной документацией (приложение № 1 к контракту) и контрактом (пункт 2.1 контракта от 08.04.2022 № 01203000067220000340002).

Пунктом 3.1 контракта от 08.04.2022 № 01203000067220000340002 установлена цена контракта в сумме 51 031,41 тыс. рублей (2022 год – 15 640,61 тыс. рублей, 2023 год – 35 390,80 тыс. рублей).

Пунктом 2.2 контракта от 08.04.2022 № 01203000067220000340002 предусмотрен срок выполнения работ: начало выполнения работ – **01.05.2022**, окончание выполнения работ – **31.08.2023**. Сроки выполнения работ (отдельных этапов работ) определяются Графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 2 к контракту).

Цена каждого этапа исполнения контракта и размер аванса в отношении каждого этапа контракта предусмотрены пунктами 3.1.1 и 3.7 контракта от 08.04.2022 № 01203000067220000340002.

Фактически Администрацией Пограничного муниципального округа на выполнение контракта от 08.04.2022 № 01203000067220000340002 подрядчику – ООО «СК «Левада» перечислены авансовые платежи в общей сумме 15 165,33 тыс. рублей, таблица 3.

Таблица 3

Этап	Предусмотрено контрактом от 08.04.2022 № 01203000067220000340002			Счет на оплату		Платежное поручение	
	период исполнения этапа контракта	цена этапа исполнения контракта, тыс. руб.	аванс 30,0 % от цены этапа исполнения контракта, тыс. руб.	дата, №	сумма, тыс. руб.	дата, №	сумма, тыс. руб.
1 этап	01.05.2022-30.06.2022	480,29	144,09	-	-	-	-
2 этап	01.07.2022-31.08.2022	3 340,31	1 002,09	06.07.2022 № 11	1 002,09	19.07.2022 № 511442	1 002,09
3 этап	01.09.2022-31.10.2022	7 576,71	2 273,01	06.07.2022 № 12	2 273,01	19.07.2022 № 511441	2 273,01
4 этап	01.11.2022-31.12.2022	4 243,30	1 272,99	06.07.2022 № 13	1 272,99	19.07.2022 № 511443	1 272,99
5 этап	01.01.2023-28.02.2023	6 554,81	1 966,44	01.08.2022 № 22	1 966,44	11.08.2022 № 726867	1 966,44
6 этап	01.03.2023-30.04.2023	5 191,41	1 557,42	01.08.2022 № 23	1 557,42	11.08.2022 № 726866	1 557,42
7 этап	01.05.2023-30.06.2023	11 127,76	3 338,33	01.08.2022 № 24	3 338,33	11.08.2022 № 726868	3 338,33
8 этап	01.07.2023-31.08.2023	12 516,82	3 755,05	01.08.2022 № 25	3 755,05	11.08.2022 № 726869	3 755,05
итого	-	51 031,41	15 309,42	-	15 165,33	-	15 165,33

В рамках данного контракта заказчиком – Администрацией Пограничного муниципального округа не приняты и не оплачены работы ни по I этапу «Подготовка территории строительства» (01.05.2022 – 30.06.2022), ни по II этапу «Общестроительные работы: земляные работы по подготовке территории, устройство фундамента» (01.07.2022 – 31.08.2022).

Так, по I этапу исполнения контракта от 08.04.2022 № 01203000067220000340002 Администрацией Пограничного муниципального округа работы не приняты в связи с тем, что котлован долговременно находился в намоченном состоянии и обветривании, вследствие чего у грунтов снизилась несущая способность. Письменный отказ Администрации Пограничного муниципального округа от подписания акта приемки выполненных работ направлен подрядчику – ООО «СК «Левада» от 11.10.2022 № 7895.

В соответствии с муниципальным контрактом от 08.04.2022 № 01203000067220000340002 Администрацией Пограничного муниципального округа направлены ООО «СК «Левада» претензионные письма: от 01.07.2022 № 6026, от 25.08.2022 № 7092, 04.10.2022 № 7751.

Федеральным автономным учреждением «РосКапСтрой» (далее – ФАУ «РосКапСтрой»), осуществляющим строительный контроль за выполнением работ по строительству сельского Дома культуры в с. Сергеевка Приморского края на основании муниципального контракта от 22.04.2022 № 01203000067220000510001, заключенного с Администрацией Пограничного муниципального округа (далее – контракт от 22.04.2022 № 01203000067220000510001) на сумму 1 046,43 тыс. рублей, в адрес подрядчика – ООО «СК «Левада» направлены предписания о приостановке работ на данном объекте:

от 22.09.2022 № 25-018-22-2 – в связи с намоканием основания фундамента здания, необходимостью замены водонасыщенного грунта и обеспечения проведения мероприятий по водопонижению;

от 29.09.2022 № 25-018-22-3 – в связи с отсутствием откосов котлована;

от 02.11.2022 № 25-018-22-4 – в связи с необходимостью защиты дна котлована от промерзания.

В декабре 2022 года Администрацией Пограничного муниципального округа вышеуказанный контракт расторгнут в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 9 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 13.6 контракта от 08.04.2022 № 01203000067220000340002, на основании постановления от 21.11.2022 № 1525 «Об одностороннем отказе Администрации Пограничного муниципального округа от исполнения муниципального контракта от 08.04.2022 № 01203000067220000340002 на выполнение работ по строительству сельского Дома культуры в с. Сергеевка Приморского края».

Во исполнение требования Администрации Пограничного муниципального округа от 07.12.2022 № 1 подрядчиком – ООО «СК «Левада» авансовые платежи возвращены в полном объеме – в сумме 15 165,33 тыс. рублей (платежное поручение от 16.12.2022 № 618915).

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) Администрацией Пограничного муниципального округа направлено ООО «СК «Левада» требование от 27.11.2023 № 6969 об уплате неустоек за просрочку исполнения обязательств, рассчитанных на дату вступления в силу решения Администрации Пограничного муниципального округа – 02.12.2022, с учетом 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в сумме 313,77 тыс. рублей, в том числе:

по 1 этапу – в сумме 37,22 тыс. рублей за 155 дней просрочки исполнения обязательств (срок окончания выполнения работ – 30.06.2022);

по 2 этапу – в сумме 155,32 тыс. рублей за 93 дня просрочки исполнения обязательств (срок окончания выполнения работ – 31.08.2022);

по 3 этапу – в сумме 121,23 тыс. рублей за 32 дня просрочки исполнения обязательств (срок окончания выполнения работ – 31.10.2022).

Уплата пени подрядчиком – ООО «СК «Левада» не произведена.

В 2023 году строительство сельского Дома культуры в с. Сергеевка осуществлялось подрядчиком – ООО «ПСР» согласно контракту от 23.12.2022 № 268, заключенному с Администрацией Пограничного муниципального округа, на основании распоряжения Администрации Пограничного муниципального округа от 21.12.2022 № 425 «О заключении

муниципального контракта на выполнение работ по строительству сельского Дома культуры в с. Сергеевка с единственным Подрядчиком», в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», абзацем вторым пункта 1, подпунктом г) пункта 2 постановления Правительства Приморского края от 24.03.2022 № 168-пп «О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения нужд Приморского края и порядке их осуществления» (далее – Постановление № 168-пп).

Согласно второму абзацу пункта 1 Постановления № 168-пп заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг (далее – закупка) для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании муниципального правового акта местной администрации муниципального образования Приморского края, изданным в соответствии с Постановлением № 168-пп в порядке, установленном пунктами 2 – 6, 9 Постановления № 168-пп.

Подпунктом г) пункта 2 Постановления № 168-пп предусмотрено, что «закупка осуществляется для обеспечения устойчивого социально-экономического развития муниципального образования Приморского края в условиях санкций при **одновременном соблюдении следующих условий:**

необходимости защиты национальных интересов Российской Федерации в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций;

срочности осуществления закупки (если применение конкурентных способов, требующих затрат времени, нецелесообразно);».

Контракт от 23.12.2022 № 268 заключен сторонами в нарушение вышеуказанных положений Постановления № 168-пп, а именно:

- при отсутствии муниципального правового акта Администрации Пограничного муниципального округа, регламентирующего осуществлять закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), изданного в порядке, установленном пунктами 2 – 6, 9 Постановления № 168-пп, что является нарушением пункта 1 Постановления № 168-пп;

- без одновременного соблюдения условий, предусмотренных подпунктом г) пункта 2 Постановления № 168-пп: заключение контракта от 23.12.2022 № 268 с подрядчиком – ООО «ПСП» без применения конкурентных способов не связано с необходимостью защиты национальных интересов Российской Федерации в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, а вызвано срочностью осуществления закупки в результате расторжения контракта от 08.04.2022 № 01203000067220000340002 в декабре 2022 года, заключенного с предыдущим подрядчиком – ООО «СК «Левада», не исполнившим обязательства в рамках данного контракта, что подтверждено постановлением от 21.11.2022 № 1525 «Об одностороннем отказе Администрации Пограничного муниципального округа от исполнения

муниципального контракта от 08.04.2022 № 01203000067220000340002 на выполнение работ по строительству сельского Дома культуры в с. Сергеевка Приморского края».

Согласно пояснениям от 29.11.2023 № 7025, представленным Администрацией Пограничного муниципального округа в ответ на запрос Контрольно-счетной палаты от 23.11.2023 № 02-01/900, решение о заключении контракта на строительство сельского Дома культуры в с. Сергеевка с единственным подрядчиком – ООО «ПСП» принято в связи с расторжением в одностороннем порядке контракта с ООО «СК «Левада» и невозможностью консервации объекта ввиду отсутствия финансирования на эти цели.


В настоящее время осуществляется приемка объекта заказчиком в соответствии с требованиями, предусмотренными частью 8 контракта от 23.12.2022 № 268. Фото объекта приведены ниже.

Фото 1




Сельский Дом культуры с. Сергеевка
Фото Контрольно-счетной палаты Приморского края 05.12.2023

Фото 2

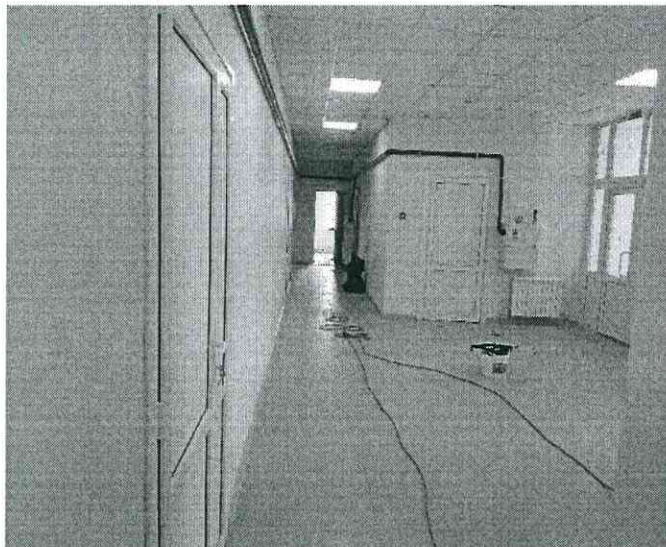

Холл сельского Дома культуры с. Сергеевка

Фото 3

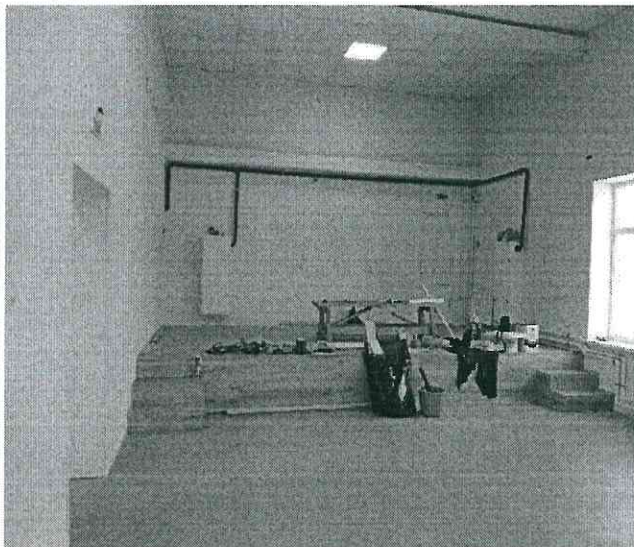

Актный зал сельского Дома культуры со сценой

Фото Контрольно-счетной палаты Приморского края 05.12.2023

3.3. Во всех муниципальных контрактах, заключенных в проверяемом периоде муниципальными образованиями – получателями субсидий с подрядными организациями, предусмотрен гарантийный срок на качество выполненных работ, составляющий от 3 до 5 лет.

Однако при эксплуатации здания Центрального дома культуры, расположенного по адресу: Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 10, кровля которого отремонтирована в 2023 году подрядчиком – ООО «Строй мастер» на основании муниципального контракта от 27.02.2023 № 0320300152723000002 (в редакции дополнительного соглашения от 20.09.2023 № 3), заключенного с Администрацией Ханкайского муниципального округа (далее – контракт от 27.02.2023 № 0320300152723000002), на сумму 3 368,08 тыс. рублей, выявлены дефекты и недостатки, отраженные в актах о выявленных недостатках выполненных работ от 20.10.2023, 07.11.2023, а именно:

нарушения целостности 4 слуховых окон,
полностью разрушено ограждение кровли (219,12 п. м),
нарушена целостность 1 (одной) вертикальной водосточной трубы, водосточных желобов (157,92 п. м) и водосточных воронок (10 штук), в результате чего происходит затекание кирпичных стен фасада.

Учитывая, что вышеуказанные дефекты и недостатки установлены в период гарантийного срока на качество выполненных работ, предусмотренного пунктом 8.2 контракта от 27.02.2023 № 0320300152723000002 – 36 месяцев (3 года) с момента подписания заказчиком документа о приемке (окончательного) выполненных работ, заказчиком – Администрацией Ханкайского муниципального округа в адрес Гаранта – АКБ Трансстройбанк (Акционерное общество)² направлено

²В соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

требование по гарантии от 28.11.2023 № 134 об оплате денежной суммы за ненадлежащее исполнения требований к гарантии качества товаров и услуг, в сумме 209,41 тыс. рублей.

9. Пояснения и замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия.

Акты о контрольных мероприятиях, проведенных в министерстве культуры и архивного дела Приморского края и в Администрации Пограничного муниципального округа от 14.12.2023, подписаны без пояснений и замечаний.

10. Выводы.

1. В Приморском крае основным источником, обеспечивающим реализацию Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р, является государственная программа Приморского края «Развитие культуры Приморского края», утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 936-па (далее – ГП «Развитие культуры Приморского края»), в состав которой входит подпрограмма «Поддержка культуры в Приморском крае».

1.1. Паспортом РП «Культурная среда»³ предусмотрены результаты регионального проекта для получения гражданами дополнительных возможностей для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкого доступа к культурным ценностям – к концу 2024 года построено (капитально отремонтировано) 30 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (пункт 7 раздела I Паспорта РП «Культурная среда»), что на 10 объектов больше чем запланировано ГП «Развитие культуры Приморского края» (20 объектов)⁴.

2. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности осуществляется за счет бюджетных средств, предоставляемых муниципальным образованиям министерством культуры и архивного дела Приморского края (далее – Министерство) в виде субсидий, в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на

муниципальных нужд» подрядчиком – ООО «Строй мастер» в качестве обеспечения гарантийных обязательств представлена независимая гарантия от 14.07.2023 № ЭГ-1171588/23, номер реестровой записи реестра независимых гарантий 06B32530007446230012, выданную АКБ «Трансстройбанк» (Акционерное общество) (далее – Гарант), сроком действия по 30.08.2026.

³Паспорт регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Приморский край)» утвержден Губернатором Приморского края от 31.01.2023.

⁴Разделом 3 ГП «Развитие культуры Приморского края» в рамках подпрограммы «Поддержка культуры в Приморском крае» предусмотрена реализация мероприятия регионального проекта «Культурная среда» – развитие сети учреждений культурно-досугового типа с ожидаемыми результатами: к 2026 году будет отремонтировано 17 объектов культурно-досугового типа, к 2024 году будет построено и введено в эксплуатацию 2 объекта культуры, к 2025 году будет построен и введен в эксплуатацию 1 объект культуры.

софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности – Приложение № 25 к ГП «Развитие культуры Приморского края» (далее – Порядок).

2.1. В соответствии с Порядком на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в краевом бюджете предусмотрен объем субсидий:

на 2022 год: Законом Приморского края от 21.12.2021 № 31-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» – в сумме 181 597,98 тыс. рублей, в том числе 101 197,5 тыс. рублей (55,7 %) составляют средства федерального бюджета;

на 2023 год: Законом Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»⁵ – в сумме 232 518,86 тыс. рублей, в том числе 143 176,0 тыс. рублей (61,6 %) составляют средства федерального бюджета.

За проверяемый период освоено субсидий в сумме 310 684,71 тыс. рублей, в том числе:

за 2022 год – 181 553,77 тыс. рублей, или на 99,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (181 597,98 тыс. рублей);

за 9 месяцев 2023 года – 129 130,94 тыс. рублей, или на 55,54 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (232 518,86 тыс. рублей).

3. При проверке результативности использования субсидий установлено, что показатели, установленные Министерством в соглашениях, заключенных с муниципальными образованиями – получателями субсидий, достигнуты следующим образом: из 27 объектов за 2022 год и 9 месяцев 2023 года всего отремонтировано и построено 23 объекта, начато строительство 1 объекта, в том числе:

за 2022 год: отремонтированы 12 учреждений культурно-досугового типа, расположенные в сельской местности; начато строительство 2 зданий сельских Домов культуры в с. Сергеевка Пограничного муниципального округа и с. Светлогорье Пожарского муниципального округа, срок сдачи которых – 2023 год.

за 9 месяцев 2023 года: произведен капитальный ремонт 9 объектов культуры из 12 объектов, завершается строительство 2 сельских домов культуры в с. Сергеевка Пограничного муниципального округа (осуществляется приемка объекта) и в с. Светлогорье Пожарского муниципального округа (получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 11.12.2023 № 25-15-03-2023), начато строительство Дома культуры в Артемовском городском округе (срок сдачи 2024 год).

3.1. В проверяемом периоде нецелевого использования субсидий на развитие сети учреждений культурно-досугового типа не установлено.

⁵ С изменениями, внесенными Законом Приморского края от 25.10.2023 № 448-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

При этом установлены факты авансирования ремонтных и строительных работ в нарушение действующего Порядка, а именно:

- в нарушение части 4.1 Порядка пунктом 2.8 муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту сцены большого зала ДК Пожарского МР (пгт Лучегорск, ул. Общественный Центр, 2), заключенного заказчиком – МБУ «ДК Пожарского МР» с подрядчиком – ООО «Стройбыт» от 04.07.2022 № 5/2022, предусмотрен и фактически выплачен аванс ООО «Стройбыт» в размере 40 % от цены контракта, или 9 013,10 тыс. рублей, при том что авансирование данных работ Порядком не предусмотрено;

- в нарушение части 4.2 Порядка пунктом 3.6 контракта от 23.12.2022 № 268, заключенного Администрацией Пограничного муниципального округа с подрядчиком – ООО «ПСП», предусмотрен авансовый платеж на строительство сельского Дома культуры в с. Сергеевка в размере 40 % от цены контракта, или 21 387,37 тыс. рублей, что на 10 %, или на 5 346,84 тыс. рублей превышает допустимый размер авансирования (не более 30 %).

3.2. Контракт от 23.12.2022 № 268 на строительство сельского Дома культуры в с. Сергеевка заключен Администрацией Пограничного муниципального округа с подрядчиком – ООО «ПСП» в нарушение положений постановления Правительства Приморского края от 24.03.2022 № 168-пп «О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения нужд Приморского края и порядке их осуществления» (далее – Постановление № 168-пп), а именно:

- в нарушение пункта 1 Постановления № 168-пп данный контракт заключен при отсутствии муниципального правового акта Администрации Пограничного муниципального округа, регламентирующего осуществлять закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), изданного в порядке, установленном пунктами 2 – 6, 9 Постановления № 168-пп;

- в нарушение подпункта г) пункта 2 Постановления № 168-пп Администрацией Пограничного муниципального округа произведена закупка у единственного поставщика – ООО «ПСП» (ИКЗ 223252500703125250100101470014120414) без соблюдения условия: необходимость защиты национальных интересов Российской Федерации в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. Строительство сельского Дома культуры в с. Сергеевка осуществляется в рамках Регионального проекта «Культурная среда», входящего в состав Национального проекта «Культура».

3.3. В 2022 году подрядными организациями осуществлялись ремонтные и строительные работы на объектах с нарушением сроков, установленных муниципальными контрактами, от 1 дня (4 этап капитального ремонта клуба с. Улитовка Уссурийского городского округа, подрядчик ООО «ОКЕАН ЛОДЖИСТИК») до 280 дней (строительство

сельского Дома культуры в с. Сергеевка Пограничного муниципального округа, подрядчик ООО «СК «Левада»).

За нарушение сроков выполнения работ подрядчиком предъявлены пени на общую сумму 409,42 тыс. рублей, из них оплачено 44,20 тыс. рублей. До настоящего времени не произведена уплата пени:

в сумме 51,45 тыс. рублей – ИП Учайкиной (требование от 20.12.2022 № 279) за 95 дней просрочки капитального ремонта крыльца Дома культуры Пожарского муниципального округа (контракт от 17.06.2022 № 7/2022);

в сумме 313,77 тыс. рублей – ООО «Левада» (требование от 27.11.2023 № 6969) за просрочку выполнения I – III этапов работ по строительству сельского Дома культуры в с. Сергеевка, составляющую 280 дней (контракт от 08.04.2022 № 01203000067220000340002).

11. Предложения (рекомендации):

11.1. Министерству культуры и архивного дела Приморского края привести в соответствие ожидаемые результаты от реализации мероприятия регионального проекта «Культурная среда – развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в ГП «Развитие культуры Приморского края» и РП «Культурная среда».

11.2. По результатам контрольного мероприятия направить:

- представление об устранении недостатков – в Администрацию Пограничного муниципального округа Приморского края, в министерство культуры и архивного дела Приморского края;

- материалы контрольного мероприятия в части нарушений требований законодательства в сфере закупок, допущенных Администрацией Пограничного муниципального округа – в прокуратуру Приморского края⁶;

- отчет о контрольном мероприятии, копию представления – в Законодательное Собрание Приморского края и Губернатору Приморского края.

Руководитель контрольного мероприятия:
Аудитор Контрольно-счетной палаты
Приморского края



В.В. Плыгунова

⁶ В связи с истечением давности привлечения к административной ответственности, предусмотренной статьей 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Алеутская, д. 45а, г. Владивосток, 690091
Тел.: (423) 243-32-60, факс: (423) 243-32-60
E-mail: pk@ksp25.ru
ОКПО 38557372, ОГРН 1122540000670
ИНН/КПП 2540178592/254001001

Главе
Администрации Пограничного
муниципального округа
Приморского края

Александрову О.А.

27.12.2023 № 02-01/998

На № _____ от _____

Представление

В соответствии с пунктом 2.5.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2023 год, распоряжением Контрольно-счетной палаты Приморского края от 30.11.2023 № 32/1 «О проведении контрольного мероприятия в Администрации Пограничного муниципального округа Приморского края» Контрольно-счетной палатой Приморского края в Администрации Пограничного муниципального округа Приморского края проведено контрольное мероприятие «Проверка результативности и целевого расходования бюджетных средств на развитие сети учреждений культурно-досугового типа», за 2022 год и истекший период 2023 года», по результатам которого установлены следующие нарушения:

1) при заключении муниципального контракта от 23.12.2022 № 268 с ООО «Полимерстройпроект» на строительство сельского Дома культуры в с. Сергеевка, допущены нарушения положений Постановления Правительства Приморского края от 24.03.2022 № 168-пп «О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения нужд Приморского края и порядке их осуществления» (далее – Постановление № 168-пп), а именно:

- пункта 1 – контракт от 23.12.2022 № 268 заключен при отсутствии муниципального правового акта Администрации Пограничного муниципального округа, регламентирующего осуществлять закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), изданного в порядке, установленном пунктами 2 – 6, 9 Постановления № 168-пп;

- подпункта г) пункта 2 – закупка у единственного поставщика – ООО «ПСР» (ИКЗ 223252500703125250100101470014120414) произведена без соблюдения условия: необходимость защиты национальных интересов Российской Федерации в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций;

2) в нарушение части 4.2 Порядка предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности – Приложение № 25 к государственной программе Приморского края «Развитие культуры Приморского края», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 936-па, пунктом 3.6 контракта от 23.12.2022 № 268 предусмотрен авансовый платеж на строительство сельского Дома культуры в с. Сергеевка в размере 40 % от цены контракта (53 468,43 тыс. рублей), или 21 387,37 тыс. рублей, тогда как следовало предусмотреть аванс в размере 30 % от цены контракта, или 16 040,53 тыс. рублей.

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 16 Закона Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ «О Контрольно-счетной палате Приморского края» Администрации Пограничного муниципального округа Приморского края, предлагается принять меры, направленные на недопущение в дальнейшей деятельности выявленных нарушений.

Представление направляется в соответствии с решением коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края (протокол от 26.12.2023 № 19).

В соответствии с частью 3 статьи 16 Закона Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ «О Контрольно-счетной палате Приморского края» о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах, необходимо уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату Приморского края, с приложением документов, подтверждающих принятие мер, направленных на недопущение аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности (копия приказа о возложении обязанности на должностное лицо по обеспечению контроля за осуществлением закупочной деятельности, и т.д.), в течение 30 дней со дня получения представления.

И.о. председателя



В.В. Волкова



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Алеутская, д. 45а, г. Владивосток, 690091
Тел.: (423) 243-32-60, факс: (423) 243-32-60
E-mail: pk@ksp25.ru
ОКПО 38557372, ОГРН 1122540000670
ИНН/КПП 2540178592/254001001

Заместителю Председателя
Правительства Приморского края
– министру культуры и архивного
дела Приморского края

Бронниковой Е.Н.

27.12.2023 № 02-01/999

На № _____ от _____

Представление

В соответствии с пунктом 2.5.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2023 год, распоряжением Контрольно-счетной палаты Приморского края от 25.09.2023 № 32 «О проведении контрольного мероприятия в министерстве культуры и архивного дела Приморского края» Контрольно-счетной палатой Приморского края в министерстве культуры и архивного дела Приморского края проведено контрольное мероприятие «Проверка результативности и целевого расходования бюджетных средств на развитие сети учреждений культурно-досугового типа», за 2022 год и истекший период 2023 года», по результатам которого установлен следующий недостаток:

- разделом 3 государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 936-па (далее – ГП «Развитие культуры Приморского края») в рамках подпрограммы «Поддержка культуры в Приморском крае» предусмотрена реализация мероприятия регионального проекта «Культурная среда» – развитие сети учреждений культурно-досугового типа с ожидаемыми результатами: к 2026 году – будет отремонтировано 17 объектов культурно-досугового типа; к 2024 году – будет построено и введено в эксплуатацию 2 объекта культуры; к 2025 году – будет построен и введен в эксплуатацию 1 объект культуры, т.е. общее количество построенных, отремонтированных (реконструированных) объектов – 20 объектов.

При этом Паспортом регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Приморский край)», утвержденным Губернатором Приморского края от 31.01.2023 (далее – РП («Культурная среда»), предусмотрены результаты регионального проекта для получения гражданами дополнительных возможностей для творческого развития и

самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкого доступа к культурным ценностям – к концу 2024 года (с 01.01.2018) построено (капитально отремонтировано) 30 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (пункт 7 раздела I Паспорта РП «Культурная среда»), т.е. на 10 объектов больше чем запланировано ГП «Развитие культуры Приморского края».

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 16 Закона Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ «О Контрольно-счетной палате Приморского края» министерству культуры и архивного дела Приморского края, предлагается принять меры, направленные на устранение выявленного недостатка.

Представление направляется в соответствии с решением коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края (протокол от 26.12.2023 № 19).

В соответствии с частью 3 статьи 16 Закона Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ «О Контрольно-счетной палате Приморского края» о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах, необходимо уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату Приморского края (с приложением документов, подтверждающих исполнение) в течение 30 дней со дня получения представления.

И.о. председателя



В.В. Волкова
