



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Алеутская, д. 45а, г. Владивосток, 690091
Тел.: (423) 243-32-60, факс: (423) 243-32-60
E-mail: pk@ksp25.ru
ОКПО 38557372, ОГРН 1122540000670
ИНН/КПП 2540178592/254001001

Председателю
Законодательного собрания
Приморского края

Волошко А.А.

30.06.2026 № 05-12/658

На № _____ от _____

О направлении отчета об
экспертно-аналитическом мероприятии

Уважаемый Антон Анатольевич!

Контрольно-счетная палата Приморского края в соответствии с частью 4 статьи 10 Закона Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ «О Контрольно-счетной палате Приморского края» направляет отчет об экспертно-аналитическом мероприятии "Оценка эффективности реализации регионального проекта "Спорт – норма жизни" в рамках национального проекта "Демография" (далее – мероприятие), проведенного согласно плану работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2026 год.

По результатам мероприятия установлено следующее.

"Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей" – одно из приоритетных направлений в сфере социально-демографической политики Российской Федерации, закрепленное Указами Президента РФ от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Для достижения указанной национальной цели разработана и реализуется стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, которая определяет приоритеты государственной политики в сфере физической культуры и спорта, основные направления и механизмы, способствующие созданию условий для вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом, а также сохранению конкурентоспособности российского спорта и формированию базы для эффективной работы системы российского спорта при различных сценариях развития геополитической и экономической ситуации в стране.

Для реализации установленных целей национального развития разработаны и реализуются национальные проекты.

В рамках национального проекта "Демография" утвержден федеральный проект "Спорт – норма жизни".

Цель федерального проекта – доведение к концу 2024 года до 57,8 % и к 2030 году до 70 % доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры, а также повышение к концу 2024 года до 62 % и к 2030 году до 74 % уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями.

Показатели федерального проекта декомпозированы на уровень субъектов РФ. Паспортом федерального проекта для Приморского края установлены следующие целевые ориентиры: повышение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 59,9 % к концу 2024 года, а также на повышение в регионе уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности с 33,5 % в 2019 году до 62,1 % к концу 2024 года.

Во исполнение Указов Президента в соответствии с федеральным проектом в Приморском крае реализуется региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" (краткое наименование "Спорт – норма жизни") (далее – региональный проект, РП "Спорт – норма жизни", Проект).

Срок реализации регионального проекта: с 01.01.2019 по 31.12.2024.

Региональный проект направлен на увеличение доли населения Приморского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 39,8 % в 2019 году до 59,9 % к концу 2024 года, а также на повышение в регионе уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности с 33,5 % в 2019 году до 62,1 % к концу 2024 года.

Мероприятием установлено, что установленные региональным проектом результаты достигнуты частично.

В 2023 и 2024 годах достигнуты результаты по следующим направлениям:

- поставка нового спортивного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва,

- оказание государственной поддержки организациям, входящим в систему спортивной подготовки,
- поставка комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля).

Показатели результата "строительство и ввод в эксплуатацию объектов спорта региональной (муниципальной) собственности", предусматривающего паспортом на 2023 год строительство 5 объектов спортивной инфраструктуры, полностью не достигнуты в двух отчетных периодах.

В 2023 году установленный плановый показатель результата – "крытый тренировочный каток в г. Находка" введен в эксплуатацию" – не выполнен. Техническая готовность объекта на 01.01.2024 составляла 99 %. Объект введен в эксплуатацию 24.02.2024.

В 2024 году в связи с секвестированием средств федерального бюджета объект "Крытый тренировочный каток в г. Дальнегорске" исключен из паспорта РП на 2024 год.

Установленный на 2024 год результат – ввод в эксплуатацию объектов "крытый футбольный манеж в г. Владивостоке", "физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Партизанске", "ледовый каток в пгт. Кавалерово" – не достигнут согласно Отчету на 2024 год.

В связи с завершением регионального проекта "Спорт – норма жизни" в 2024 году, значительная часть работ, направленных на завершение недостроенных объектов и их финансирование продолжится в рамках нового федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта", что свидетельствует о системных проблемах в планировании, организации и контроле за ходом строительства.

Отчет об экспертно-аналитическом мероприятии утвержден коллегией Контрольно-счетной палаты Приморского края (протокол от 25.06.2026 № 14) направлен Губернатору Приморского края, в министерство физической культуры и спорта Приморского края.

Приложение: Отчет об экспертно-аналитическом мероприятии с приложениями на 91 л. в 1 экз.

Ильиченко Е.В.

Председатель

Д.А. Виноградов

Д.А. Виноградов

ОТЧЕТ
об экспертно-аналитическом мероприятии
"Оценка эффективности реализации регионального проекта
"Спорт – норма жизни" в рамках национального проекта "Демография"

(утвержден коллегией Контрольно-счетной палаты Приморского края,
протокол от 25.06.2025 № 14)

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 1.25 Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2026 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Приморского края от 02.12.2025 № 80-П, распоряжение Контрольно-счетной палаты Приморского края от 13.04.2026 № 18 "О проведении экспертно-аналитического мероприятия в министерстве физической культуры и спорта Приморского края".

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: исполнение законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, Приморского края, а также иных документов, регламентирующих реализацию регионального проекта "Спорт – норма жизни" в рамках национального проекта "Демография" в 2023–2025 годах, включая оценку эффективности использования краевых бюджетных средств, направленных на создание и модернизацию спортивной инфраструктуры, ее оснащение спортивным оборудованием и подготовку спортивного резерва в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни".

3. Цель экспертно-аналитического мероприятия: оценить эффективность и результативность использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по созданию и модернизации спортивной инфраструктуры, ее оснащению спортивным оборудованием и подготовке спортивного резерва в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" в рамках национального проекта "Демография".

4. Объекты экспертно-аналитического мероприятия:
министерство физической культуры и спорта Приморского края.

5. Проверяемый период: 2023–2025 годы.

6. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:
с 13.04.2026 по 30.06.2026.

7. Результаты экспертно-аналитического мероприятия

7.1. Анализ нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края, распорядительных и иных документов, обосновывающих и регламентирующих реализацию регионального проекта

7.1.1. "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей" – одно из приоритетных направлений в сфере социально-демографической политики Российской Федерации, закрепленное Указами Президента РФ от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024

года", от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"¹ (далее – Указы Президента).

Для достижения указанной национальной цели разработана и реализуется стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года² (далее – Стратегия РФ), которая определяет приоритеты государственной политики в сфере физической культуры и спорта, основные направления и механизмы, способствующие созданию условий для вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом, а также сохранению конкурентоспособности российского спорта и формированию базы для эффективной работы системы российского спорта при различных сценариях развития геополитической и экономической ситуации в стране.

Стратегия РФ направлена на формирование и реализацию на федеральном, региональном и муниципальном уровнях скоординированной государственной политики в сфере физической культуры и спорта, являясь основой для разработки государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации и иных документов в указанной сфере.

Индикаторами достижения целей Стратегии РФ являются среди прочих: к 2030 году увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в общей численности граждан, не имеющих противопоказаний и ограничений для занятий физической культурой и спортом), до 70 %;

к 2030 году повышение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 74 %.

Для реализации установленных целей национального развития разработаны и реализуются национальные проекты.

7.1.2. Достижение указанной национальной цели обеспечивается реализацией национального проекта "Демография", ключевым целевым показателем которого является увеличение к 2030 году до 70 % доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

В рамках национального проекта "Демография" утвержден федеральный проект "Спорт – норма жизни"³ (далее – федеральный проект).

Цель федерального проекта – доведение к концу 2024 года до 57,8 % и к 2030 году до 70 % доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, в том числе вовлечения в подготовку и

¹ Утратил силу с 07.05.2024 в связи с изданием Указа Президента РФ от 07.05.2024 № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

² Утверждена распоряжением Правительства РФ от 24.11.2020 № 3081-р.

³ Полное наименование: "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва".

выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры, а также повышение к концу 2024 года до 62 % и к 2030 году до 74 % уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями.

Показатели федерального проекта декомпозированы на уровень субъектов РФ. Паспортом федерального проекта для Приморского края установлены следующие целевые ориентиры: повышение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 59,9 % к концу 2024 года, а также на повышение в регионе уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности с 33,5 % в 2019 году до 62,1 % к концу 2024 года.

Достижение цели возможно путем решения задачи по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

Для решения задачи по повышению уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой федеральным проектом предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета на создание объектов спорта региональной (муниципальной) собственности, а также плоскостных спортивных сооружений для тестирования уровня спортивной подготовленности населения. Целям формирования эффективной системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд отвечают результаты федерального проекта по вовлечению в соревновательную деятельность дополнительного контингента занимающихся, а также по восстановлению до нормативного состояния спортивной инфраструктуры спортивных школ олимпийского резерва.

7.1.3. Согласованность ключевых направлений развития Приморского края с приоритетами развития Российской Федерации обеспечивает Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 2030 года⁴ (далее – Стратегия ПК).

Стратегией ПК по направлению "Развитие сферы физической культуры и спорта" определена цель – создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности приморских спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях, а также успешное проведение на территории Приморского края крупнейших физкультурных и спортивных мероприятий.

Достижение указанной цели реализуется путем решения ряда задач, среди которых:

обеспечение доступных условий и равных возможностей для занятий физической культурой и спортом для граждан всех возрастных категорий, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,

⁴ Утверждена постановлением Администрации Приморского края от 28.12.2018 № 668-па.

формирование системы мотивации различных категорий населения к физическому развитию и спортивному образу жизни;

развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы в отрасли физической культуры и спорта, совершенствование подхода к созданию и управлению спортивной инфраструктурой, в том числе на этапах планирования, проектирования и эксплуатации.

Целевым ориентиром Стратегии ПК определена доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом: 56,2 % по итогам 2024 года и 70 % к 2030 году.

7.1.4. Во исполнение Указов Президента в соответствии с федеральным проектом в Приморском крае реализуется региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" (краткое наименование "Спорт – норма жизни") (далее – региональный проект, РП "Спорт – норма жизни", Проект).

Срок реализации регионального проекта: с 01.01.2019 по 31.12.2024.

В 2023 году паспорт Проекта утвержден Губернатором Приморского края 31.01.2023 (редакции от 27.04.2023, 15.06.2023, 01.08.2023, 15.09.2023, 19.12.2023)⁵.

В 2024 году паспорт Проекта утвержден Губернатором Приморского края 31.01.2024 (редакции от 25.03.2024, 22.05.2024, 25.10.2024, 28.12.2024)⁶.

Региональный проект направлен на увеличение доли населения Приморского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 39,8 % в 2019 году до 59,9 % к концу 2024 года, а также на повышение в регионе уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности с 33,5 % в 2019 году до 62,1 % к концу 2024 года⁷ (целевые показатели и индикаторы регионального проекта отражены в таблице 1).

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Период, год			2025 (справочно)
			2019 базовое значение	2023	2024	
1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	39,8	56,1	59,9	58,5
2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	%	33,5	55,0	62,1	64,1

Для Приморского края решение поставленных задач является актуальным, поскольку обеспеченность населения Приморского края спортивными объектами характеризуется самыми низкими значениями среди субъектов Дальневосточного федерального округа. В крае наблюдается недостаточность спортивной инфраструктуры, имеющаяся материальная база

⁵ Далее – паспорт РП на 2023 год.

⁶ Далее – паспорт РП на 2024 год.

⁷ Раздел 2 "Показатели регионального проекта" паспорта Проекта (в ред. от 28.12.2024).

имеет высокий физический износ, большая часть спортивных объектов нуждается в приведении в нормативное состояние, в отдельных населенных пунктах отсутствуют спортивные объекты, что не обеспечивает равных возможностей для занятия физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения⁸.

Для достижения целевых показателей регионального проекта его реализация в проверяемом периоде осуществлялась по следующим направлениям:

- поставка нового спортивного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва;
- оказание государственной поддержки организациям, входящим в систему спортивной подготовки;
- поставка комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля);
- строительство и ввод в эксплуатацию объектов спорта региональной (муниципальной) собственности.

7.1.5. Согласно паспортам РП на 2023 и 2024 годы, РП "Спорт – норма жизни" имеет связь с государственной программой Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2020–2027 годы"⁹ (далее – государственная программа ПК).

Ответственным исполнителем государственной программы ПК является министерство физической культуры и спорта Приморского края (далее – министерство спорта ПК), соисполнитель – министерство строительства Приморского края (далее – министерство строительства ПК). В соответствии с пунктом 4.3 Порядка № 256-пп соисполнители обеспечивают совместно с участниками государственной программы реализацию включенных в государственную программу региональных проектов.

Согласно разделу 3 Паспорта государственной программы ПК¹⁰ в структуре регионального проекта определены следующие мероприятия (сведения отражены в таблице 2).

Таблица 2

№ п/п	Наименование мероприятий	Краткое описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий	Связь мероприятия с показателями государственной программы
1.1.1.	Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни"	строительство до 2026 года 2 крытых ледовых катков, 1 ФОКа, 1 футбольного манежа в целях создания условий для развития хоккея, футбола, подготовки спортивного резерва и развития массового спорта в Приморском крае в соответствии с перечнем, установленным в приложении N 1 к Паспорту государственной программы ¹¹	уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

⁸ На основе данных подраздела 1.1. Оценка текущего состояния сферы физической культуры и спорта в Приморском крае Паспорта (приложение № 1 к государственной программе ПК).

⁹ Утверждена постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па.

¹⁰ В редакции постановления Правительства Приморского края от 28.12.2024 № 952-пп.

¹¹ В редакции постановления Правительства Приморского края от 27.12.2022 № 909-пп: "строительство до 2025 года 3 крытых ледовых катков, 1 ФОКа, 1 футбольного манежа в целях создания условий для развития хоккея, футбола, подготовки спортивного резерва и развития массового спорта в Приморском крае".

№ п/п	Наименование мероприятий	Краткое описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий	Связь мероприятия с показателями государственной программы
1.1.2.	Мероприятия по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни"	создание в 2023 году 2 спортивных площадок ГТО	уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности; доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
1.1.3.	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни"	приобретение в 2023 - 2024 годах спортивного инвентаря и оборудования для улучшения качества спортивной подготовки, улучшение материально-технической спортивной базы 1 учреждения спортивной направленности, осуществляющего подготовку спортивного резерва	доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
1.1.4.	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	финансовая поддержка 18 организаций, осуществляющих спортивную подготовку спортсменов по базовым видам спорта в 2023–2024 годах	доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

В соответствии с пунктом 2.3 и 2.4 Порядка разработки и реализации государственных программ Приморского края¹², региональные проекты и (или) мероприятия региональных проектов встраиваются в государственную программу в качестве ее структурных элементов и группируются по подпрограммам государственной программы.

В 2023–2024 годах мероприятия РП "Спорт – норма жизни" реализовывались в рамках подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Приморском крае" государственной программы ПК.

Стоит отметить, что в ходе анализа выявлено значительное различие на уровне устанавливаемых ориентиров: в Стратегии ПК¹³ и в государственной программе ПК¹⁴ индикатор показателя "Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом" (таблица 3) на конец 2024 года (56,2 %) не увязан со значением данного показателя, установленного в паспортах РП на 2024 год¹⁵ и федерального проекта, что не соответствует требованиям Порядка № 256-пп.

Таблица 3

Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения показателей по годам			
		2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)
1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом					
Стратегия ПК	%	56,10	56,20	58,50	70,00
Государственная программа ПК	%	56,10	56,20	58,50	70,00
Региональный проект	%	56,10	59,90	58,50	-
2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности					

¹² Утверждено постановлением Правительства Приморского края от 20.04.2022 № 256-пп (далее – Порядок № 256-пп).

¹³ Таблица 1.13 "Значения показателей достижения цели стратегии по развитию сферы физической культуры и спорта" Стратегии ПК (в ред. постановления Правительства Приморского края от 04.12.2024 № 831-пп).

¹⁴ Раздел 2 "Показатели государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" Паспорта (приложение № 1 к государственной программе ПК (ред. от 28.12.2024).

¹⁵ Раздел 2 "Показатели регионального проекта" Паспорта РП на 2024 год (ред. от 28.12.2024).

Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения показателей по годам			
		2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)
Стратегия ПК	%	55,00	62,10	63,00	68,00
Государственная программа ПК	%	55,00	62,10	64,10	68,00
Региональный проект	%	55,00	62,10	64,10	-

7.1.6. Реализация мероприятий регионального проекта осуществляется в том числе посредством осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Приморского края в соответствии с решением, принятым в порядке, установленном постановлением Правительства Приморского края от 30.06.2020 № 581-пп "О формировании адресной инвестиционной программы Приморского края" (далее – Порядок № 581-пп).

Исходя из положений, установленных пунктами 1.2 и 1.11 Порядка № 581-пп, адресная инвестиционная программа Приморского края (далее – АИП) устанавливает распределение между органами исполнительной власти Приморского края – главными распорядителями средств краевого бюджета, ответственными за финансирование (софинансирование) соответствующего объекта, предусмотренных в законе Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, бюджетных ассигнований, в том числе на строительство, которое планируется осуществлять полностью или частично (с привлечением средств федерального, местного бюджетов и (или) иных источников) из краевого бюджета. АИП на очередной финансовый год и плановый период утверждается постановлением Правительства Приморского края ежегодно после принятия Закона Приморского края о краевом бюджете не позднее 31 декабря текущего финансового года и действует с 1 января по 31 декабря финансового года, на который она утверждена.

Постановлениями Правительства Приморского края на 2023–2024 годы утверждены АИП:

от 21.12.2022 № 890-пп – АИП на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее – АИП на 2023 год);

от 27.12.2023 № 956-пп – АИП на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (далее – АИП на 2024 год).

В рамках АИП запланирована реализация мероприятий Проекта:

"Строительство крытого тренировочного катка в г. Находка, софинансируемого за счет средств федерального бюджета"¹⁶ на 2023–2024 годы. Площадь объекта: 3 597,40 кв. м;

"Строительство крытого футбольного манежа в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы"¹⁷ на 2023–2024 годы. Площадь объекта: 15 565,37 кв. м;

¹⁶ Пункты 6.7.6, 5.7.8 таблицы 1 действующих редакций АИП соответственно на 2023 год и 2024 год.

¹⁷ Пункты 6.7.7, 5.7.10 таблицы 1 действующих редакций АИП соответственно на 2023 год и 2024 год.

"Строительство ледового катка в пгт Кавалерово, софинансируемого за счет средств федерального бюджета"¹⁸ на 2023–2024 годы. Предполагаемая мощность объекта: 150 посадочных мест;

"Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске, в том числе проектно-изыскательские работы"¹⁹ на 2023–2024 годы. Площадь объекта: 3 597,40 кв. м;

"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы, софинансируемые за счет средств федерального бюджета"²⁰ на 2023–2024 годы. Площадь объекта: 3 990,70 кв. м.

7.2. Анализ объема и структуры бюджетных средств

7.2.1. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятий

7.2.1.1. В целях реализации регионального проекта Министерством спорта Российской Федерации с Приморским краем на срок до 31.12.2024 заключено Соглашение о реализации регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Приморский край)" на территории Приморского края от 01.02.2019 № 777-2019-P50075-1 (далее – соглашение о реализации РП от 01.02.2019).

Предметом соглашения о реализации РП от 01.02.2019²¹ является организация взаимодействия сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Приморском крае и муниципальных образованиях, расположенных на территории Приморского края.

7.2.1.2. В анализируемом периоде региональный проект реализовывался по 4 направлениям с запланированным согласно паспорту Проекта²² общим объемом финансового обеспечения на 2023–2024 годы в сумме 1 107 775,32 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 615 551,70 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 492 223,62 тыс. рублей), в том числе:

на 2023 год в сумме 771 413,60 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 536 400,60 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 235 013,01 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 336 361,72 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 79 151,10 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 257 210,62 тыс. рублей.

¹⁸ Пункты 6.7.11, 5.7.13 таблицы 1 действующих редакций АИП соответственно на 2023 год и 2024 год.

¹⁹ Пункты 6.7.9, 5.7.11 таблицы 1 действующих редакций АИП соответственно на 2023 год и 2024 год.

²⁰ Пункты 6.7.10, 5.7.12 таблицы 1 действующих редакций АИП соответственно на 2023 год, 2024 год.

²¹ К соглашению о реализации РП от 01.02.2019 года в анализируемом периоде заключены дополнительные соглашения от 15.12.2022, 19.01.2023, 17.07.2023, 13.12.2023, 12.09.2024, 23.12.2024.

²² Раздел 5 "Финансовое обеспечение реализации регионального проекта" паспорта Проекта (в ред. от 28.12.2024).

Информация о финансовом обеспечении реализации регионального проекта в 2023–2024 годы в соответствии с паспортами Проекта представлена в таблице Приложения 1.

7.2.1.3. Между Министерством спорта Российской Федерации и Правительством Приморского края заключены соглашения и дополнительные соглашения к ним о предоставлении из федерального бюджета в 2023 и 2024 годах бюджету Приморского края субсидий (Приложение 2):

- на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки (соглашение от 05.02.2019 № 777-08-2019-043) в 2023 году в сумме 9 134,90 тыс. рублей (в ред. дополнительного соглашения от 16.12.2022 № 777-08-2019-043/5), в 2024 году в сумме 8 485,90 тыс. рублей (в ред. дополнительного соглашения от 25.12.2023 № 777-08-2019-043/6). Уровень софинансирования расходного обязательства Приморского края из федерального бюджета в 2023 году составил 98 %, в 2024 году – 84 %;

- на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (соглашение от 08.02.2019 № 777-08-2019-200) в 2023 году в сумме 4 576,60 тыс. рублей (в ред. дополнительного соглашения от 16.12.2022 № 777-08-2019-200/11). Уровень софинансирования расходного обязательства Приморского края из федерального бюджета составил 98 %;

- на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние (соглашение от 17.12.2019 № 777-09-2020-059) в 2023 году в сумме 3 746,30 тыс. рублей (в ред. дополнительного соглашения от 20.12.2022 № 777-09-2020-059/8), в 2024 году в сумме 3 006,60 тыс. рублей (в ред. дополнительного соглашения от 25.12.2023 № 777-09-2020-059/9). Уровень софинансирования расходного обязательства Приморского края из федерального бюджета составил 98 %;

- на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (соглашение от 23.12.2019 № 777-09-2020-091):

в 2023 году в первоначальной редакции в сумме 505 141,00 тыс. рублей (в ред. дополнительного соглашения от 28.12.2022 № 777-09-2020-091/8). Дополнительным соглашением от 31.03.2023 № 777-09-2020-091/10 объем субсидии был увеличен и составил 518 942,80 тыс. рублей (+13 801,80 тыс. рублей);

в 2024 году в сумме 139 359,10 тыс. рублей (в ред. дополнительного соглашения от 25.12.2023 № 777-09-2020-091/11). В течение 2024 года объем субсидии корректировался 3 раза и составил 22 045,21 тыс. рублей

(-117 313,89 тыс. рублей) в редакции дополнительного соглашения от 16.12.2024 № 777-09-2020-091/15.

Уровень софинансирования расходного обязательства Приморского края из федерального бюджета составил 98 %.

Нормативы софинансирования расходных обязательств Приморского края при реализации регионального проекта "Спорт – норма жизни" из федерального бюджета, установленные соглашениями с Министерством спорта Российской Федерации, не превышают предельный уровень софинансирования, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 18.10.2019 № 2468-р²³ (Приморский край – 98 %).

7.2.2. Оценка соответствия объемов расходов на реализацию мероприятий регионального проекта утвержденным бюджетным назначениям

7.2.2.1. Законами Приморского края о краевом бюджете на 2023²⁴ и 2024²⁵ годы бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт – норма жизни)" утверждены главным распорядителям бюджетных средств – министерству спорта ПК (ГРБС 764) и министерству строительства ПК (ГРБС 775).

Законом о краевом бюджете на 2023 год утверждены бюджетные ассигнования – первоначально в общей сумме 763 264,09 тыс. рублей. В течение года объем бюджетных ассигнований менялся четырежды и по итогу²⁶ составил 757 611,80 тыс. рублей, в том числе:

1) министерству строительства ПК по подразделу 1102 "Массовый спорт" на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (ЦСР 091Р500000) – первоначально в общей сумме 745 450,0 тыс. рублей, по итогу 2023 года – 739 797,72 тыс. рублей, по видам расходов:

²³ Распоряжение Правительства РФ от 18.10.2019 № 2468-р (ред. от 31.12.2022) «Об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта РФ, г. Байконура и федеральной территории "Сириус" из федерального бюджета по субъектам РФ и г. Байконуру на 2020 - 2025 годы в отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", возникших при реализации региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав соответствующего национального проекта, определенного Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 и Указом Президента РФ от 21.06.2020 № 474, а также в целях реализации государственной программы РФ "Комплексное развитие сельских территорий" и государственной программы РФ "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа».

²⁴ Закон Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ "О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" (далее – Закон о бюджете на 2023 год).

²⁵ Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" (далее – Закон о бюджете на 2024 год).

²⁶ В редакции Закона Приморского края от 19.12.2023 № 489-КЗ "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" (далее – в Закон Приморского края от 19.12.2023 № 489-КЗ).

- капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (строительство крытого футбольного манежа в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы) (КБК 775.1102.091P551391.410) – первоначально бюджетные ассигнования утверждены в сумме 360 027,14 тыс. рублей. Законом Приморского края от 30.03.2023 № 319-КЗ²⁷ объем бюджетных ассигнований увеличен до 369 364,19 тыс. рублей;

- капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы) (КБК 775.1102.091P551393.410) – первоначально в сумме 185 422,86 тыс. рублей. Законом Приморского края от 19.12.2023 № 489-КЗ размер бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия уменьшен до 155 704,53 тыс. рублей;

- капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (строительство крытого тренировочного катка в г. Находка) (КБК 775.1102.091P551394.410) – первоначальная редакция Закона о краевом бюджете на 2023 год не предусматривала бюджетные ассигнования на строительство крытого тренировочного катка в г. Находка. В результате разнонаправленных корректировок в течение года размер бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия составил 463,96 тыс. рублей (в редакции Закона Приморского края от 19.12.2023 № 489-КЗ);

- капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (строительство ледового катка в пгт Кавалерово) (КБК 775.1102.091P551395.410) – первоначальная редакция Закона о краевом бюджете на 2023 год не предусматривала бюджетные ассигнования на строительство ледового катка в пгт Кавалерово. В результате разнонаправленных корректировок в течение года размер бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия составил 15 552,56 тыс. рублей (в редакции Закона Приморского края от 19.12.2023 № 489-КЗ);

- капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске) (КБК 775.1102.091P551396.410) – первоначально в сумме 200 000 тыс. рублей. Законом Приморского края от 19.12.2023 № 489-КЗ размер бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия уменьшен до 198 712,48 тыс. рублей;

2) министерству спорта ПК по подразделам:

1102 "Массовый спорт" – на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в сумме 4 670,00,0 тыс. рублей (КБК 764.1102.091P552280.520). Мероприятие предусматривает создание двух малых спортивных площадок, обеспечивающих возможность тестирования населения по нормативам

²⁷ Закон Приморского края от 30.03.2023 № 319-КЗ "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов".

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Объем субсидии распределен бюджетам следующих муниципальных образований: Лазовский муниципальный округ – 2 335,00 тыс. рублей, Красноармейский муниципальный район²⁸ – 2 335,00 тыс. рублей)²⁹;

1103 "Спорт высших достижений" – 13 144,08 тыс. рублей, по целевым статьям:

- государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки, в сумме 9 321,33 тыс. рублей, в том числе:

субсидии бюджетам 10 муниципальных образований (9 городских округов и 1 муниципального округа)³⁰ – 3 510,31 тыс. рублей (КБК 764.1103.091P550810.520);

субсидии автономным учреждениям на иные цели – 5 811,02 тыс. рублей (КБК 764.1103.091P550810.620);

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние (КБК 764.1103.091P552290.620) в сумме 3 822,76 тыс. рублей (субсидия автономному учреждению на иные цели).

Законом о краевом бюджете на 2024 год утверждены бюджетные ассигнования – первоначально в общей сумме 825 351,80 тыс. рублей с последующим уменьшением до 266 361,72 тыс. рублей³¹, в том числе:

1) *министерству строительства ПК по подразделу 1102 "Массовый спорт"* на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (ЦСР 091P500000) – первоначально в общей сумме 812 181,58 тыс. рублей и по итогу 2024 года – 253 191,50 тыс. рублей, по видам расходов:

- капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (строительство крытого футбольного манежа в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы) (КБК 775.1102.091P551391.410) – первоначально бюджетные ассигнования утверждены в сумме 762 181,58 тыс. рублей. В течение года в объем бюджетных ассигнований дважды вносились корректировки. Законом

²⁸ Преобразован в Красноармейский муниципальный округ на основании Закона Приморского края от 05.06.2023 № 358-КЗ.

²⁹ Таблица 45 Приложения 13.

³⁰ Таблица 44 Приложения 13 (Арсеньевский ГО – 841,73 тыс. рублей, Артемовский ГО – 155,88 тыс. рублей, Владивостокский ГО – 193,29 тыс. рублей, ГО ЗАТО Фокино – 224,46 тыс. рублей, ГО Спасск-Дальний – 754,44 тыс. рублей, Дальнегорский ГО – 947,72 тыс. рублей, Находкинский ГО – 130,94 тыс. рублей, Партизанский ГО – 43,65 тыс. рублей, Уссурийский ГО – 130,94 тыс. рублей, Ольгинский МО – 87,29 тыс. рублей).

³¹ В редакции закона Приморского края от 27.11.2024 № 670-КЗ "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" (далее – Закон Приморского края от 27.11.2024 № 670-КЗ).

Приморского края от 27.11.2024 № 670-КЗ объем бюджетных ассигнований уменьшен до 11 286,07 тыс. рублей;

- капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы) (КБК 775.1102.091P551393.410) – первоначальная редакция Закона о краевом бюджете на 2024 год не предусматривала бюджетные ассигнования на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе. В результате разнонаправленных корректировок в течение года размер бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия составил 88 645,15 тыс. рублей (в редакции Закона Приморского края от 27.11.2024 № 670-КЗ);

- капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (строительство крытого тренировочного катка в г. Находка (КБК 775.1102.091P551394.410) – первоначальная редакция Закона о краевом бюджете на 2024 год не предусматривала бюджетные ассигнования на строительство крытого тренировочного катка в г. Находка. В течение года корректировки вносились четыре раза. Итоговый объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия составил 149 214,16 тыс. рублей (в редакции Закона Приморского края от 27.11.2024 № 670-КЗ);

- капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (строительство ледового катка в пгт Кавалерово) (КБК 775.1102.091P551395.410) – первоначально в сумме 50 000 тыс. рублей. В результате разнонаправленных корректировок в течение года размер бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия составил 4 046,12 тыс. рублей;

2) *министерству спорта ПК по подразделу 1103 "Спорт высших достижений"* – 13 170,22 тыс. рублей, по целевым статьям:

- государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки, в сумме 10 102,26 тыс. рублей, в том числе:

- субсидии бюджетам 10 муниципальных образований (8 городских округов, 1 муниципального округа, 1 муниципального района)³² – 3 797,72 тыс. рублей (КБК 764.1103.091P550810.520),

- субсидии автономным учреждениям на иные цели – 6 304,54 тыс. рублей (КБК 764.1103.091P550810.620).

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в

³²Таблица 32 Приложения 13 (Арсеньевский ГО – 1239,24 тыс. рублей, Артемовский ГО – 242,46 тыс. рублей, Владивостокский ГО – 131,92 тыс. рублей, ГО ЗАТО Фокино – 494,92 тыс. рублей, ГО Спасск-Дальний – 215,52 тыс. рублей, Дальнегорский ГО – 797,37 тыс. рублей, Находкинский ГО – 242,46 тыс. рублей, Партизанский ГО – 215,52 тыс. рублей, Надеждинский МР – 80, 82 тыс. рублей, Ольгинский МО – 137,48 тыс. рублей).

нормативное состояние (КБК 764.1103.091P552290.620) в сумме 3 067,96 тыс. рублей (субсидия автономному учреждению на иные цели).

7.2.2.2. Государственной программой ПК определены источники финансирования и объем средств на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни"³³. Информация о бюджетных ассигнованиях в анализируемом периоде (2023-2024 годы) представлена в таблице 4.

Таблица 4

Источник финансового обеспечения	Государственная программа ПК"		
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей в текущих ценах каждого года		
	2023	2024	Итого за 2023-2024 гг
Всего, в том числе:	961 235,91	213 905,42	1 175 141,33
федеральный бюджет	536 400,60	33 537,71	569 938,31
краевой бюджет	424 835,31	180 279,73	605 115,04
местный бюджет	0,00	87,97	87,97

Сведения об объемах расходов в разрезе мероприятий приведены в таблице 5.

Таблица 5

Государственная программа ПК в редакции постановлений Правительства ПК	Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий регионального проекта по годам, тыс. рублей						
	2023 год			2024 год			
	всего	в том числе		всего	в том числе		
		краевой бюджет	федеральный бюджет		краевой бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет
1.1.1. Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни"							
от 27.12.2022 № 773-пп	745 450,00	240 309,00	505 141,00	336 249,18	6 724,98	329 524,20	
от 24.05.2023 № 339-пп	979 620,03	474 479,03	505 141,00	1 039 687,26	710 163,06	329 524,20	
от 04.07.2023 № 453-пп	993 421,83	474 479,03	518 942,80	1 039 687,26	710 163,06	329 524,20	
от 04.10.2023 № 683-пп	943 421,83	424 479,03	518 942,80	1 089 687,26	760 163,06	329 524,20	
от 22.02.2024 № 113-пп				1 067 555,28	928 196,18	139 359,10	
от 20.06.2024 № 431-пп				1 205 287,18	999 550,98	205 736,20	
от 12.11.2024 № 770-пп				499 087,01	293 350,81	205 736,20	
от 28.12.2024 № 952-пп				200 647,22	178 602,01	22 045,21	
от 04.03.2025 № 202-пп				200 647,22	178 602,01	22 045,21	
Всего по мероприятию	943 421,83	424 479,03	518 942,80	200 647,22	178 602,01	22 045,21	0,00
1.1.2. Мероприятия по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни"							
от 27.12.2022 № 773-пп	4 670,00	93,40	4 576,60	0,00	0,00	0,00	
Всего по мероприятию	4 670,00	93,40	4 576,60				
1.1.3. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни"							
от 27.12.2022 № 773-пп	3 822,76	76,46	3 746,30	3 969,80	79,40	3 890,40	
от 22.02.2024 № 113-пп				3 067,96	61,36	3 006,60	
Всего по мероприятию	3 822,76	76,46	3 746,30	3 067,96	61,36	3 006,60	0,00
1.1.4. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации							
от 27.12.2022 № 773-пп	9 321,33	186,43	9 134,90	9 748,16	194,96	9 553,20	
от 22.02.2024 № 113-пп				10 190,24	1 616,36	8 485,90	87,97
Всего по мероприятию	9 321,33	186,43	9 134,90	10 190,24	1 616,36	8 485,90	87,97
ИТОГО	961 235,91	424 835,31	536 400,60	213 905,42	180 279,73	33 537,71	87,97

Государственной программой ПК объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" запланирован:

³³ Раздел 4 Паспорта государственной программы ПК.

в 2023 году в объеме 961 235,91 тыс. рублей (включая средства федерального бюджета – 536 400,60 тыс. рублей, краевого бюджета – 424 835,31 тыс. рублей),

в 2024 году в объеме 213 905,42 тыс. рублей (включая средства федерального бюджета – 33 537,71 тыс. рублей, краевого бюджета – 180 279,73 тыс. рублей).

Согласно абзацу 5 пункта 2 статьи 179 БК РФ государственные программы субъекта Российской Федерации, подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее 1 апреля текущего финансового года³⁴.

Как видно из таблицы 5, в нарушение абзаца 5 пункта 2 статьи 179 БК РФ бюджетные ассигнования, предусмотренные государственной программой ПК на реализацию мероприятий регионального проекта "Спорт – норма жизни" не приведены в соответствие с Законом о краевом бюджете на 2024 год.

Постановлением Правительства Приморского края от 01.03.2023 № 129-пп в государственную программу Приморского края включен Перечень объектов спорта, планируемых к строительству и реконструкции в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" (приложение № 1 к паспорту государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Приморского края") (далее – перечень объектов).

Согласно указанному перечню объектов в 2023-2024 годах объем инвестиций составляет 1 144 069,05 тыс. рублей (2023 год – 943 421,83 тыс. рублей, 2024 год – 200 647,22 тыс. рублей), в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 603 081,04 тыс. рублей (2023 год – 424 479,03 тыс. рублей, 2024 год – 178 602,01 тыс. рублей);

за счет средств федерального бюджета – 540 988,01 тыс. рублей (2023 год – 518 942,80 тыс. рублей, 2024 год – 22 045,21 тыс. рублей).

Распределение инвестиций по объектам представлено в таблице 6.

Таблица 6

Наименование объектов	ЦСР	Объем инвестиций, тыс. рублей в текущих ценах каждого года					Всего за 2023–2024 годы
		в том числе по годам					
		2020 (справочно)	2021 (справочно)	2022 (справочно)	2023	2024	
Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегогорске, в том числе ПИР	091P551396	109,05	4 200,00	2 495,00	200 000,00	0,00	200 000,00
федеральный бюджет							
краевой бюджет		109,05	4 200,00	2 495,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Строительство крытого ледового катка в пгт Кавалерово	091P551395	0,00	169 563,78	301 816,33	79 598,68	4 046,12	83 644,80
федеральный бюджет			166 172,50	295 780,00			
краевой бюджет			3 391,28	6 036,33	79 598,68	4 046,12	83 644,80

³⁴ В редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 416-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

Наименование объектов	ЦСР	Объем инвестиций, тыс. рублей в текущих ценах каждого года					Всего за 2023–2024 годы
		в том числе по годам					
		2020 (справочно)	2021 (справочно)	2022 (справочно)	2023	2024	
Строительство крытого тренировочного катка в г. Находке	091P551394	0,00	188 750,00	299 645,20	109 317,78	149 214,16	258 531,94
федеральный бюджет			184 975,00	293 652,30	13 801,80	553,80	14 355,60
краевой бюджет			3 775,00	5 992,90	95 515,98	148 660,36	244 176,34
Строительство крытого футбольного манежа в г. Владивостоке	091P551391	500,00	30,57	19 498,93	369 364,19	11 286,07	380 650,26
федеральный бюджет				0,00	352 826,60	1 281,50	354 108,10
краевой бюджет		500,00	30,57	19 498,93	16 537,59	10 004,57	26 542,16
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе	092P551393	0,00	0,00	326 004,70	185 141,19	36 100,87	221 242,06
федеральный бюджет				222 170,10	152 314,40	20 209,91	172 524,31
краевой бюджет				103 834,60	32 826,79	15 890,96	48 717,75

7.2.2.3. Согласно АИП на 2023–2024 годы сумма капитальных вложений по объектам регионального проекта "Спорт – норма жизни" составляет – 954 246,75 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 540 988,01 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 413 258,74 тыс. рублей), в том числе:

в 2023 году – 753 599,52 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 518 942,80 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 234 656,72 тыс. рублей),

в 2024 году – 200 647,23 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 22 045,21 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 178 602,01 тыс. рублей).

Объем капитальных вложений по объектам регионального проекта, утвержденный АИП на 2023–2024 годы, соответствует законам Приморского края о краевом бюджете на 2023–2024 годы, показателям сводной бюджетной росписи.

Информация об объемах капитальных вложений по объектам регионального проекта "Спорт – норма жизни" представлена в таблице Приложения 4 (таблица 1 - объемы капитальных вложений на 2023 год, таблица 2 – объемы капитальных вложений на 2024 год).

7.2.2.4. Информация об уточненных бюджетных ассигнованиях в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовых расходах, предусмотренных и осуществленных в целях реализации мероприятий регионального проекта "Спорт – норма жизни" за период 2023–2024 годов представлена в таблице Приложения 3.

Кассовые расходы за 2023 и 2024 годы, согласно бюджетной отчетности (форма 0503117), составили 875 513,28 тыс. рублей, из них:

в 2023 году – 681 090,04 тыс. рублей, или 88,3 % от плановых назначений (771 413,61 тыс. рублей), в том числе средства федерального бюджета – 453 049,34 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 228 040,70 тыс. рублей.

в 2024 году – 194 423,25 тыс. рублей, или 90,9 % от плановых назначений (213 817,44 тыс. рублей), в том числе средства федерального бюджета – 33 114,75 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 161 308,50 тыс. рублей.

7.3. Анализ эффективности использования бюджетных средств.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, включая достижение результатов регионального проекта, проведена по данным отчетов о ходе реализации регионального проекта на 31.12.2023 (далее – Отчет за 2023 год) и на 31.12.2024 (далее – Отчет за 2024 год), отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии (по направлениям расходов) (далее – отчеты о расходах), а также отчетов о достижении значений результатов использования субсидий и обязательствах, принятых в целях их достижения (по направлениям расходов) (далее – отчеты о достижении значений результатов).

Плановые значения результатов использования субсидий на 2023 и 2024 годы установлены соответственно дополнительными соглашениями от 13.12.2023 № 777-2019-Р50075-1/13 и от 23.12.2024 № 777-2019-Р50075-1/16 к соглашению о реализации РП от 01.02.2019 и соответствуют значениям результатов, отраженным в паспортах РП на 2023 год и 2024 год, а также соглашениях о предоставлении субсидий по отдельным направлениям Проекта (таблица 7).

Таблица 7

№ п/п	Наименование результата	Плановые показатели согласно паспортам Проекта		Фактические данные согласно отчетам	
		2023	2024	2023	2024
1.	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, единица	1	1	1	1
2.	В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва, единица	18	18	20	18
3.	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля), единица	2	-	2	-
4.	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности, единица	1	3	0	0

7.3.1. Достижение запланированного результата "В спортивные школы олимпийского резерва"³⁵ поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь" предполагает приведение спортивных школ олимпийского резерва в нормативное состояние.

В указанных целях в 2023–2024 годах государственному автономному учреждению дополнительного образования Приморского края "Краевая спортивная школа олимпийского резерва" (далее – ГАУ ДО ПК "КСШОР") предоставлена субсидия на развитие материально-технической базы, а именно закуплено и поставлено спортивное оборудование и инвентарь по следующим видам спорта:

в 2023 году – парусный спорт (парус, рангоут (мачта), спортивный парусный снаряд), гребля на байдарках и каноэ (каноэ одиночка, спасательный жилет, гребной тренажер), бадминтон (ракетка для бадминтона), легкая атлетика (мат гимнастический, ядра массой 2, 3 и 4 кг, копье, барьер легкоатлетический), бокс (мяч набивной, гантели). Перечень приобретаемого

³⁵ Организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания.

оборудования согласован с Минспортом России (письмо Минспорта России от 09.02.2023 № исх-02-5-10/1868).

в 2024 году – парусный спорт (парус), гребля на байдарках и каноэ (весло для гребли на байдарке, весло для гребли на каноэ), бадминтон (волан для бадминтона), легкая атлетика (барьер легкоатлетический), бокс (лапы боксерские, гонг боксерский электронный, груша боксерская, мешок боксерский, платформа для груши), лыжные гонки (лыжи гоночные, крепления, палки для лыжных гонок), спортивная борьба (манекены тренировочные, гири спортивные). Перечень приобретаемого оборудования согласован с Минспортом России (письмо Минспорта России от 12.03.2024 № исх-02-5-18/3860).

Согласно отчетам о достижении значений результатов за 2023–2024 годы, плановое значение – 1 спортивная школа – достигнуто.

Согласно отчетам о расходах за 2023–2024 годы, кассовое исполнение расходных обязательств, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, составило 6 752,90 тыс. рублей (таблица 8).

Таблица 8

период	Объем денежных средств (тыс. рублей)				% исполнения	уровень софинансирования, %
	предусмотрено		кассовый расход			
	Общий объем	Субсидия из ФБ	Общий объем	Субсидия из ФБ		
2023	3 822,76	3 746,30	3 822,76	3 746,30	100,0	соблюден (98%)
2024	3 067,96	3 006,60	3 067,96	3 006,60	100,0	соблюден (98%)

7.3.2. Достижение запланированного результата "В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва" предполагает софинансирование расходных обязательств организаций, входящих в систему спортивной подготовки, связанных:

а) с финансовым обеспечением спортивных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по базовым видам спорта³⁶;

б) с повышением квалификации и переподготовкой специалистов в сфере физической культуры и спорта;

в) с приобретением автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более 8;

г) с проездом спортсменов и тренеров до мест проведения II и III этапов Всероссийской спартакиады учащихся (юношеской), Всероссийской спартакиады молодежи (юниорской) и обратно.

В указанных целях в 2023 году оказана государственная поддержка 20 спортивным организациям, а именно:

³⁶ В соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, параолимпийским и сурдлимпийским видам спорта, утвержденными для Приморского края приказом Минспорта России от 23.06.2022 № 533 "Об утверждении перечня базовых видов спорта".

ГАУ ДО ПК "КСШОР" на выполнение государственного задания в части подготовки спортивного резерва по базовым видам спорта: гребля на байдарках и каноэ, парусный спорт, бадминтон, футбол, бокс, тхэквондо;

краевому государственному автономному учреждению "Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Приморского края" (далее – КГАУ "ЦАС") на выполнение государственного задания в части подготовки спортивного резерва по спорту глухих (плавание, бадминтон);

18 муниципальным спортивным школам по базовым видам спорта, в том числе приобретено спортивное оборудование и инвентарь, оплачены проезд спортсменов и тренеров к местам соревнований, проживание и питание.

В 2024 году оказана государственная поддержка 18 спортивным организациям, а именно:

ГАУ ДО ПК "КСШОР" на выполнение государственного задания в части подготовки спортивного резерва по базовым видам спорта: гребля на байдарках и каноэ, парусный спорт, бадминтон, бокс, тхэквондо (приобретена спортивная форма для обучающихся);

17 муниципальным спортивным школам по базовым видам спорта, в том числе приобретено спортивное оборудование и инвентарь, оплачены проезд спортсменов и тренеров к местам соревнований, проживание и питание.

Распределение средств из краевого бюджета на поддержку муниципальных спортивных организаций представлено в таблице 9.

Таблица 9

Муниципальное образование	Наименование учреждения	2023	2024
Находкинский ГО	МАУ ДО СШ "Водник" Находкинский ГО	130,93	161,64
	МАУ ДО СШ «Приморец» Находкинский ГО		26,94
	МАУ ДО СШ "Ливадия" Находкинский ГО		53,88
Арсеньевский ГО	МБУ ДО СШОР «Богатырь»	168,34	339,50
	МБУ ДО «СШ «Восток» г. Арсеньев	168,34	317,74
	МБУ ДО «СШ «Полет» г. Арсеньев	168,34	-
	МБУ ДО СШ «Юность» г. Арсеньев	336,69	581,99
Дальнегорский ГО	МБУ ДО СШ «Гранит» г. Дальнегорск	555,56	429,35
	МБУ ДО СШ «Лотос» г. Дальнегорска	392,16	368,02
Владивостокский ГО	МБУ СШ «Русич» города Владивостока	193,29	-
	МБУ ДО «СШ «Бастион» г. Владивостока	-	131,92
Артемовский ГО	МКУ СШ «Атлетическая гимнастика» г. Артем	130,94	134,70
	МКУ «СШ «Темп»	24,94	107,76
ГО Спасск-Дальний	МБУ ДО «СШ «Атлант» ГО Спасск-Дальний	173,41	215,52
	МБУ ДО «Лыжная СШ» ГО Спасск-Дальний	581,03	-
ГО ЗАТО Фокино	МБУ ДО «СШ» ГО ЗАТО Фокино	135,36	109,98
	МБУ ДО «СШ «Орбита» ГО ЗАТО Фокино (п. Дунай)	89,10	384,94
Партизанский ГО	МБУ СШ «Сучан»	43,65	215,52
Уссурийский ГО	МАУ «СШ» Уссурийского ГО	130,94	-
Ольгинский МО	МБУДО «Ольгинская» СШ	87,29	137,48
Надеждинский МО	МБУ ДО СШ «Надежда» Надеждинского района	-	80,80
Всего		3 510,31	3 797,72

Согласно отчетам о достижении значений результатов за 2023–2024 годы, в 2023 средства субсидии направлены на поддержку 20 спортивных организаций против плановых 18 – фактически достигнутый результат превышает плановое значение показателя на 2 единицы (+11,1 %); в 2024 году

средства субсидии направлены на поддержку 18 спортивных организаций, что соответствует плановым значениям.

Согласно отчетам о расходах за 2023–2024 годы, кассовое исполнение расходных обязательств, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, составило 17 620,80 тыс. рублей (таблица 10).

Таблица 10

Период	Объем денежных средств (тыс. рублей)				% исполнения	уровень софинансирования, %
	предусмотрено		кассовый расход			
	общий объем	субсидия из ФБ	общий объем	субсидия из ФБ		
2023	9 321,33	9 134,90	9 321,33	9 134,89	100,0	соблюден (98%)
2024	10 102,26	8 485,90	10 102,26	8 485,90	100,0	соблюден (84%)

7.3.3. Достижение результата "Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)" предполагает закупку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок для подготовки к выполнению и сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

В 2023 году произведена поставка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в следующих муниципальных образованиях:

- в Красноармейском муниципальном округе монтаж спортивно-технологического оборудования осуществлен на базе общеобразовательного учреждения (МКОУ "СОШ № 10" с. Новопокровка) по адресу: с. Новопокровка, ул. Советская, 85. Оборудование принято к учету Администрацией Красноармейского МО по акту приема-передачи от 25.09.2023 (фото 1–4 Приложения 5);

- в Лазовском муниципальном округе монтаж спортивно-технологического оборудования в рамках создания площадки ГТО осуществлен на базе общеобразовательного учреждения (МБОУ Лазовская СОШ № 1) по адресу: с. Лазо, ул. Некрасовская, 9. Оборудование принято к учету МКУ "Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики" Лазовского МО по акту приема-передачи 03.07.2023 № б/н (фото 5-7 Приложения 5).

Согласно отчету о достижении значений результатов за 2023 год, фактическое значение результата – создание двух площадок ГТО – соответствует плановым значениям.

Согласно отчету о расходах за 2023 год, кассовое исполнение расходных обязательств, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, составило 4 576,60 тыс. рублей (таблица 11).

Таблица 11

Период	Объем денежных средств (тыс. рублей)				% исполнения	уровень софинансирования, %
	предусмотрено		кассовый расход			
	общий объем	субсидия из ФБ	общий объем	субсидия из ФБ		
2023	4 670,00	4 576,60	4 670,00	4 576,60	100,0	соблюден (98%)

Вместе с тем в ходе анализа установлено следующее:

- мониторинг численности граждан, систематически использующих площадки ГТО для самостоятельной подготовки, отсутствует, как и механизм учета загрузки объектов;

- площадки относятся к категории плоскостных (открытых) сооружений и характеризуются невысокой единовременной пропускной способностью. Режим их использования признан неоптимальным в силу климатических особенностей Приморского края (продолжительный осенне-зимний период, обильные осадки в летние месяцы), полноценная эксплуатация возможна лишь в ограниченные временные промежутки теплого сезона, что существенно снижает доступность объектов для жителей и ограничивает достижение целевых показателей;

- недостаточная вовлеченность всех категорий населения в тестирование для сдачи нормативов ГТО: основную долю участников выполнения нормативов составляет молодежь до 17 лет³⁷, в то время как остальные возрастные группы задействованы слабо.

Таким образом, эффективность использования площадок ГТО оценивается как недостаточная.

7.3.4. В рамках достижения результата "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности" паспортом РП на 2023 год было запланировано строительство 5 спортивных объектов:

1. "Ледовый каток в пгт Кавалерово" по адресу: пгт Кавалерово, ул. Комсомольская, 36;

2. "Крытый тренировочный каток в г. Находка" по адресу: г. Находка, ул. Комсомольская, 34а;

3. "Крытый футбольный манеж в г. Владивостоке" по адресу: г. Владивосток, ул. Серова, 3;

4. "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Партизанске" по адресу: г. Партизанск, ул. Чкалова, 1г;

5. "Крытый тренировочный каток в г. Дальнегорске" по адресу: г. Дальнегорск, ул. Горького, 69.

Планом реализации регионального проекта³⁸ в целях строительства и ввода в эксплуатацию указанных объектов предусмотрены соответствующие мероприятия.

Ниже в таблице представлена информация о запланированных сроках реализации мероприятий и их фактическом исполнении.

³⁷ По данным формы федерального статистического наблюдения № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" за 2023–2025 годы.

³⁸ Приложение 1 к паспорту регионального проекта "Спорт – норма жизни".

Наименование мероприятия, контрольной точки (далее – КТ)	Сроки реализации согласно приложению 1 к паспортам регионального проекта "Спорт - норма жизни"										
	паспорт РП на 2023 год (утвержден 31.01.2023)		паспорт РП на 2023 год (в ред. от 19.12.2023)		паспорт РП на 2024 год (утвержден 31.01.2024)		паспорт РП на 2024 год (в ред. от 25.10.2024)		паспорт РП на 2024 год (в ред. 28.12.2024)		фактическое исполнение
	начало	окончание	начало	окончание	начало	окончание	начало	окончание	начало	окончание	
Результат № 4 "Построены и введены в эксплуатацию. объекты спорта региональной (муниципальной) собственности"											
4.1 Контрольная точка: Объект недвижимого имущества "Ледовый каток в пгт. Кавалерово" введен в эксплуатацию ³⁹ <i>в редакции от 28.12.2024:</i> Проведены строительно-монтажные работы на объекте "Ледового катка в пгт. Кавалерово" (техническая готовность 75%)	-	30.09.2023	01.08.2021	30.07.2024	01.08.2021	30.07.2024	-	30.07.2024	-	25.12.2024	КТ не выполнена Выполнены строительно-монтажные работы на сумму 118 217,98 тыс. рублей.
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Техническая готовность объекта на 31.12.2024 – 72,1 %
4.1.1 Строительно-монтажные работы завершены ³⁹	01.01.2023	30.08.2023	01.01.2023	30.06.2024	01.01.2024	30.06.2024	01.01.2024	30.06.2024		КТ исключена из паспорта	-
4.1.2 Заключение органа государственного строительного надзора по строительству "Ледового катка в пгт. Кавалерово" получено ³⁹	01.09.2023	15.09.2023	01.09.2023	15.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	01.07.2024	15.07.2024		КТ исключена из паспорта	-
4.1.3 Получен акт ввода в эксплуатацию объекта недвижимого имущества "Ледовый каток в пгт. Кавалерово" ³⁹	16.09.2023	30.09.2023	16.09.2023	30.07.2024	16.07.2024	30.07.2024	16.07.2024	30.07.2024		КТ исключена из паспорта	-
4.2 Контрольная точка: Объект недвижимого имущества "Крытый тренировочный каток в г. Находка" введен в эксплуатацию ⁴⁰	01.09.2021	30.09.2023	01.09.2021	25.12.2023	01.09.2021	25.12.2023	-	25.12.2023	01.09.2021	25.12.2023	КТ выполнена с отклонением (61 день)
4.2.1 Строительно-монтажные работы завершены	01.01.2023	30.08.2023	01.01.2023	30.08.2023							Заключено дополнительное соглашение к государственному контракту от 02.08.2021 № 21/П-07-2021-ГК о продлении сроков строительства до 01.12.2023. В декабре 2023 г. строительно-монтажные работы завершены.
4.2.2 Заключение органа государственного строительного надзора по строительству "Крытого тренировочного катка в г. Находка" получено	01.09.2023	15.09.2023	01.09.2023	15.09.2023							Техническая готовность объекта на 01.01.2024 – 99 %. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено от 24.02.2024 № 25-31-04-2024
4.2.3 Получен акт ввода в эксплуатацию недвижимого имущества "Крытый тренировочный каток в г. Находка"	16.09.2023	30.09.2023	16.09.2023	30.09.2023							

³⁹ В паспорте регионального проекта от 31.01.2024 (утв. 31.01.2024) указанные контрольные точки значатся под номерами соответственно 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3.

⁴⁰ В паспорте РП на 2024 (утв. 31.01.2024) год указанная контрольная точка значится под номером 3.2.

Наименование мероприятия, контрольной точки (далее – КТ)	Сроки реализации согласно приложению 1 к паспортам регионального проекта "Спорт - норма жизни"										
	паспорт РП на 2023 год (утвержден 31.01.2023)		паспорт РП на 2023 год (в ред. от 19.12.2023)		паспорт РП на 2024 год (утвержден 31.01.2024)		паспорт РП на 2024 год (в ред. от 25.10.2024)		паспорт РП на 2024 год (в ред. 28.12.2024)		фактическое исполнение
	начало	окончание	начало	окончание	начало	окончание	начало	окончание	начало	окончание	
4.3 Контрольная точка: Заключен государственный контракт на строительство объекта "Крытый футбольный манеж в г. Владивостоке" ⁴¹	-	15.03.2023	-	15.03.2023	-	15.03.2023	-	15.03.2023		15.03.2023	Заключен государственный контракт от 07.04.2023 № 775/Р/29/ЭА (реестровый номер 2254025253523000002)
4.4 Контрольная точка: Получено разрешение на строительство по объекту "Крытый футбольный манеж в г. Владивостоке" ⁴¹	-	15.04.2023	-	15.04.2023	-	15.04.2023	-	15.04.2023		15.04.2023	В связи с передачей проектно-сметной документации, несоответствующей нормативным требованиям Управления градостроительства Администрации г. Владивостока письмом от 02.05.2023 №10656/1у/30 отказало в выдаче разрешения на строительство
4.5 Контрольная точка: Проведены строительно-монтажные работы на объекте "Крытый футбольный манеж в г. Владивостоке" (техническая готовность 25%) ⁴¹ <i>в редакции от 28.12.2024:</i> Проведены строительно-монтажные работы на объекте "Крытый футбольный манеж в г. Владивостоке" (техническая готовность 7%)	-	25.12.2023	-	25.12.2023	-	25.12.2023	-	25.12.2023		25.12.2024	КТ не выполнена Выполнены строительно-монтажные работы на сумму 361 334,80 тыс. рублей. Техническая готовность объекта на 31.12.2024 составляет 2,5%.
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.6 Контрольная точка: Проведены строительно-монтажные работы на объекте "Крытый футбольный манеж в г. Владивостоке" (техническая готовность 60%) ⁴¹	-	30.06.2024	-	30.06.2024	-	30.06.2024	-	30.06.2024		КТ исключена в текущей редакции	-
4.7 Контрольная точка: Строительно-монтажные работы на объекте "Крытый футбольный манеж в г. Владивостоке" завершены ⁴¹	-	15.11.2024	-	15.11.2024	-	15.11.2024	-	15.11.2024		КТ исключена в текущей редакции	-
4.8 Контрольная точка: Заклучение органа государственного строительного надзора по строительству объекта "Крытый футбольный манеж в г. Владивостоке" получено ⁴¹	-	30.11.2024		30.11.2024	-	30.11.2024	-	30.11.2024		КТ исключена в текущей редакции	-
4.9 Контрольная точка: Объект недвижимого имущества "Крытый футбольный манеж в г. Владивостоке" введен в эксплуатацию ⁴¹	2023	01.12.2024	<i>15.07.2023</i>	01.12.2024	<i>15.07.2023</i>	01.12.2024		01.12.2024		25.12.2024	КТ не выполнена

⁴¹В паспорте РП на 2024 год (утв. 31.01.2024) указанные контрольные точки значатся под номерами соответственно 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9.

Наименование мероприятия, контрольной точки (далее – КТ)	Сроки реализации согласно приложению 1 к паспортам регионального проекта "Спорт - норма жизни"										
	паспорт РП на 2023 год (утвержден 31.01.2023)		паспорт РП на 2023 год (в ред. от 19.12.2023)		паспорт РП на 2024 год (утвержден 31.01.2024)		паспорт РП на 2024 год (в ред. от 25.10.2024)		паспорт РП на 2024 год (в ред. 28.12.2024)		фактическое исполнение
	начало	окончание	начало	окончание	начало	окончание	начало	окончание	начало	окончание	
4.10 Контрольная точка: Проведены строительно-монтажные работы на объекте "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Партизанске" (техническая готовность 60%)	-	30.06.2023	-	30.06.2023	-	КТ исключена в текущей редакции	-	-	-	-	-
4.11 Контрольная точка: Строительно-монтажные работы на объекте "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Партизанске" завершены <i>в редакции от 19.12.2023:</i> Строительно-монтажные работы на объекте "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Партизанске" (техническая готовность 70%)	-	15.11.2023	-	31.12.2023	-	КТ исключена в текущей редакции	-	-	-	-	-
	-	-									
3.10 Контрольная точка: Строительно-монтажные работы на объекте "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Партизанске" завершены ⁴²		-		КТ отсутствует		30.08.2024		30.11.2024		30.11.2024	КТ не выполнена Выполнены строительно-монтажные работы на сумму 366 086,29 тыс. рублей. Техническая готовность объекта на 31.12.2024 составляет 89,4 %.
4.12 Контрольная точка: Заключение органа государственного строительного надзора по строительству объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Партизанске" получено ^{42 43}	-	25.12.2023	-	15.07.2024	-	15.09.2024		15.12.2024		15.12.2024	КТ не выполнена
4.13 Контрольная точка: Объект недвижимого имущества "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Партизанске" введен в эксплуатацию ^{42 43}	01.06.2022	30.01.2024	01.06.2022	30.07.2024	01.06.2022	30.09.2024		25.12.2024	01.06.2022	25.12.2024	КТ не выполнена
4.14 Контрольная точка: Объект недвижимого имущества "Крытый тренировочный каток в г. Дальнегорске" введен в эксплуатацию	2023	01.12.2024	01.06.2023	01.12.2024	-	КТ исключена в текущей редакции	-	-	-	-	КТ исключена из паспорта РП на 2024 год
4.14.1 Заключен государственный контракт на строительство объекта	-	15.03.2023	-		-	КТ исключена в		-		-	-

⁴²В паспорте РП на 2024 год (в ред. от 28.12.2024) указанные контрольные точки значатся под номерами соответственно 3.6, 3.7, 3.8.

⁴³ В паспорте РП на 2024 год (утв. 31.01.2024) указанные контрольные точки значатся под номерами соответственно 3.11, 3.12.

Наименование мероприятия, контрольной точки (далее – КТ)	Сроки реализации согласно приложению 1 к паспортам регионального проекта "Спорт - норма жизни"										
	паспорт РП на 2023 год (утвержден 31.01.2023)		паспорт РП на 2023 год (в ред. от 19.12.2023)		паспорт РП на 2024 год (утвержден 31.01.2024)		паспорт РП на 2024 год (в ред. от 25.10.2024)		паспорт РП на 2024 год (в ред. 28.12.2024)		фактическое исполнение
	<i>начало</i>	<i>окончание</i>	<i>начало</i>	<i>окончание</i>	<i>начало</i>	<i>окончание</i>	<i>начало</i>	<i>окончание</i>	<i>начало</i>	<i>окончание</i>	
"Крытый тренировочный каток в г. Дальнегорске"						текущей редакции					
4.14.2 Получено разрешение на строительство по объекту "Крытый тренировочный каток в г. Дальнегорске"	16.03.2023	15.04.2023	16.03.2023		-	КТ исключена в текущей редакции		-		-	-
4.14.3 Проведение строительно-монтажных работ (техническая готовность 25%)	01.05.2023	25.12.2023	01.05.2023		-	КТ исключена в текущей редакции		-		-	-
4.14.4 Проведение строительно-монтажных работ (техническая готовность 60%)	01.01.2024	30.06.2024	01.01.2024		-	КТ исключена в текущей редакции		-		-	-
4.14.5 Строительно-монтажные работы завершены	01.07.2024	15.11.2024	01.07.2024		-	КТ исключена в текущей редакции		-		-	-
4.14.6 Заключение органа государственного строительного надзора по строительству объекта "Крытый тренировочный каток в г. Дальнегорске" получено	16.11.2024	30.11.2024	16.11.2024		-	КТ исключена в текущей редакции		-		-	-
4.14.7 Получен акт ввода в эксплуатацию объекта недвижимого имущества "Крытый тренировочный каток в г. Дальнегорске"	<i>01.12.2024</i>	01.12.2024	<i>01.12.2024</i>		-	КТ исключена в текущей редакции		-		-	-

Установленный на 2023 год результат – "крытый тренировочный каток в г. Находка" введен в эксплуатацию" – не достигнут. Техническая готовность объекта на 01.01.2024 составляла 99 %. Объект введен в эксплуатацию 24.02.2024 (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 25-31-04-2024), 29.02.2024 объект поставлен на кадастровый учет (кадастровый номер 25:31:010404:8974).

В 2024 году в связи с секвестированием средств федерального бюджета объект "Крытый тренировочный каток в г. Дальнегорске" исключен из паспорта РП на 2024 год.

Установленный на 2024 год результат – ввод в эксплуатацию оставшихся 3 объектов спортивной инфраструктуры – не выполнен согласно Отчету на 2024 год.

По данным отчетов о расходах за 2023 и 2024 годы, кассовое исполнение расходных обязательств, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, составило соответственно 435 591,55 тыс. рублей и 21 622,25 тыс. рублей (таблица 12).

Таблица 12

Направление расходов	Период	Объем денежных средств (тыс. рублей)				% исполнени я	Неиспользованный объем (тыс. рублей)		уровень софинанси рования, %
		предусмотрено		кассовый расход			Общий объем	субсидия из ФБ	
		общий объем	субсидия из ФБ	общий объем	субсидия из ФБ				
создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной (муниципальной) собственности, в том числе по КБК	2023	529 533,47	518 942,80	444 481,17	435 591,55	83,9			соблюден (98%)
	2024	22 495,12	22 045,21	22 063,52	21 622,25	98,1	431,6	423,0	соблюден (98%)
775.1102.091P551391.414 (крытый футбольный манеж в г. Владивосток)	2023	360 027,14	352 826,60	360 027,14	352 826,60	100,0	--	--	соблюден (98%)
	2024	1 307,65	1 281,50	1 307,65	1 281,50	100,0	--	--	соблюден (98%)
775.1102.091P551393.414 (физкультурно- оздоровительный комплекс в г. Партизанске)	2023	155 422,86	152 314,40	70 935,71	69 516,99	45,6	84 487,15	82 797,41	соблюден (98%)
	2024	20 622,36	20 209,91	20 190,76	19 786,95	97,9	431,60	422,97	соблюден (98%)
775.1102.091P551394.414 (крытый тренировочный каток в г. Находке)	2023	14 083,47	13 801,80	13 518,32	13 247,95	96,0	565,15	553,85	соблюден (98%)
	2024	565,10	553,80	565,10	553,80	100,0	--	--	соблюден (98%)

Вследствие нарушения субъектом принятых обязательств в части недостижения значений результата регионального проекта, установленных соглашением от 23.12.2019 № 777-2019-Р50075, из бюджета Приморского края в доход федерального бюджета перечислен возврат средств в качестве штрафных санкций в размере 10 % от суммы освоенной субсидии федерального бюджета:

по объекту "Крытый футбольный манеж в г. Владивосток" по итогам 2023 года – в сумме 35 282,66 тыс. рублей, по итогам 2024 года – в сумме 128,15 тыс. рублей;

по объекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Партизанске" по итогам 2024 года – в сумме 1 978,69 тыс. рублей.

В связи с завершением в 2024 году регионального проекта "Спорт – норма жизни" строительство ледового катка в пгт. Кавалерово, крытого

футбольного манежа в г. Владивосток с 2025 года осуществлялось в рамках федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта".

По причине низкого уровня технической готовности ввод крытого манежа в эксплуатацию в 2025 году не представлялся возможным, ввиду чего письмом от 18.12.2024 в адрес министерства спорта Российской Федерации направлен запрос об исключении указанного объекта из паспорта с гарантией возврата в федеральный бюджет средств, ранее выделенных на строительство крытого футбольного манежа в г. Владивостоке.

Возврат средств федерального бюджета осуществлен 07.10.2025.

7.4. Оценка достижения целевых показателей.

Реализация мероприятий РП "Спорт – норма жизни" предусматривает достижение двух целевых показателей: уровень обеспеченности населения объектами спорта, а также численность систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Оценка достижения индикаторов результативности регионального проекта проведена по данным Отчетов за 2023 год и за 2024 год.

Динамика показателей, характеризующих достижение целей регионального проекта, представлена в таблице 13:

Таблица 13

№ п/п	Наименование показателя регионального проекта "Спорт - норма жизни"	2019 базовое значение	Плановое значение показателя		Фактическое значение показателя	
			2023	2024	Отчет за 2023 год	Отчет за 2024 год
1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	39,8	56,1	59,9	59,4	60,87
2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, %	33,5	55	62,1	54,7	55,22

Согласно Отчетам за 2023 и 2024 годы установлено следующее:

в 2023–2024 годах из двух показателей результативности регионального проекта с опережением выполняется показатель "доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом" (в 2023 году на 5,9% и в 2024 году на 1,6% выше запланированного значения);

в 2023–2024 годах системно не достигается плановое значение показателя "уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности" (в 2023 году на 0,5 % и в 2024 году на 11,1 % ниже запланированного значения).

При этом корректность отчетных данных за 2024 год в ходе проведенной проверки не нашла подтверждения: согласно официальным статистическим данным Министерства спорта России⁴⁴ за 2024 год, показатель "доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом" составил 61,4 %, показатель "уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности" составил 57,5 %. Тем самым показатели официальной статистики выше соответственно

⁴⁴Данные официального сайта Министерства спорта Российской Федерации: <https://minsport.gov.ru>.

на 0,47 п.п. и 2,28 п.п., чем данные Отчета за 2024 год, предоставленного министерством спорта ПК.

Вместе с тем необходимо отметить, что целевой показатель регионального проекта "доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом" взаимоувязан с мероприятиями государственной программы ПК по развитию спорта высших достижений⁴⁵ (приобретение спортивного оборудования и инвентаря для ГАУ ДО ПК "КСШОР"; государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва).

В то время как целевым ориентиром национального и федерального проектов является создание условий для массового спорта и привлечения к регулярным занятиям физической культурой всех категорий населения.

Таким образом, невозможно проследить прямую связь между реализуемыми мероприятиями и фактическим увеличением численности систематически занимающихся: мероприятия программы преимущественно направлены на поддержку спортивного резерва и достижение высоких спортивных результатов, в то время как задачи массового вовлечения населения в регулярные занятия физической культурой остаются без финансирования, что свидетельствует о формальном подходе к достижению целевых показателей.

7.5. Анализ и оценка реализации инфраструктурных мероприятий в рамках регионального проекта "Спорт–норма жизни"

В ходе экспертно-аналитического мероприятия использованы данные единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС), системы "Электронный бюджет", информация, предоставленная по запросам объектами исследования.

7.5.1. Анализ проведенных закупок согласно данным реестра при реализации регионального проекта "Спорт–норма жизни"

Согласно данным реестра контрактов, представленным министерством спорта ПК и размещенным в ЕИС, в рамках исполнения результатов регионального проекта "Спорт–норма жизни" в 2023–2025 годах были заключены следующие государственные контракты, дополнительные соглашения, договоры. Представлены в таблице ниже.

Таблица 14

Вид проведенных закупок	Количество заключенных контрактов	Начальная (максимальная) цена контракта (договора, доп. соглашения)	Окончательная цена (сумма) контракта (договора, доп. соглашения)	Фактически оплачено	Экономия средств по результатам заключения контрактов (абсолютное значение)	Экономия средств по результатам заключения контрактов (относительное значение)
Наименование результата: "В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь"						
2023 год						
Закупки единственного поставщика № 223-ФЗ	у 9	4 414,91	4 414,91	4 414,91	0,00	-
2024 год						

⁴⁵ Таблица 2.

Вид проведенных закупок	Количество заключенных контрактов	Начальная (максимальная) цена контракта (договора, доп. соглашения)	Окончательная цена (сумма) контракта (договора, доп. соглашения)	Фактически оплачено	Экономия средств по результатам заключения контрактов (абсолютное значение)	Экономия средств по результатам заключения контрактов (относительное значение)
Закупки единственного поставщика № 223-ФЗ	у 11	3 067,96	3 067,96	3 067,96	0,00	-
2025 год						
-	-	-	-	-	-	-
Всего	20	7 482,87	7 482,87	7 482,87	0,00	-
Наименование результата: "Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий подготовки спортивного резерва"						
2023 год						
Закупки единственного поставщика № 44-ФЗ	у 22	3 333,49	3 332,99	3 333,49	0,5	-
Закупки единственного поставщика № 223-ФЗ	у 1	931,98	931,98	931,98	0,00	-
Общий итог за 2023 год	23	4 265,47	4 264,97	4 265,47	0,5	-
2024 год						
Закупки единственного поставщика № 44-ФЗ	у 16	1 880,67	1 880,67	1 880,67	0,00	-
Закупки единственного поставщика № 223-ФЗ	у 3	249,96	249,96	249,96	0,00	-
Общий итог за 2024 год	19	2 130,63	2 130,63	2 130,63	0,00	-
2025 год						
-	-	-	-	-	-	-
Всего	42	6 396,1	6 395,6	6 396,1	0,5	-
Наименование результата: "Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)"						
2023 год						
Электронный аукцион	3	7 507,26	5 419,10	5 419,10	2 088,16	27,82%
2024 год						
-	-	-	-	-	-	-
2025 год						
-	-	-	-	-	-	-
Всего	3	7 507,26	5 419,10	5 419,10	2 088,16	-
Наименование результата: "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности"						
2023 год						
Электронный аукцион	2	1 445 851,21	1 430 256,14	553 468,37	15 595,07	1,08 %
Закупки единственного поставщика № 44-ФЗ	у 12	2 945,84	2 945,84	2 945,84	-	-
Запрос котировок	2	3 481,12	1 960,60	1 960,60	1 520,52	43,68%
Общий итог за 2023 год	16	1 452 278,17	1 435 162,58	558 374,81	17 115,59	-
2024 год						
Электронный аукцион	1	12 632,67	8 148,07	0	-	-
Закупки единственного поставщика № 44-ФЗ	у 1	185,2	185,2	185,2	-	-
Общий итог за 2024 год	2	12 817,87	8 333,27	185,2	-	-
2025 год						
-	-	-	-	-	-	-
Всего	18	1 465 096,04	1 443 495,85	-	-	-

Детальная информация о совершенных закупках в 2023-2025 годах, отражена в Приложениях 7, 8.

7.5.1.1 по результату "В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь"

Заказчиком выступает ГАУ ДО ПК "КСШОР", которым применялся способ закупки у единственного поставщика согласно Федеральному закону № 223-ФЗ.

Сведения о закупках, осуществленных в 2023–2025 годах в целях достижения установленного результата, представлены в таблице.

Таблица 15

Вид проведенных закупок	Количество заключенных контрактов	Начальная (максимальная) цена контракта (договора, доп. соглашения)	Окончательная цена (сумма) контракта (договора, доп. соглашения)	Фактически оплачено
Наименование результата: "В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь"				
2023 год				
Закупки у единственного поставщика № 223-ФЗ	9	4 414,91	4 414,91	4 414,91
2024 год				
Закупки у единственного поставщика № 223-ФЗ	11	3 067,96	3 067,96	3 067,96
2025 год				
-	-	-	-	-
Всего	20	7 482,87	7 482,87	7 482,87

За период с 2023 по 2025 года было заключено 20 контрактов на общую сумму 7 482,87 тыс. рублей, из них:

2023 год: заключено 9 контрактов на общую сумму 4 414,91 тыс. рублей. Закуплено спортивное оборудование и инвентарь по следующим видам спорта: парусный спорт, гребля на байдарках и каноэ, бадминтон, легкая атлетика;

2024 год: заключено 11 контрактов на общую сумму 3 067,96 тыс. рублей. Закуплено спортивное оборудование и инвентарь по следующим видам спорта: легкая атлетика, бокс, парусный спорт, гребля на байдарках и каноэ, бадминтон, лыжные гонки, спортивная борьба;

2025 год: закупки не осуществлялись.

7.5.1.2 по результату "Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий подготовки спортивного резерва"

В рамках исполнения результата, субсидия распределена десяти муниципальным образованиям Приморского края⁴⁶ для оказания государственной поддержки восемнадцати организациям, осуществляющим подготовку спортсменов по базовым видам спорта, в результате чего было закуплено спортивное оборудование и инвентарь в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Кроме того, субсидия распределена КГАУ "ЦАС" на выполнение государственного задания в части подготовки спортивного резерва по спорту глухих (плавание, бадминтон).

⁴⁶ Находкинский городской округ; Арсеньевский городской округ; Дальнегорский муниципальный округ; Владивостокский городской округ; Артемовский городской округ; муниципальный округ Спасск-Дальний; ЗАТО Фокино; Партизанский муниципальный округ; Уссурийский городской округ; Ольгинский муниципальный округ.

КГАУ "ЦАС" осуществляет закупочную деятельность в соответствии с нормами Федерального закона № 223-ФЗ и на основании Положения⁴⁷.

Сведения о закупках, осуществленных в 2023–2025 годах в целях достижения установленного результата, представлены в таблице.

Таблица 16

Вид проведенных закупок	Количество заключенных контрактов	Начальная (максимальная) цена контракта (договора, доп. соглашения)	Окончательная цена (сумма) контракта (договора, доп. соглашения)	Фактически оплачено	Экономия средств по результатам заключения контрактов (абсолютное значение)	Экономия средств по результатам заключения контрактов (относительное значение)
Наименование результата: "Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий подготовки спортивного резерва"						
2023 год						
Закупки у единственного поставщика № 44-ФЗ	22	3 333,49	3 332,99	3 333,49	0,5	-
Закупки у единственного поставщика № 223-ФЗ	1	931,98	931,98	931,98	0,00	-
Общий итог за 2023 год	23	4 265,47	4 264,97	4 265,47	0,5	
2024 год						
Закупки у единственного поставщика № 44-ФЗ	16	1 880,67	1 880,67	1 880,67	0,00	-
Закупки у единственного поставщика № 223-ФЗ	3	249,96	249,96	249,96	0,00	-
Общий итог за 2024 год	19	2 130,63	2 130,63	2 130,63	0,00	-
2025 год						
-	-	-	-	-	-	-
Всего	42	6 396,1	6 395,6	6 396,1	0,5	

За период с 2023 по 2025 год заключено 42 контракта на общую сумму 6 396,1 тыс. рублей. Контракты заключены в рамках Федерального закона № 223-ФЗ и Федерального закона № 44-ФЗ.

2023 год: заключено 23 контракта на общую сумму 4 265,47 тыс. рублей. Закуплено спортивное оборудование и инвентарь по базовым видам спорта для нужд спортивных школ; оплачены услуги плавательного бассейна "Олимпиец" для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

2024 год: заключено 19 контрактов на общую сумму 2 130,63 тыс. рублей. Закуплено спортивное оборудование и инвентарь по базовым видам спорта для нужд спортивных школ;

2025 год: закупки не осуществлялись.

7.5.1.3 по результату "Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)"

Закупки проводились Администрацией Красноармейского муниципального района и МКУ "Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики" Лазовского муниципального округа Приморского края конкурентным способом путем проведения электронных аукционов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Сведения о закупках, осуществленных в 2023–2025 годах в целях достижения установленного результата, представлены в таблице.

⁴⁷ Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд краевого государственного автономного учреждения "Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Приморского края", утвержденного решением Наблюдательного совета КГАУ "ЦАС". Протокол: от 16.12.2022 № 11; от 15.05.2025 № 7; от 20.03.2026 № 2.

Таблица 17

Вид проведенных закупок	Количество заключенных контрактов	Начальная (максимальная) цена контракта (договора, доп. соглашения)	Окончательная цена (сумма) контракта (договора, доп. соглашения)	Фактически оплачено	Экономия средств по результатам заключения контрактов (абсолютное значение)	Экономия средств по результатам заключения контрактов (относительное значение)
Наименование результата: "Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)"						
2023 год						
Электронный аукцион	3	7 507,26	5 419,10	5 419,10	2 088,16	27,82%
2024 год						
-	-	-	-	-	-	-
2025 год						
-	-	-	-	-	-	-
Всего	3	7 507,26	5 419,10	5 419,10	2 088,16	

2023 год: заключены 3 контракта на общую сумму 5 419,10 тыс. рублей на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)" в том числе:

- контракт от 27.03.2023 № 3251700370023000016 на сумму 2 679,01 тыс. рублей, заключенный между Администрацией Красноармейского муниципального района и ООО "Миллениум-Спорт";

- контракты от 04.04.2023 № 3250813926023000010 на сумму 1 802,49 тыс. рублей; от 02.05.2023 № 3250813926023000011 на сумму 937,60 тыс. рублей, заключенные между МКУ "Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики" Лазовского муниципального округа Приморского края и ООО "Сила Стали".

В 2024-2025 годах средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.

По итогам заключенных контрактов, экономия бюджетных средств, образовавшаяся в связи со снижением НМЦК по результатам электронных аукционов, составила 2 088,16 тыс. рублей. Показатель относительной экономии составил 27,82 %.

7.5.1.4 по результату "Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты спорта региональной (муниципальной) собственности"

Приказом министерства строительства Приморского края от 26.03.2021 № 54-пр "Управление капитального строительства Приморского края" (далее – КГКУ "УКС Приморского края") наделено функциями государственного заказчика, в том числе по объектам капитального строительства, выбранным в качестве объектов настоящего экспертно-аналитического мероприятия⁴⁸.

⁴⁸ "Строительство ледового катка в пгт. Кавалерово, софинансируемого за счет средств федерального бюджета"; "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы"; "Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске, в том числе проектно-изыскательские работы"; "Строительство крытого тренировочного катка в г. Находка, софинансируемого за счет средств федерального бюджета"; "Строительство крытого футбольного манежа в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы".

Закупки осуществлялись КГКУ "УКС Приморского края". Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) проводилось как конкурентными способами, так и путем осуществления закупок у единственного поставщика в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Сведения о закупках, осуществленных в 2023–2025 годах в целях достижения установленного результата, представлены в таблице.

Таблица 18

Вид проведенных закупок	Количество заключенных контрактов	Начальная (максимальная) цена контракта (договора, доп. соглашения)	Окончательная цена (сумма) контракта (договора, доп. соглашения)	Фактически оплачено	Экономия средств по результатам заключения контрактов (абсолютное значение)	Экономия средств по результатам заключения контрактов (относительное значение)
Наименование результата: "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности"						
2023 год						
Электронный аукцион	2	1 445 851,21	1 430 256,14	553 468,37	15 595,07	1,08 %
Закупки у единственного поставщика № 44-ФЗ	12	2 945,84	2 945,84	2 945,84	-	-
Запрос котировок	2	3 481,12	1 960,60	1 960,60	1 520,52	43,68%
Общий итог за 2023 год	16	1 452 278,17	1 435 162,58	558 374,81	17 115,59	
2024 год						
Электронный аукцион	1	12 632,67	8 148,07	0,00	0,00	0,00
Закупки у единственного поставщика № 44-ФЗ	1	185,2	185,2	185,2	-	-
Общий итог за 2024 год	2	12 817,87	8 333,27	185,2	-	-
2025 год						
-	-	-	-	-	-	-
Всего	18	1 465 096,04	1 443 495,85	558 560,01	17 115,59	-

За период с 2023 по 2025 года было заключено 18 контрактов на общую сумму 1 443,49 тыс. рублей, из них:

2023 год:

Электронный аукцион - 2 контракта:

контракт от 11.04.2023 № 775/Р/31/ЭА (№ 2254025253523000003) на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства "Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске, в том числе проектно-изыскательские работы" заключен между КГКУ "УКС Приморского края" и ООО "Гамма-Технология" на сумму 405 256,14 тыс. рублей;

контракт от 07.04.2023 № 775/Р/29/ЭА (№ 2254025253523000002) на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства "Строительство крытого футбольного манежа в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы" заключен между КГКУ "УКС Приморского края" и ООО "ТехПромАтлант" на сумму 1 024 999,99 тыс. рублей.

Закупки у единственного поставщика в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ – 12 контрактов:

заключены контракты на поставку оборудования (в том числе медицинского) и мебели для оснащения строящегося объекта капитального строительства "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе" на общую сумму 2 945,84 тыс. рублей.

Запрос котировок – 2 контракта:

заключены контракты на поставку металлической и офисной мебели для строящегося объекта капитального строительства "Строительство

физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе" на общую сумму 1 960,6 тыс. рублей.

Расторгнутые – 3 контракта:

в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по контрактам от 11.04.2023 № 775/Р/33/ЕП и № 775/Р/32/ЕП на корректировку проектной документации по объекту "Строительство крытого тренировочного катка в г. Находка", а также в связи с истечением срока действия данных контрактов, оплата работ не производилась;

контракт от 11.04.2023 № 775/Р/34/ЕП на корректировку проектной документации по объекту: "Ледовый каток с размером поля 60*30м в пгт. Кавалерово, Кавалеровского района Приморского края" признан расторгнутым ввиду нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком.⁴⁹

контракт от 02.05.2023 № 19/23 эс/775/У/42/ЕП на проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения объекта капитального строительства: "Ледовый каток с размером поля 60*30м в пгт. Кавалерово, Кавалеровского района Приморского края" подписано соглашение о расторжении от 13.05.2024 б/н.

2024 год:

Электронный аукцион – 1 контракт:

заключен контракт на поставку и монтаж комплекта хоккейного борта для строящегося объекта капитального строительства – ледового катка в пгт. Кавалеров на сумму 8 148,070 тыс. рублей. В связи с (незавершением) строительных работ на объекте капитального строительства, монтаж оборудования в настоящее время невозможен. По этой причине обязательства по контракту не могут быть исполнены в полном объеме, оплата не производилась. Планируется заключение дополнительного соглашения о продлении срока до сентября 2026 года.

Закупки у единственного поставщика в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ – 1 контракт:

заключен контракт на поставку витрины кондитерской для оснащения строящегося объекта капитального строительства "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы" на сумму 185,2 тыс. рублей.

2025 год: контракты не заключались.

По результатам проведенных закупок в 2023-2025 годах, экономия бюджетных средств составила 17 115,59 тыс. рублей.

7.5.2. Строительство, модернизация и эксплуатация инфраструктуры.

В рамках реализации регионального проекта "Спорт-норма жизни" запланировано строительство 5 объектов, из них: "Строительство ледового катка в пгт. Кавалерово, софинансируемого за счет средств федерального бюджета"; "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в

⁴⁹ Односторонний отказ Заказчика от исполнения ГК от 24.05.2024 № 01-03-04/1368.

Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы"; "Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске, в том числе проектно-изыскательские работы"; "Строительство крытого тренировочного катка в г. Находка, софинансируемого за счет средств федерального бюджета"; "Строительство крытого футбольного манежа в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы". Детальные данные о финансировании объектов отражены в Приложении 9.

7.5.2.1. Строительство крытого футбольного манежа в г. Владивостоке планировалось в рамках исполнения государственного контракта от 07.04.2023 № 775/Р/29/ЭА (№ 2254025253523000002) заключенного между КГКУ "УКС Приморского края", именуемое в дальнейшем "Заказчик", и ООО "ТехПромАтлант", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", на сумму 1 024 999, 99 тыс. рублей.

Основные технико-экономические показатели Объекта отражены в таблице.

Таблица 19

Площадь земельного участка, м ³	49 855
Общая площадь здания, м ²	9 733,0
Количество этажей	1-2
Количество зрителей	310 чел.

Итоговое финансирование обязательств, предусмотренных контрактом, составило – 361 334,8 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 354 108,10 тыс. рублей; краевой бюджет – 7 226,7 тыс. рублей.

Исполненные обязательства составили – 4 517,9 тыс. рублей.

Срок выполнения работ первоначально установлен с 07.04.2023 по 30.06.2024. В последствии продлен до 31.12.2024.

12.12.2023 ООО "ТехПромАтлант", руководствуясь абзацем четвертым части 1 статьи 716, частью 3 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, уведомило КГКУ "УКС Приморского края" письмом № 205 (вх. от 12.12.2023 № 708) о том, что с 12.12.2023 приостанавливает в полном объеме реализацию прав и обязанностей по контракту.

Подрядчиком была проведена строительно-техническая экспертиза рабочей документации "Строительство крытого футбольного манежа в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы". По итогам заключений строительно-технических экспертиз от 25.06.2024 № 130-Э/2024, от 05.06.2024 № 140-Э/2024, выявлено множество критических и значительных дефектов в разработанной к государственному контракту проектно-сметной документации. ООО "ТехПромАтлант" сделан вывод, что использование рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ и возведения объекта является невозможным.

29.05.2024 ООО "ТехПромАтлант" обратилось в Арбитражный суд Приморского края (далее – АС ПК) об обязании КГКУ "УКС Приморского края" предоставить ООО "ТехПромАтлант" откорректированную проектно-

сметную документацию к государственному контракту от 07.04.2023 № 775/Р/29/ЭА, получившую положительное заключение экспертизы в течение 6 месяцев со дня вступления решения по данному делу в законную силу, обязать КГКУ "УКС Приморского края" по результатам корректировки проектно-сметной документации внести изменения в государственный контракт от 07.04.2023 № 775/Р/29/ЭА посредством заключения дополнительного соглашения в течение 1 месяца с момента получения положительного заключения государственной экспертизы (дело № А51-10031/2024).

Решением АС ПК от 01.08.2024 по делу № А51-10031/2024 в удовлетворении исковых требований ООО "ТехПромАтлант" отказано.

Как следует из решения АС ПК, Заказчик обязан передать проектно-сметную и рабочую документацию, а Подрядчик выполнить работы в соответствии с ней. В случае невозможности выполнения работ, в соответствии с полученной документацией, Подрядчик обязан уведомить Заказчика и приостановить работы, а затем имеет право на отказ от договора, требовать возмещения убытков. Глава 37 ГК РФ не предусматривает такой способ защиты, как понуждение Заказчика к передаче технической документации.

ООО "ТехПромАтлант" в адрес КГКУ "УКС Приморского края" направлено решение от 08.10.2024 № 221 "Об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта от 07.04.2023 № 775/Р/29/ЭА" (далее – решение от 08.10.2024 № 221).

На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия, в связи с невыполнением обязательств по строительству объекта в установленный срок, государственный контракт с ООО "ТехПромАтлант" расторгнут 22.10.2024.

11.11.2024 в адрес КГКУ "УКС Приморского края" произведена оплата банковской гарантии № 23/0044/AST/ММБ/037052 ПАО "Сбербанк России" (платежное поручение № 785518) за ООО "ТехПромАтлант" по требованию от 29.10.2024 № 01-03-04/2958 об уплате денежной суммы в размере 21 102,31 тыс. рублей в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) ООО "ТехПромАтлант" своих обязательств в рамках исполнения государственного контракта.

22.01.2025 КГКУ "УКС Приморского края" обратился в АС ПК с иском о взыскании с ООО "ТехПромАтлант" неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами, а также процентов (дело № А51-1209/2025).

Решением АС ПК от 18.08.2025 исковые требования КГКУ "УКС Приморского края" удовлетворены в полном объеме. Суд постановил взыскать с ООО "ТехПромАтлант" в пользу КГКУ "УКС Приморского края" неосновательное обогащение в размере 335 814,6 тыс. рублей; проценты за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 05.08.2025 в размере 54 099,88 тыс. рублей.

12.11.2025 КГКУ "УКС Приморского края" в Главное межрегиональное (специализированное) управление Федеральной службы судебных приставов (СОСП по Приморскому краю) направлено заявление о возбуждении исполнительного производства.

26.11.2025 судебным приставом СОСП по Приморскому краю, возбуждено исполнительное производство № 493551/25/98025-ИП.

06.05.2026 по информации судебного пристава СОСП по Приморскому краю, с должника ООО "ТехПромАтлант" взыскано 0,00 тыс. рублей ввиду отсутствия какого-либо имущества и счетов.

На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия, выполнены следующие работы: устройство строительного городка, установка ограждения и электроснабжения площадки, устройство подъездных путей, залили 71 сваю – 28 %, устройство основания под ростверки – 17 %; устройство ограждения территории – 99 %; изготовление каркасов – 46 %; разработка котлованов и траншей под прокладку сетей В1 – 65 %; разработка котлованов под устройство фундаментов – 18 %. Общая техническая готовность объекта капитального строительства составляет 2,5 %.

В настоящее время КГКУ "УКС Приморского края" подготовлено техническое задание на выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации с учетом проведения обследования буронабивных свай (71 шт). Составлена смета на проектно-изыскательские работы (далее – ПИР). Стоимость ПИР на уровне цен IV кв. 2025 года, составила 6 731,11 тыс. рублей.

Проводятся работы по определению стоимости на инструментальное обследование буронабивных свай объектов капитального строительства, разработке технического задания, программы обследования, с составлением сметной стоимости обследования и прохождением государственной экспертизы в части проверки сметной документации на соответствие действующим сметным нормативам.

Строительство крытого футбольного манежа в г. Владивостоке продолжится в рамках нового федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта", ввиду завершения регионального проекта "Спорт-норма жизни" в 2024 году.

В период проведения экспертно-аналитического мероприятия, сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края совместно с представителями КГКУ "УКС Приморского края", министерства спорта ПК, министерства строительства ПК, осуществлен выезд на Объект. Информация, полученная в ходе осмотра Объекта, отражена в (Приложение 6).



Фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края 18.05.2026

7.5.2.2. Строительство крытого тренировочного катка в г. Находка осуществляется в рамках исполнения государственного контракта № 21/П-07-2021-ГК от 02.08.2021 (№ 2254025253521000027) заключенного между КГКУ "УКС Приморского края", именуемое в дальнейшем "Заказчик", и ООО "ТехПромАтлант", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", на сумму 552 541,47 тыс. рублей (в первоначальной редакции - 328 776,73 тыс. рублей).

Основные технико-экономические показатели отражены в таблице.

Таблица 20

Количество этажей	1-2
Общая площадь здания, м ²	3 597,4
Строительный объем, м ³	32 143,8
Мощность	300 человек

Срок выполнения работ первоначально установлен с 02.08.2021 по 30.09.2022 года (включительно). В последствии продлен до 10.03.2024.

Итоговое финансирование обязательств, предусмотренных контрактом, составило - 539 193,31 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 387 427,04 тыс. рублей; краевой бюджет - 151 766,27 тыс. рублей;

Исполненные обязательства составили - 542 481,08 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 387 427,04 тыс. рублей; краевой бюджет - 155 054,04 тыс. рублей;

В соответствии с пунктом 8.15 контракта, установлена обязанность Подрядчика предоставить обеспечение исполнения гарантийных обязательств. Данное обеспечение ООО "ТехПромАтлант" не предоставлено. Ввиду вышеизложенного КГКУ "УКС Приморского края" окончательный расчет не произведен.

КГКУ "УКС Приморского края", в рамках строительства ОКС, были заключены следующие контракты:

- от 10.04.2023 № 775/Р/30/ЕП на выполнение подрядных работ по подготовке проектной документации по объекту капитального строительства: "Строительство крытого тренировочного катка в г. Находка, софинансируемого за счет федерального бюджета". Мероприятия по укреплению откоса в южной части территории катка с ООО "ЛТ-проект" на сумму 271,21 тыс. рублей;

на корректировку проектной сметной документации разделов строительства ОКС с ООО "СМУ-125":

- от 11.04.2023 № 775/Р/32/ЕП на сумму 565,06 тыс. рублей (корректировка разделов: ПЗУ "Схема планировочной организации земельного участка", ИОС 3.2 "Наружная система водоотведения", ИОС 4.3 «Тепломеханические решения», ИОС 4.4 "Наружные тепловые сети";

- от 11.04.2023 № 775/Р/33/ЕП на сумму 561,88 тыс. рублей (корректировка разделов: ПЗ "Пояснительная записка", ИОС 1.1 "Внутреннее электроснабжение. Молниезащита", ИОС 1.2 "Наружное электроснабжение", ИОС 5.4 "Автоматизация теплового пункта», ПОС "Проект организации строительства", СМ Раздел 11 "Смета на строительство объекта капитального строительства".

- от 02.05.2023 № 18/23эс/775/У/41/ЕП на проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения с КГАУ "Примгосэкспертиза" на сумму 192,76 тыс. рублей.

Корректировка проектной документации в части монтажа и пусконаладки технологического оборудования, разночтения в части геологических изысканий, а именно: несоответствие основания ледового поля проектным изысканиям, необходимость включения в контракт условий о подключениях (технологического присоединения) ОКС к сетям электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения привели к заключению дополнительных соглашений, которыми увеличены сроки исполнения контракта на 215 дней (дополнительное соглашение от 31.10.2022 № 4 - 20 дней (по 20.11.2022); дополнительное соглашение от 06.06.2023 № 8 - 178 дней

(по 01.12.2023); дополнительное соглашение от 22.02.2024 № 14 - 17 дней (по 10.03.2024)).

На периоды с 01.10.2022 по 30.10.2022 (29 дней), с 21.11.2022 по 05.06.2023 (196 дней), с 02.12.2023 по 10.03.2024 (99 дней) дополнительные соглашения о продлении срока исполнения контракта не заключались.

Общее количество дней продления срока исполнения контракта составило 539 дней.

Также дополнительные соглашения заключались в части увеличения цены контракта, которое составило 223 764,74 тыс. рублей:

- от 02.12.2022 № 5 на 66 557,05 тыс. рублей (удорожание строительных материалов);

- от 06.06.2023 № 8 на 24 681,92 тыс. рублей (технологическое присоединение объекта к сетям электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения);

- от 09.08.2023 № 9 на 1 733,55 тыс. рублей (обоснование отсутствует);

- от 22.02.2024 № 14 на 130 792,22 тыс. рублей (корректировкой проектной документации, включен монтаж и пусконаладка технологического оборудования).

На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия, объект введен в эксплуатацию 24.02.2024, поставлен на кадастровый учет 29.02.2024 (кадастровый номер объекта 25:31:010404:8974).

В соответствии с распоряжением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 03.10.2024 № 463-р "О принятии в казну и закреплении имущества на праве оперативного управления за государственным автономным учреждением дополнительного образования Приморского края "Краевая спортивная школа олимпийского резерва" право оперативного управления ГАУ ДО ПК "КСШОР" на вышеуказанный объект недвижимости зарегистрировано в ЕГРН от 04.10.2024.

В период проведения экспертно-аналитического мероприятия, сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края совместно с представителями КГКУ "УКС Приморского края", министерства спорта ПК, министерства строительства ПК, осуществлен выезд на Объект.

В ходе осмотра установлено, что ОКС функционирует, технологическое оборудование работает, на ледовой площадке проводятся занятия. Персонал находится на рабочих местах, обеспечен доступ посетителей. Информация, о выявленных недостатках, отражена в (Приложение 6).



Фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края 18.05.2026

7.5.2.3. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе в рамках исполнения государственного контракта от 28.03.2022 № 28/Р-06-2022-ГК (№ 2254025253522000003) заключенного между КГКУ "УКС Приморского края", именуемое в дальнейшем "Заказчик" и ООО ДВСК "Стройград", именуемое в дальнейшем "Подрядчик" на сумму 438 142,88 тыс. рублей (первоначальная стоимость объекта - 429 976,44 тыс. рублей).

Основные технико-экономические показатели Объекта отражены в таблице.

Таблица 21

Площадь земельного участка, м ²	20 414,00
--	-----------

Общая площадь зданий, м ²	3 990,7
Строительный объем, м ³	27 246,0
Площадь застройки зданий, м ²	2 683,5
Количество этажей	2

Итоговое финансирование обязательств, предусмотренных контрактом, составило - 438 142,88 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 308 973,13 тыс. рублей; краевой бюджет – 129 169,75 тыс. рублей;

Исполненные обязательств составили - 438 142,88 тыс. рублей, из них: Федеральный бюджет - 308 973,13 тыс. рублей; Краевой бюджет - 129 169,75 тыс. рублей;

Срок выполнения работ первоначально установлен с 28.03.2022 по 30.11.2023. В последствии продлен до 25.08.2025.

Дополнительным соглашением от 04.03.2024 № 16 к контракту срок окончания работ продлен на 275 дней (по 31.08.2024) в связи с неблагоприятными погодными условиями и чрезвычайными ситуациями регионального характера (постановления Губернатора Приморского края от: 16.07.2022 № 65-пг⁵⁰; от 19.07.2022 № 68-пг⁵¹; от 28.09.2022 № 82-пг⁵²; от 15.08.2023 № 45-пг⁵³).

Помимо этого, ООО ДВСК "Стройград" не смогло выполнить работы в установленный контрактом срок, в связи со следующим.

В процессе выполнения работ по Контракту выявлен ряд несоответствий: в части последовательности выполняемых работ и существующего графика из-за его некорректного планирования; отсутствие возможности прокладки наружной сети водоотведения по проекту, требующее согласования как самих материалов, так и проектных решений с Заказчиком; отсутствие в проектной документации дизайнерских решений по внутренней отделке помещений Объекта (цветовая гамма, материалы, используемые при отделке и пр.) и технологического оборудования, что потребовало разработки дизайн-проекта Объекта и его согласование с КГКУ "УКС Приморского края"; удлинение маршрута логистики по индивидуальным материалам и конструкциям вследствие сложившейся экономической ситуации.

Кроме того, сроки окончания работ также переносились путем заключения следующих дополнительных соглашений к контракту:

от 30.08.2024 № 18 срок выполнения работ продлен до 30.11.2024 (91 день);

⁵⁰ Постановление Губернатора Приморского края от 16.07.2022 № 65-пг "О введении на территории Приморского края режима чрезвычайной ситуации регионального характера".

⁵¹ Постановление Губернатора Приморского края от 19.07.2022 № 68-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 16 июля 2022 года № 65-пг "О введении на территории Приморского края режима чрезвычайной ситуации межмуниципального характера регионального уровня реагирования".

⁵² Постановление Губернатора Приморского края от 28.09.2022 № 82-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 16 июля 2022 года № 65-пг "О введении на территории Приморского края режима чрезвычайной ситуации регионального характера".

⁵³ Постановление Губернатора Приморского края от 15.08.2023 № 45-пг "О чрезвычайной ситуации регионального характера".

от 29.11.2024 № 19 срок выполнения работ продлен до 29.12.2024 (29 дней);

в период с 29.12.2024 по 13.03.2025 дополнительные соглашения о продлении срока исполнения контракта не заключались (74 дня);

от 13.03.2025 № 20 срок выполнения работ продлен до 29.03.2025 (16 дней);

в период с 29.03.2025 по 25.08.2025 дополнительные соглашения о продлении срока исполнения контракта не заключались (149 дней).

Общее количество дней продления работ по контракту составило 634 дня.

Приказом от 22.08.2025 № 254 инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, утверждено "Заключение" от 22.08.2025 № 75/25 о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требования проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборам учета используемых энергетических ресурсов.

Администрацией муниципального округа город Партизанск Приморского края выдано разрешение КГКУ "УКС Приморского края" на ввод объекта в эксплуатацию от 25.08.2025 № RU-25-309000-07-2025, 29.08.2025 ОКС зарегистрирован и поставлен на кадастровый учет (кадастровый номер 25:33:180123:4729).

Техническая готовность объекта составляет – 100 %.

На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия подрядчиком устраняются выявленные замечания приемочной комиссии, проводится работа по постановке объекта на баланс.

В период проведения экспертно-аналитического мероприятия, сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края совместно с представителями КГКУ "УКС Приморского края", министерства спорта ПК, министерства строительства ПК, ГАУ ДО ПК "КСШОР", осуществлен выезд на Объект. Информация, полученная в ходе осмотра Объекта, отражена в (Приложение 6).

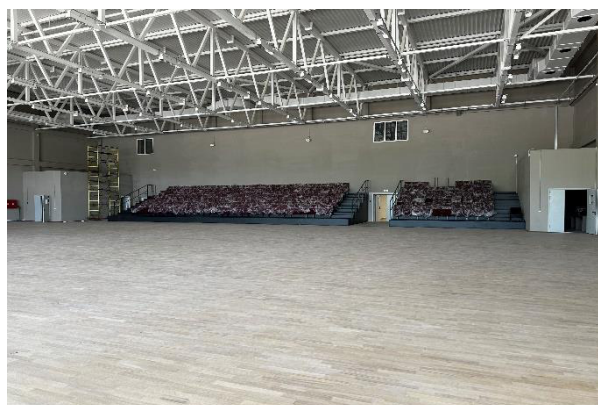


Фото сделано сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края 18.05.2026

7.5.2.4. Строительство ледового катка в пгт. Кавалерово осуществляется в рамках исполнения государственного контракта от 30.06.2021 № 09/Р-07-2021-ГК (№ 2254025253521000016) заключенного между КГКУ "УКС Приморского края" и ООО "ТехПромАтлант" на сумму

434 935,77 тыс. рублей (первоначальная стоимость объекта - 306 908,53 тыс. рублей).

Основные технико-экономические показатели отражены в таблице.

Таблица 22

Количество этажей	2
Общая площадь здания, м2	6 745,5 м2
Строительный объем	33 597,3 м3
Количество зрителей	150 чел.

Итоговое финансирование обязательств, предусмотренных контрактом, составило - 405 844,11 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 359 574,33 тыс. рублей; краевой бюджет – 46 269,78 тыс. рублей;

Исполненные обязательства составили - 118 217,98 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 115 853,62 тыс. рублей; краевой бюджет – 2 364,36 тыс. рублей.

Срок выполнения работ первоначально установлен с 01.07.2021 по 31.10.2022 (включительно). В последствии продлен до 31.12.2023, далее от 22.10.2024 контракт расторгнут.

На стадии реализации проекта выяснилось, что имеются разночтения с проектом, в связи с чем ООО "ТехПромАтлант" не смог приступить в срок к выполнению ряда работ, так как возникла необходимость внесения изменений в проектную документацию. Дополнительным соглашением от 25.11.2022 № 4 срок по контракту продлен на 50 дней (по 20.12.2022).

КГКУ "УКС Приморского края" заключен контракт от 11.04.2023 № 775/р/34/ЕП с ООО "СМУ-125" на корректировку проектной и рабочей документации на сумму 575,14 тыс. рублей (срок по 26.05.2023 не включая времени прохождения повторной государственной экспертизы проектной документации в рамках экспертного сопровождения). Срок подготовки рабочей документации - 25 дней с момента утверждения проектной документации. В связи с непредставлением откорректированной документации и окончанием срока действия контракта, контракт расторгнут в одностороннем порядке (решение от 24.05.2024 № 01-03-04/1368).

Дополнительным соглашением от 28.06.2023 № 7 продлен срок контракта в связи с необходимостью заключения с министерством имущественных и земельных отношений Приморского края дополнительного соглашения к договору безвозмездного пользования земельным участком от 13.07.2021 № 1088 о продлении срока использования земельного участка и продления разрешения на строительство от 22.07.2021 № 25-25503000-01-2021 (письмо подрядчика от 28.06.2023 № 6). Срок продлен на 115 дней (по 20.11.2023).

Дополнительными соглашениями цена контракта увеличилась на 128 027,24 тыс. рублей:

- от 14.12.2022 № 5 на 121 017,72 тыс. рублей (удорожание строительных материалов);

- от 28.06.2023 № 7 на 7 009,52 тыс. рублей.

Решением АС ПК от 05.08.2024 по делу № А51-12326/2024 дополнительное соглашение от 28.06.2023 № 7 признано недействительным, так как заключено в нарушение пункта 4 постановления Правительства РФ от 16.04.2022 № 680 в отсутствие письменного предложения подрядчика об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий контракта.

ООО "ТехПромАтлант" от 07.10.2024 принято решение об одностороннем расторжении государственного контракта от 30.06.2021 № 09/Р-07-2021-ГК (№ 2254025253521000016) с КГКУ "УКС Приморского края". Согласно данным ЕИС решение вступило в силу 22.10.2024.

23.12.2024 КГКУ "УКС Приморского края" обратилось с исковым заявлением в АС ПК к ООО "ТехПромАтлант" о взыскании суммы неотработанного аванса в размере 287 626,14 тыс. рублей, процентов за пользование чужими средствами за период с 22.10.2024 по 20.12.2024 в размере 11 965,25 тыс. рублей, а также по день вынесения судом решения и по день фактической уплаты долга истцу, исчисленные из расчета ключевой ставки, установленной Банком России на этот период.

Решением АС ПК от 17.04.2025 по делу № А51-24220/2024 постановлено взыскать с ООО "ТехПромАтлант" в пользу КГКУ "УСК ПК" 287 626,14 тыс. рублей неосновательного обогащения, 27 012,9 тыс. рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга 287 626,14 тыс. рублей за период с 04.04.2025 по день фактического исполнения обязательств, исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

На основании исполнительный листа № 051212064 судебным приставом-исполнителем 26.11.2025 вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства №493550/25/98025-ИП.

В настоящее время на запросы КГКУ "УКС Приморского края" поступает информация от судебных приставов об отсутствии у должника какого-либо имущества и счетов. Финансовых поступлений в адрес КГКУ "УКС Приморского края" не поступало.

В связи с расторжением 22.10.2024 контракта с ООО "ТехПромАтлант" от 30.06.2021 № 09/Р-07-2021-ГК (№ 2254025253521000016), строительно-монтажные работы на объекте с 08.12.2025 приостановлены.

В настоящее время КГКУ "УКС Приморского края" заключен государственный контракт от 24.04.2025 № 775/Р48/ЭА/2025 (№ 2254025253525000015) с ООО "СУ 117" на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства "Строительство ледового катка в пгт. Кавалерово" на сумму 228 658,02 тыс. рублей.

Кроме этого, с указанным подрядчиком заключено 2 государственных контракта: от 20.06.2025 №775/Р/74/ЕП/2025 с ООО "СУ 117" на сумму 592,00 тыс. рублей и от 24.07.2025 №775/Р/93/ЕП/2025 на сумму 599,15 тыс. рублей

на выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации по объекту капитального строительства.

Краевым государственным автономным учреждением "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края", утверждено положительное заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения от 19.05.2026 № 25-1-1-2-022001-2026 на основании заявления от 27.04.2026 № 2025/07/29/-00091 ООО "СУ 117".

Приказом от 04.06.2026 № 132-пр министерства строительства Приморского края утверждена проектно-сметная документация по объекту "Ледовый каток с размером поля 60х30 м в пгт. Кавалерово Кавалеровского района Приморского края".

В настоящее время КГКУ "УКС Приморского края" проводит расчет сметной стоимости контракта с целью определения объема работ для заключения дополнительного соглашения с ООО "СУ 117". После подписания дополнительного соглашения, планируется возобновление строительных работ на объекте капитального строительства.

На основании постановления Администрации Кавалеровского муниципального округа Приморского края от 03.04.2026 № 176 "О внесении изменений в разрешение на строительство ледового катка с размером ледового поля 60х30м в пгт. Кавалерово Кавалеровского района Приморского края на земельном участке с кадастровым номером 25:04:040017:892" установлен срок действия разрешения до 02.01.2027.

На 01.06.2026 техническая готовность ОКС составляет - 72,1 %.

На момент проверки завершены следующие работы: устройство наружного отопления и сетей водоснабжения; монтаж металлоконструкций; устройство профнастила на плиту перекрытия; монтаж косоуров лестниц, монтаж сэндвич панелей стеновых и кровельных; бетонирование плит перекрытия; армирование лифтовой шахты; армирование и бетонирование цоколя; устройство ледового поля.

Заключены договоры на технические условия: электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, связь.

Строительство ледового катка в пгт. Кавалерово продолжится в рамках нового федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта" ввиду завершения регионального проекта "Спорт-норма жизни" в 2024 году.



Фото объекта на 18.03.2026, предоставлены министерством строительства Приморского края.

7.5.2.5. Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске осуществляется в рамках исполнения государственного контракта от 11.04.2023 № 775/Р/31/ЭА (№ 2254025253523000003) заключенного между КГКУ "УКС Приморского края", именуемое в дальнейшем "Заказчик" и ООО "ГАММА-ТЕХНОЛОГИЯ", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", на сумму 405 720,64 тыс. рублей (первоначальная стоимость объекта - 388 782,24 тыс. рублей).

Основные технико-экономические показатели отражены в таблице.

Таблица 23

Площадь земельного участка, га	21 949,0
Строительный объем, м ³	32 143,8
Общая площадь здания, м ²	3 597,4
Количество этажей	2
Мощность	300 мест на трибунах

Итоговое финансирование обязательств, предусмотренных контрактом, составило – 275 663,66 тыс. рублей (краевой бюджет).

Исполненные обязательства составили – 189 981,92 тыс. рублей (Краевой бюджет).

Срок выполнения работ первоначально установлен с 11.04.2023 по 30.09.2024. В последствии продлен до 30.09.2025. На 01.06.2026 строительство объекта не завершено.

К государственному контракту от 11.04.2023 № 775/Р/31/ЭА были заключены 8 дополнительных соглашений, в том числе увеличившие стоимость контракта:

- от 05.10.2023 № 3 на 16 473,90 тыс. рублей (технологическое присоединение, заключены договоры с КГУП "Примтеплоэнерго" № 93-0022-23-ХВС, № 73-0022-23-ВО);
- от 25.12.2023 № 4 на 464,50 тыс. рублей (технологическое присоединение, заключен договор с КГУП "Примтеплоэнерго" № 123-0022-23-ТП).

В связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации, между КГКУ "УКС Приморского края" и ООО "Архибат" заключен государственный контракт от 29.08.2024 № 775/Р/66/ЕП/2024 на выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации по объекту капитального строительства "Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске, в том числе проектно-изыскательные работы" на сумму 597,00 тыс. рублей. Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта в течение 60 дней, без учета времени на прохождение государственной экспертизы проектной документации.

КГАУ "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края" утверждено положительное заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения от 28.05.2025 № 046-2025 на ОКС.

КГАУ "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края" выдано положительное заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения от 27.08.2025 № 25-1-1-2-050255-2025 на ОКС. По результатам заключения государственной экспертизы сметная стоимость строительства объекта составила 452 173, 66 тыс. рублей (в текущем уровне цен).

В связи с необходимостью корректировки ПСД и заключением дополнительных соглашений на увеличение цены и продление сроков выполнения работ по Контракту строительно-монтажные работы с 03.08.2025 приостановлены.

На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия выполнены следующие работы: разработана рабочая документация, выполнены подготовительные и демонтажные, земляные работы, осуществлено устройство фундаментов, установка анкерных групп и бетонирование колонн и балок; работы по прокладке сети водопровода; работы по прокладке теплотрассы; работы по прокладке сетей дождевой канализации; работы по прокладке сетей хозяйственной канализации; конструкция металлокаркаса; работы по устройству ледового поля; монтаж холодильной установки; ограждающие конструкции основного здания и одноэтажной пристройки; устройство внутреннего дренажа; бетонирование плиты перекрытия 1 этаж АБЧ.

Заключены договоры на технические условия: электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, связь.

Техническая готовность ОКС на 18.05.2026 года составляет - 48,5 %.

Строительство Объекта продолжится в рамках нового федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта".



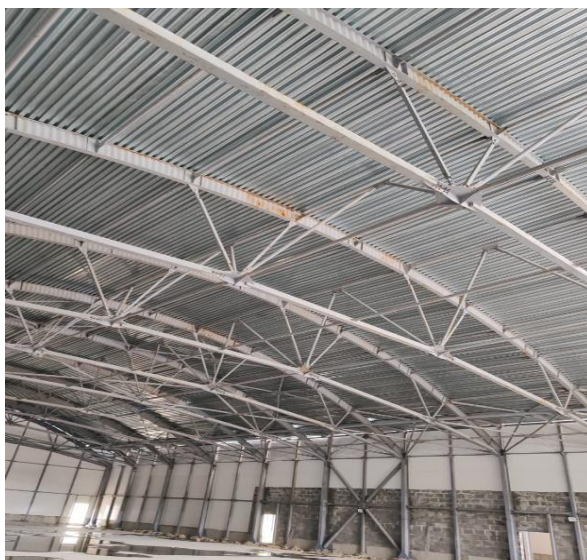


Фото объекта предоставлены министерством строительства Приморского края.

8. Выводы:

8.1. Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" (краткое наименование "Спорт – норма жизни") реализуется в рамках соответствующего федерального проекта, являющегося составной частью национального проекта "Демография".

Ключевым целевым показателем национального проекта "Демография" является увеличение к 2030 году до 70 % доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Достижению данной цели способствует федеральный проект "Спорт – норма жизни", цель которого доведение к концу 2024 года до 57,8 % и к 2030 году до 70 % доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры, а также повышение к концу 2024 года до 62 % и к 2030 году до 74 % уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями.

Показатели федерального проекта декомпозированы на уровень субъектов РФ и установлены для Приморского края в следующих значениях: повышение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 59,9 % к концу 2024 года, и повышение в регионе уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности до 62,1 % к концу 2024 года.

Вместе с тем в ходе анализа выявлено различие на уровне устанавливаемых ориентиров: в Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года и в государственной программе

Приморского края индикатор показателя "Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом" на конец 2024 года (56,2 %) не увязан со значением данного показателя, установленного в паспортах регионального проекта на 2024 год и федерального проекта, что не соответствует требованиям Порядка № 256-пп.

8.2. В проверяемом периоде бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий РП "Спорт – норма жизни" предусмотрены паспортом Проекта на 2023 год в сумме 771 413,60 тыс. рублей, на 2024 год – 336 361,72 тыс. рублей; государственной программой Приморского края на 2023 год в объеме 961 235,91 тыс. рублей, на 2024 год – 213 905,42 тыс. рублей; адресными инвестиционными программами Приморского края на 2023 год в сумме 753 599,52 тыс. рублей, на 2024 год – 200 647,23 тыс. рублей.

Законами Приморского края о краевом бюджете расходы на мероприятия РП "Спорт – норма жизни" утверждены на 2023 год в сумме 757 611,80 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 266 361,72 тыс. рублей.

8.3. В целях софинансирования расходов на мероприятия Проекта между Министерством спорта Российской Федерации и Правительством Приморского края заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета в 2023–2024 финансовых годах бюджету Приморского края субсидий по следующим направлениям:

на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки в 2023 году в сумме 9 134,90 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 8 485,90 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в 2023 году в сумме 4 576,60 тыс. рублей;

на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние в 2023 году в сумме 3 746,30 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 3 006,60 тыс. рублей;

на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации для занятий физической культурой и спортом в 2023 году в сумме 518 942,80 тыс. рублей, в 2024 году – 22 045,21 тыс. рублей.

8.4. Кассовые расходы Министерства спорта ПК за 2023 и 2024 годы составили 875 513,28 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 681 090,04 тыс. рублей, или 88,3 % от плановых назначений (771 413,61 тыс. рублей), в том числе средства федерального бюджета – 453 049,34 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 228 040,70 тыс. рублей;

в 2024 году – 194 423,25 тыс. рублей, или 90,9 % от плановых назначений (213 817,44 тыс. рублей), в том числе средства федерального бюджета – 33 114,75 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 161 308,50 тыс. рублей.

8.5. При проведении закупок спортивного оборудования и инвентаря ГАУ ДО ПК "КСШОР", действовавшим в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, а также муниципальными бюджетными (или автономными) спортивными организациями, осуществлявшими закупки в рамках мероприятия по оказанию государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ (или № 223-ФЗ – для автономных учреждений), доля закупок у единственного поставщика составила 100 %.

При этом согласно статье 1 Закона № 223-ФЗ целями регулирования данного закона являются в том числе эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчиков и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, предотвращение коррупции и других злоупотреблений. Использование при закупках только неконкурентных закупочных процедур ведет к нереализации целей, установленных Законом № 223-ФЗ.

8.6. Установленные региональным проектом результаты достигнуты частично.

В 2023 и 2024 годах достигнуты результаты по следующим направлениям:

- поставка нового спортивного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва;
- оказание государственной поддержки организациям, входящим в систему спортивной подготовки;
- поставка комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля).

Показатели результата "строительство и ввод в эксплуатацию объектов спорта региональной (муниципальной) собственности", предусматривающего паспорт на 2023 год строительство 5 объектов спортивной инфраструктуры, полностью не достигнуты в двух отчетных периодах.

В 2023 году установленный плановый показатель результата – "крытый тренировочный каток в г. Находка" введен в эксплуатацию" – не выполнен. Техническая готовность объекта на 01.01.2024 составляла 99 %. Объект введен в эксплуатацию 24.02.2024 (получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 25-31-04-2024) и 29.02.2024 поставлен на кадастровый учет (кадастровый номер 25:31:010404:8974).

В 2024 году в связи с секвестированием средств федерального бюджета объект "Крытый тренировочный каток в г. Дальнегорске" исключен из паспорта РП на 2024 год.

Установленный на 2024 год результат – ввод в эксплуатацию объектов "крытый футбольный манеж в г. Владивостоке", "физкультурно-

оздоровительный комплекс в г. Партизанске", "ледовый каток в пгт. Кавалерово" – не достигнут согласно Отчету на 2024 год.

8.7. Установленные РП "Спорт – норма жизни" целевые эффекты достигнуты частично:

в 2023–2024 годах с опережением выполнен показатель "доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом" (в 2023 году на 5,9 % и в 2024 году на 1,6 % выше запланированного значения);

в 2023–2024 годах не достигнуто плановое значение показателя "уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности" (в 2023 году на 0,5 % и в 2024 году на 11,1 % ниже запланированного значения).

При этом корректность отчетных данных за 2024 год в ходе проведенной проверки не нашла подтверждения: согласно официальным статистическим данным Министерства спорта России за 2024 год, показатель "доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом" составил 61,4 %, показатель "уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности" составил 57,5 %.

Вместе с тем необходимо отметить, что целевой показатель регионального проекта "доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом" взаимоувязан с мероприятиями государственной программы ПК по развитию спорта высших достижений (приобретение спортивного оборудования и инвентаря для ГАУ ДО ПК "КСШОР"; государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва).

В то время как целевым ориентиром национального и федерального проектов является создание условий для массового спорта и привлечения к регулярным занятиям физической культурой всех категорий населения.

Таким образом, невозможно проследить прямую связь между реализуемыми мероприятиями и фактическим увеличением численности систематически занимающихся: мероприятия программы преимущественно направлены на поддержку спортивного резерва и достижение высоких спортивных результатов, вместе с тем задачи массового вовлечения населения в регулярные занятия физической культурой остаются без финансирования, что свидетельствует о формальном подходе к достижению целевых показателей.

8.8. Эффективность использования бюджетных средств на реализацию мероприятий регионального проекта в целом оценивается как недостаточная, что обусловлено наличием объектов незавершенного строительства.

В рамках РП "Спорт – норма жизни" не обеспечено создание запланированного количества спортивных объектов, учитывая, что вклад данных мероприятий Проекта в достижения его показателей являлся основным.

8.9. Реализация инфраструктурной части регионального проекта имеет низкий процент исполнения. Выявлены системные нарушения и недостатки на

всех этапах – от планирования до ввода объектов в эксплуатацию, что привело к срыву сроков, значительному удорожанию и потери бюджетных средств.

8.10. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов спорта региональной (муниципальной) собственности регионального проекта "Спорт–норма жизни", Заказчиком по которым является КГКУ "УКС Приморского края", выполнены частично, из 5 запланированных объектов, введены в эксплуатацию только 2, а именно:

"Строительство крытого тренировочного катка в г. Находка, софинансируемого за счет средств федерального бюджета" – объект введен в эксплуатацию 24.02.2024 с нарушением первоначальных сроков, установленных контрактом. Общее количество дней продления срока исполнения контракта составило 539 дней;

"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы" введен в эксплуатацию 25.08.2025. Общее количество дней продления срока исполнения контракта составило 634 дня. На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия подрядчик ООО ДВСК "Стройград" устраняет замечания, выявленные приемочной комиссией.

8.10.1. По объекту "Строительство крытого футбольного манежа в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы" крайне низкая степень технической готовности – 2,5 %. Государственный контракт от 07.04.2023 № 775/Р/29/ЭА (№ 2254025253523000002) с ООО "ТехПромАтлант" расторгнут 22.10.2024. В настоящее время КГКУ "УКС Приморского края" подготовлено техническое задание на выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации, проводятся работы по определению стоимости инструментального обследования буронабивных свай, с составлением сметной стоимости обследования и прохождением государственной экспертизы в части проверки сметной документации на соответствие действующим сметным нормативам. Расходы на строительство указанного объекта не запланированы законом о краевом бюджете на будущий период.

8.10.2. "Строительство ледового катка в пгт. Кавалерово, софинансируемого за счет средств федерального бюджета". На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия техническая готовность объекта составляет – 72,1 %. Первоначальный государственный контракт от 30.06.2021 № 09/Р-07-2021-ГК (№ 2254025253521000016) с ООО "ТехПромАтлант" расторгнут 22.10.2024. В настоящее время КГКУ "УКС Приморского края" заключен государственный контракт от 24.04.2025 № 775/Р48/ЭА/2025 (№ 2254025253525000015) с ООО "СУ 117" на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства "Строительство ледового катка в пгт. Кавалерово" на сумму 228 658,02 тыс. рублей. Кроме этого, с указанным подрядчиком заключено 2 государственных контракта: от 20.06.2025 №775/Р/74/ЕП/2025 с ООО "СУ 117" на сумму 592,00 тыс. рублей и от 24.07.2025 №775/Р/93/ЕП/2025 на сумму 599,15 тыс.

рублей на выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации по объекту капитального строительства.

8.10.3. "Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске, в том числе проектно-изыскательские работы". На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия техническая готовность объекта составляет – 48,5 %. Строительно-монтажные работы с 03.08.2025 приостановлены в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации.

8.11. В связи с завершением регионального проекта "Спорт – норма жизни" в 2024 году, значительная часть работ, направленных на завершение недостроенных объектов и их финансирование продолжится в рамках нового федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта", что свидетельствует о системных проблемах в планировании, организации и контроле за ходом строительства.

9. Предложения (рекомендации)

9.1. Министерству спорта и физической культуры Приморского края, как ответственному исполнителю, усилить контроль за сроками проектирования и создания объектов спортивной инфраструктуры в целях обеспечения результатов реализации национальных, региональных проектов и государственных программ.

9.2. По результатам экспертно-аналитического мероприятия отчет об экспертно-аналитическом мероприятии направить в Законодательное Собрание Приморского края, Губернатору Приморского края, Министерству спорта и физической культуры Приморского края.

Руководитель экспертно-аналитического мероприятия –
заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты
Приморского края



Е.В. Ильиченко

Приложение 1

Наименование результата	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего в 2023-2024 (тыс. рублей)		
	2023			2024					
	Всего	ФБ	КБ	Всего	ФБ	КБ	Всего	ФБ	КБ
паспорт РП за 2023 год (утвержден 31.01.2023)									
Результат 1 "В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь"	3 822,76	3 746,30	76,46	3 969,80	3 890,40	79,40	7 792,56	7 636,70	155,86
Результат 2 "В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий подготовки спортивного резерва" ⁵⁴	9 321,33	9 134,90	186,43	9 748,16	9 553,20	194,96	19 069,49	18 688,10	381,39
Результат 3 "Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)"	4 670,00	4 576,60	93,40	0,00	0,00	0,00	4 670,00	4 576,60	93,40
Результат 4 "Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты спорта региональной (муниципальной) собственности"	745 450,00	505 141,00	240 309,00	336 249,18	329 524,20	6 724,98	1 081 699,18	834 665,20	247 033,98
ВСЕГО	763 264,09	522 598,80	240 665,29	349 967,14	342 967,80	6 999,34	1 113 231,23	865 566,60	247 664,63
паспорт РП за 2024 год (утвержден 31.01.2024)									
Результат 1 "В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь"	3 822,76	3 746,30	76,46	3 128,96	3 067,60	61,36	6 951,72	6 813,90	137,82
Результат 2 "В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий подготовки спортивного резерва"	9 321,33	9 134,90	186,43	10 102,26	8 485,90	1 616,36	19 423,59	17 620,80	1 802,79
Результат 3 "Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)"	4 670,00	4 576,60	93,40	0,00	0,00	0,00	4 670,00	4 576,60	93,40
Результат 4 "Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты спорта региональной (муниципальной) собственности"	753 599,52	518 942,80	234 656,72	812 181,58	139 359,10	672 822,48	1 565 781,10	658 301,90	907 479,20
ВСЕГО	771 413,61	536 400,60	235 013,01	825 412,80	150 912,60	674 500,20	1 596 826,41	687 313,20	909 513,21
паспорт РП за 2024 год (в редакции от 28.12.2024)									
Результат 1 "В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь"	3 822,76	3 746,30	76,46	3 067,96	3 006,60	61,36	6 890,72	6 752,90	137,82
Результат 2 "В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий подготовки спортивного резерва"	9 321,33	9 134,90	186,43	10 102,26	8 485,90	1 616,36	19 423,59	17 620,80	1 802,79
Результат 3 "Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)"	4 670,00	4 576,60	93,40	0,00	0,00	0,00	4 670,00	4 576,60	93,40
Результат 4 "Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты спорта региональной (муниципальной) собственности"	753 599,52	518 942,80	234 656,72	323 191,50	67 658,60	255 532,90	1 076 791,02	586 601,40	490 189,62
ВСЕГО	771 413,61	536 400,60	235 013,01	336 361,72	79 151,10	257 210,62	1 107 775,32	615 551,70	492 223,62

⁵⁴ В ред. от 31.01.2024, прежнее название: "Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка".

Приложение 2

Соглашения в период 2023-2024 годов		Объем субсидий, предусмотренный Соглашениями (тыс. рублей)						уровень софинансирования, %
		2023		2024		Итого за 2023-2024		
дата, №	предмет	Общий объем	Субсидия из ФБ	Общий объем	Субсидия из ФБ	Общий объем	Субсидия из ФБ	
№ 777-08-2019-043 от 05.02.2019 (основное)	государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки (764/1103/092P550810/000)							
в ред. ДС № 777-08-2019-043/5 от 16.12.2022		9 321,33	9 134,90	9 748,16	9 553,20	19 069,49	18 688,10	2023: 98% 2024: 98%
в ред. ДС № 777-08-2019-043/6 от 25.12.2023		9 321,33	9 134,90	10 102,26	8 485,90	19 423,59	17 620,80	2023: 98% 2024: 84%
№ 777-08-2019-200 от 08.02.2019 (основное)	реализация мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (764.1102.091P552280.521)							
в ред. ДС № 777-08-2019-200/11 от 16.12.2022		4 670,00	4 576,60	0,00	0,00	4 670,00	4 576,60	2023: 98%
№ 777-09-2020-059 от 17.12.2019 (основное)	приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние нормативное состояние (764/1103/092P552290/622)							
в ред. ДС № 777-09-2020-059/8 от 20.12.2022		3 822,76	3 746,30	3 969,80	3 890,40	7 792,55	7 636,70	2023: 98% 2024: 98%
в ред. ДС № 777-09-2020-059/9 от 25.12.2023		3 822,76	3 746,30	3 067,96	3 006,60	6 890,71	6 752,90	2023: 98% 2024: 98%
№ 777-09-2020-091 от 23.12.2019 (основное)	создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной (муниципальной) собственности (764/1103/092P551390/410)							
в ред. ДС № 777-09-2020-091/8 от 28.12.2022		515 450,00	505 141,00	336 249,18	329 524,20	851 699,18	834 665,20	2023: 98% 2024: 98%
в ред. ДС № 777-09-2020-091/10 от 31.03.2023		529 533,47	518 942,80	336 249,18	329 524,20	865 782,65	848 467,00	2023: 98% 2024: 98%
в ред. ДС № 777-09-2020-091/11 от 25.12.2023		529 533,47	518 942,80	142 203,16	139 359,10	671 736,63	658 301,90	2023: 98% 2024: 98%
в ред. ДС № 777-09-2020-091/12 от 01.02.2024		444 481,17	435 591,55	142 203,16	139 359,10	586 684,33	574 950,65	2023: 98% 2024: 98%
в ред. ДС № 777-09-2020-091/13 от 20.03.2024		444 481,17	435 591,55	209 934,90	205 735,20	654 416,07	641 326,75	2023: 98% 2024: 98%
в ред. ДС № 777-09-2020-091/14 от 22.10.2024		444 481,17	435 591,55	69 039,39	67 658,60	513 520,56	503 250,15	2023: 98% 2024: 98%
в ред. ДС № 777-09-2020-091/15 от 16.12.2024		444 481,17	435 591,55	22 495,12	22 045,21	466 976,29	457 636,76	2023: 98% 2024: 98%
в ред. ДС № 777-09-2020-091/16 от 27.12.2024		444 481,17	435 591,55	22 495,12	22 045,21	466 976,29	457 636,76	2023: 98% 2024: 98%
Итого	-	462 295,25	453 049,35	35 665,34	33 537,71	497 960,59	486 587,06	-

Приложение 3

Наименование целевой статьи расходов	Утверждено			Кассовый расход	% исполне ния	неисполне нный остаток
	Законом о краевом бюджете		Сводной бюджетной росписью			
	первоначаль ная редакция	последняя редакция				
1	2	3	4	5	6	7
2023 год						
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (строительство крытого футбольного манежа в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы) (КБК 775.1102.091P551391.414)	360 027,14	369 364,19	369 364,19	369 364,19	100,0	0,00
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы) (КБК 775.1102.091P551393.414)	185 422,86	155 704,53	155 422,86	70 935,71	45,6	84 487,15
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (строительство крытого тренировочного катка в г. Находка) (КБК 775.1102.091P551394.414)	0,00	463,96	14 547,43	13 982,28	96,1	565,15
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (строительство ледового катка в пгт Кавалерово) (КБК 775.1102.091P551395.414)	0,00	15 552,56	15 552,56	15 552,56	100,0	0,00
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске) (КБК 775.1102.091P551396.414)	200 000,00	198 712,48	198 712,48	193 441,22	97,3	5 271,26
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (764.1102.091P552280.521)	4 670,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	100,0	0,00
Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки	9 321,33	9 321,33	9 321,33	9 321,33	100,0	0,00
Субсидии автономным учреждениям (КБК 764.1103.091P550810.621)	5 811,02	5 811,02	5 811,02	5 811,02	100,0	0,00
Межбюджетные трансферты (КБК 764.1103.091P550810.521)	3 510,31	3 510,31	3 510,31	3 510,31	100,0	0,00
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние (КБК 764.1103.091P552290.621)	3 822,76	3 822,76	3 822,76	3 822,76	100,0	0,00
Итого по Проекту за 2023 год	763 264,09	757 611,81	771 413,61	681 090,04	88,3	90 323,57
2024 год						
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (строительство крытого футбольного манежа в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы) (КБК 775.1102.091P551391.414)	762 181,58	11 286,07	11 286,07	1 307,65	11,6	9 978,42
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы) (КБК 775.1102.091P551393.414)	0,00	88 645,15	36 100,87	35 505,38	98,4	595,49

Наименование целевой статьи расходов	Утверждено			Кассовый расход	% исполне ния	неисполне нный остаток
	Законом о краевом бюджете		Сводной бюджетной росписью			
	первоначаль ная редакция	последняя редакция				
1	2	3	4	5	6	7
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (строительство крытого тренировочного катка в г. Находка) (КБК 775.1102.091P551394.414)	0,00	149 214,16	149 214,16	144 424,70	96,8	4 789,46
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (строительство ледового катка в пгт Кавалерово) (КБК 775.1102.091P551395.414)	50 000,00	4 046,12	4 046,12	15,29	0,4	4 030,83
Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки	10 102,26	10 102,26	10 102,26	10 102,26	100,0	0,00
Субсидии автономным учреждениям (КБК 764.1103.091P550810.621)	6 304,54	6 304,54	6 304,54	6 304,54	100,0	0,00
Межбюджетные трансферты (КБК 764.1103.091P550810.521)	3 797,72	3 797,72	3 797,72	3 797,72	100,0	0,00
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние (КБК 764.1103.091P552290.621)	3 067,96	3 067,96	3 067,96	3 067,96	100,0	0,00
Итого по Проекту за 2024 год	825 351,80	266 361,72	213 817,44	194 423,25	90,9	19 394,20

Приложение 4
Таблица 1

объекты капитального строительства	АИП на 2023 год						
	Капитальные вложения в объекты капитального строительства в редакции постановлений Правительства ПК (тыс. рублей)						
	от 21.12.2022 № 890-пп	от 06.03.2023 № 138-пп	от 04.04.2023 № 226-пп	от 03.05.2023 № 289-пп	от 15.09.2023 № 641-пп	от 06.10.2023 № 689-пп	от 28.12.2023 № 971-пп
Строительство крытого тренировочного катка в г. Находка, софинансируемого за счет средств федерального бюджета 775.09.1102.00.011	--	--	95 234,31	109 317,78	109 317,78	109 317,78	14 547,43
за счет средств федерального бюджета	--	--	0,00	13 801,80	13 801,80	13 801,80	13 801,80
за счет средств краевого бюджета	--	--	95 234,31	95 515,98	95 515,98	95 515,98	745,63
Строительство крытого футбольного манежа в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы 775.09.1102.00.013	360 027,14	360 027,14	369 364,19	369 364,19	369 364,19	369 364,19	369 364,19
за счет средств федерального бюджета	352 826,60	352 826,60	352 826,60	352 826,60	352 826,60	352 826,60	352 826,60
за счет средств краевого бюджета	7 200,54	7 200,54	16 537,59	16 537,59	16 537,59	16 537,59	16 537,59
Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске, в том числе проектно-изыскательские работы 775.09.1102.00.016	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	198 712,48
за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств краевого бюджета	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	198 712,48
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы, софинансируемые за счет средств федерального бюджета 775.09.1102.00.017	185 422,86	185 422,86	185 422,86	185 141,19	185 141,19	185 141,19	155 422,86
за счет средств федерального бюджета	152 314,40	152 314,40	152 314,40	152 314,40	152 314,40	152 314,40	152 314,40
за счет средств краевого бюджета	33 108,46	33 108,46	33 108,46	32 826,79	32 826,79	32 826,79	3 108,46
Строительство ледового катка в пгт Кавалерово, софинансируемого за счет средств федерального бюджета 775.09.1102.00.019	0,00	0,00	129 598,68	129 598,68	79 598,68	79 598,68	15 552,56
за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств краевого бюджета	0,00	0,00	129 598,68	129 598,68	79 598,68	79 598,68	15 552,56
Общий объем средств, из них:	745 450,00	745 450,00	979 620,03	993 421,83	943 421,83	943 421,83	753 599,52
<i>средства федерального бюджета</i>	<i>505 141,00</i>	<i>505 141,00</i>	<i>505 141,00</i>	<i>518 942,80</i>	<i>518 942,80</i>	<i>518 942,80</i>	<i>518 942,80</i>
<i>средства краевого бюджета</i>	<i>240 309,00</i>	<i>240 309,00</i>	<i>474 479,03</i>	<i>474 479,03</i>	<i>424 479,03</i>	<i>424 479,03</i>	<i>234 656,72</i>

объекты капитального строительства	АИП на 2024 год					
	Капитальные вложения в объекты капитального строительства в редакции постановлений Правительства ПК (тыс. рублей)					
	от 27.12.2023 № 956-пп	от 04.03.2024 № 129-пп	от 03.05.2024 № 285-пп	от 11.10.2024 № 692-пп	от 29.11.2024 № 814-пп	от 27.12.2024 № 945-пп
Строительство крытого тренировочного катка в г. Находка, софинансируемого за счет средств федерального бюджета 775.09.1102.00.011	--	169 849,06	170 414,16	154 214,16	149 214,16	149 214,16
за счет средств федерального бюджета	--	0,00	553,80	553,80	553,80	553,80
за счет средств краевого бюджета	--	169 849,06	169 860,36	153 660,36	148 660,36	148 660,36
Строительство крытого футбольного манежа в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы 775.09.1102.00.013	762 181,58	762 181,58	762 181,58	152 181,58	11 286,07	11 286,07
за счет средств федерального бюджета	139 359,10	139 359,10	139 359,10	139 359,10	1 281,50	1 281,50
за счет средств краевого бюджета	622 822,48	622 822,48	622 822,48	12 822,48	10 004,57	10 004,57
Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске, в том числе проектно-изыскательские работы 775.09.1102.00.016⁵⁵	277 505,68	284 064,46	284 064,46	94 064,46	74 064,46	74 064,46
за счет средств федерального бюджета	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств краевого бюджета	196 505,68	284 064,46	284 064,46	94 064,46	74 064,46	74 064,46
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы, софинансируемые за счет средств федерального бюджета 775.09.1102.00.017	--	91 478,52	158 645,15	158 645,15	158 645,15	36 100,88
за счет средств федерального бюджета	--	0,00	65 823,30	65 823,30	65 823,30	20 209,91
за счет средств краевого бюджета	--	91 478,52	92 821,85	92 821,85	92 821,85	15 890,96
Строительство ледового катка в пгт Кавалерово, софинансируемого за счет средств федерального бюджета 775.09.1102.00.019	50 000,00	114 046,12	114 046,12	34 046,12	4 046,12	4 046,12
за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств краевого бюджета	50 000,00	114 046,12	114 046,12	34 046,12	4 046,12	4 046,12
Общий объем средств, из них:	1 089 687,26	1 421 619,73	1 489 351,47	593 151,47	397 255,96	274 711,69
<i>средства федерального бюджета</i>	<i>220 359,10</i>	<i>139 359,10</i>	<i>205 736,20</i>	<i>205 736,20</i>	<i>67 658,60</i>	<i>22 045,21</i>
<i>средства краевого бюджета</i>	<i>869 328,16</i>	<i>1 282 260,63</i>	<i>1 283 615,27</i>	<i>387 415,27</i>	<i>329 597,36</i>	<i>252 666,47</i>

⁵⁵ В 2024 году мероприятие "Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске, в том числе проектно-изыскательские работы" реализуется за рамками регионального проекта "Спорт – норма жизни"; вследствие этого объемы капитальных вложений по данному объекту в 2024 году не подлежат отражению в учете показателей регионального проекта.



Фото 1-4. Малая спортивная площадка в Красноармейском муниципальном округе (с. Новопокровка, ул. Советская, 85)



Фото 5-7. Малая спортивная площадка в Лазовском муниципальном округе (с. Лазо, ул. Некрасовская, 9)

Акт осмотра
объектов спортивной инфраструктуры при выездной проверке

18.05.2026

г. Владивосток

В ходе выездного мероприятия от 18.05.2026 в рамках экспертно-аналитического мероприятия "Оценка эффективности реализации регионального проекта "Спорт – норма жизни" в рамках национального проекта "Демография" заместителем председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края Ильиченко Еленой Викторовной, главными инспекторами аппарата Контрольно-счетной палаты Приморского края Якуш Алексеем Евгеньевичем, Балябиной Еленой Евгеньевной (далее – сотрудники КПС ПК) в присутствии заместителя министра строительства Приморского края Ибрагимова Рашида Дадаевича, директора КГКУ "Управление капитального строительства Приморского края" Тюрина Алексея Владимировича, главного консультанта отдела программно-целевого и инвестиционного развития министерства физической культуры и спорта Приморского края Любас Елены Валерьевны проведен осмотр следующих объектов спортивной инфраструктуры:

1. "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе";
2. "Строительство крытого тренировочного катка в г. Находка";
3. "Строительство крытого футбольного манежа в г. Владивостоке".

В ходе визуального осмотра установлено следующее:

1. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Партизанском городском округе расположен по адресу: Приморский край, г. Партизанск, ул. Чкалова, 1г.

В физкультурно-оздоровительном комплексе предусмотрены: универсальный спортивный зал с трибуной для зрителей, учебно-тренировочный спортивный зал бокса, тренажерный зал, учебно-тренировочный зал для борьбы, помещение буфета, раздевальные комнаты с санузлами и душевыми.

Универсальный спортивный зал:

– в помещении уложено паркетное покрытие, спортивная разметка для волейбола/баскетбола отсутствует (не была учтена в проекте, работы по разметке перенесены из этапа строительства в этап эксплуатации);

– локально на поверхности паркета присутствуют пятна от лака/клея/краски (предположительно);

– выявлены дефекты установки дверных блоков: наличие зазоров (щелей) по периметру, нет плотного притвора;

- около входа на подложку уложены бетонные блоки в два ряда для создания временной нагрузки в целях ускорения процесса усадки и стабилизации паркетной доски;

- выявлена некачественная подрезка и отделка плинтусов (неровный стык, зазоры у стен);

- на стенах наблюдаются трещины (подрядчик классифицирует их как усадочные деформации, характерные для периода стабилизации здания; устранение трещин будет производиться в рамках гарантийных обязательств по мере проявления);

- часть вентиляционных отверстий не закрыта (отсутствие заслонок систем вентиляции), отсутствие вентиляционных решеток локально.

Тренажерный зал:

- в помещении уложено резиновое покрытие. Выявлены дефекты резинового покрытия: присутствуют зазоры в швах между модулями;

- часть вентиляционных отверстий не закрыта (отсутствие заслонок систем вентиляции).

Учебно-тренировочный зал для борьбы:

- на потолках и стенах наблюдаются трещины в районе деформационного шва (подрядчик классифицирует их как усадочные деформации, характерные для периода стабилизации здания. Устранение трещин будет производиться в рамках гарантийных обязательств по мере проявления);

- часть вентиляционных отверстий не закрыта (отсутствие заслонок систем вентиляции)


Подсобное помещение рядом с буфетом:


- выявлено наличие водяных разводов на потолочных плитах локально;



- выявлено наличие сквозного вентиляционного отверстия в перекрытии между первым и вторым этажом (в связи с внесением в ходе реализации изменений в проект в части корректировки путей прокладки вентиляционных каналов).



Также установлены дефекты внутренней отделки, отсутствие потолочных плит в помещениях здания.





В период проведения осмотра проведена фотосъемка проверяемого объекта. Состояние объекта представлено на фотографиях.

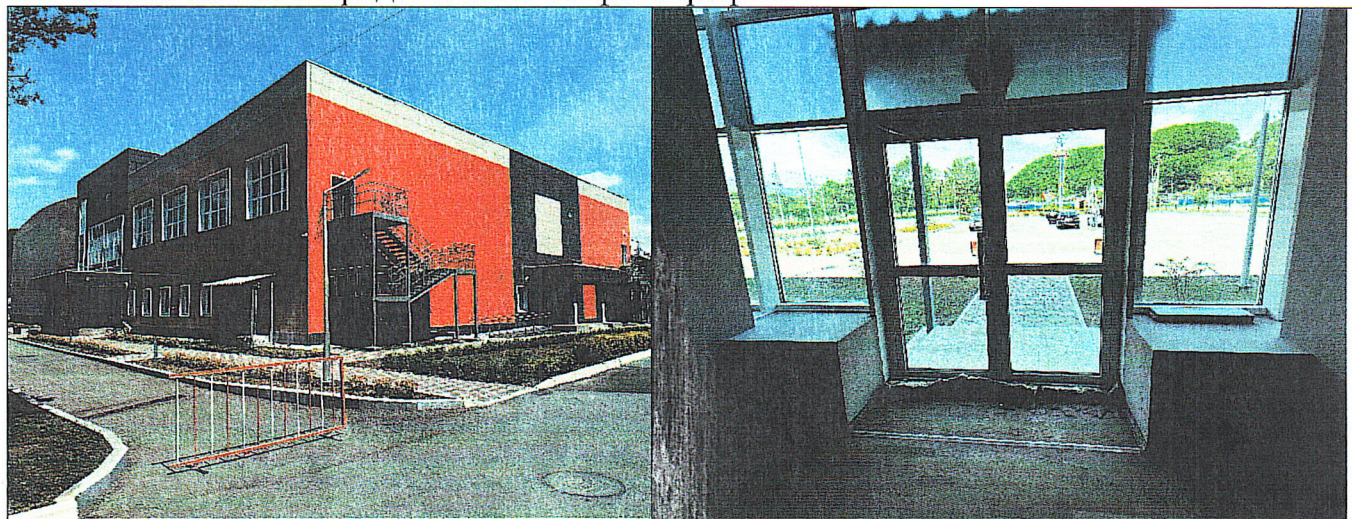


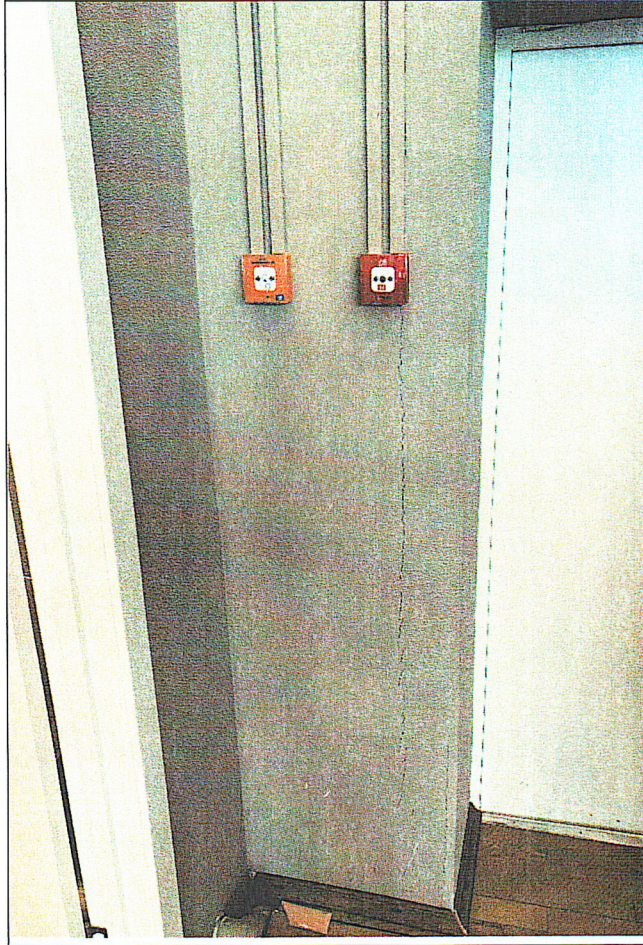

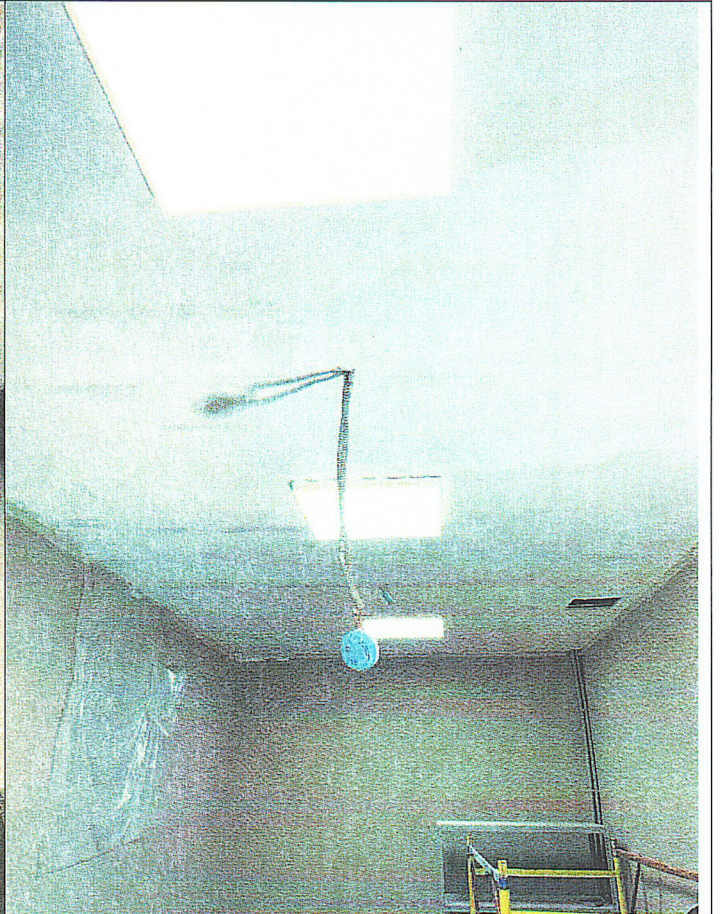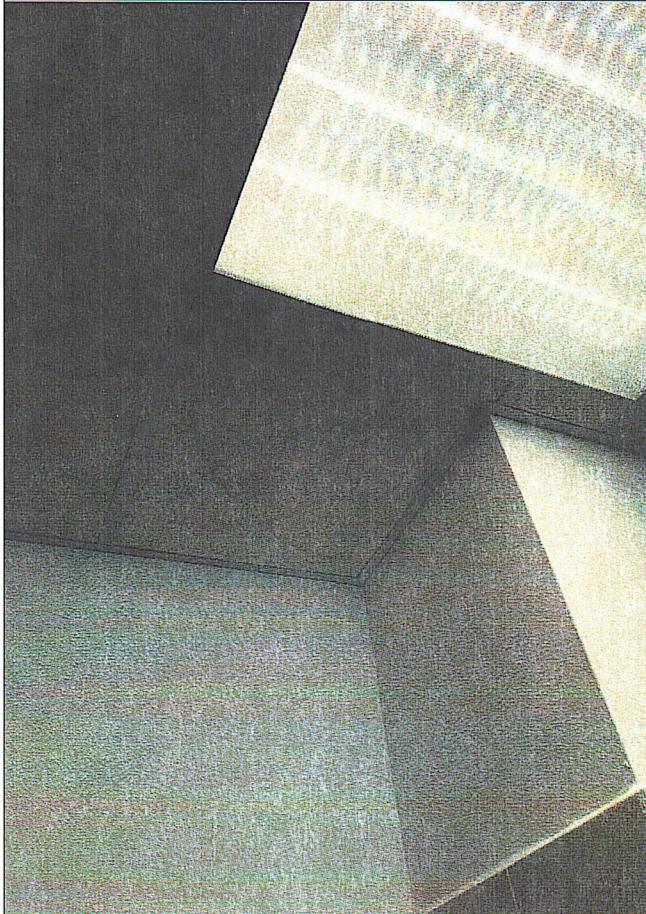

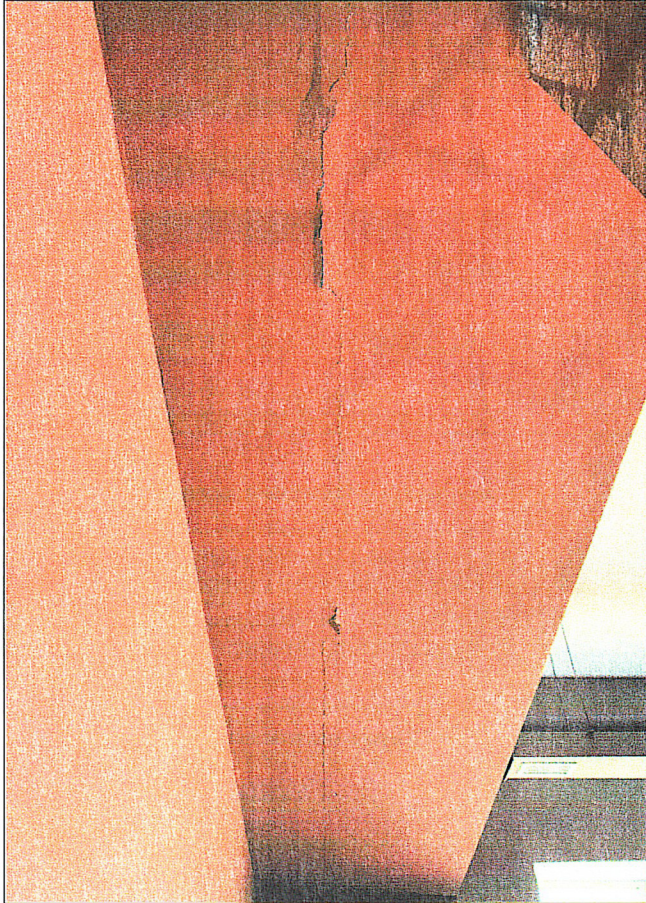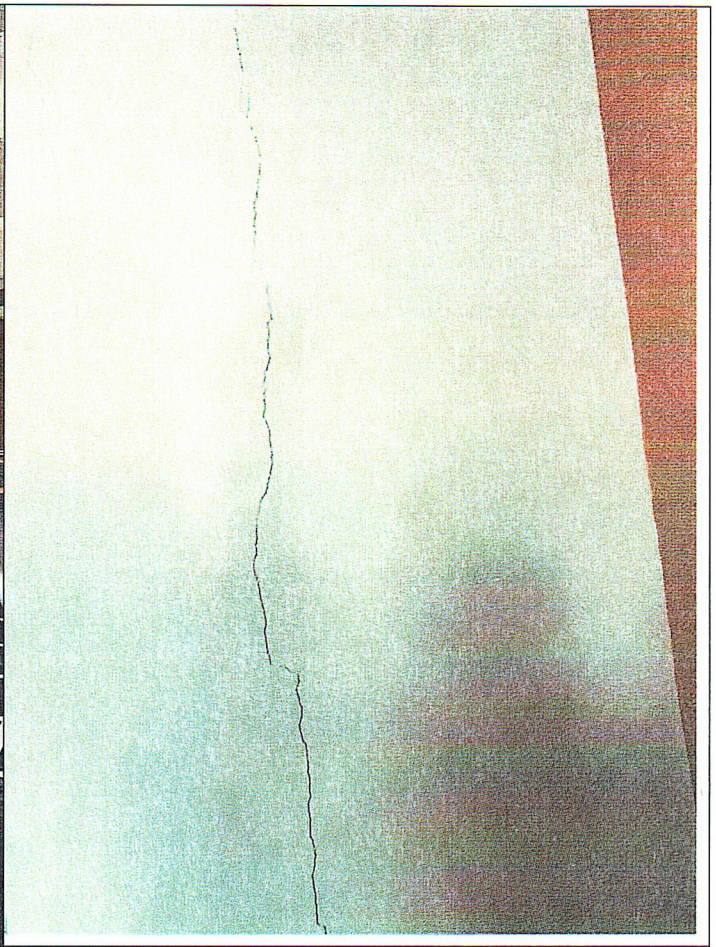

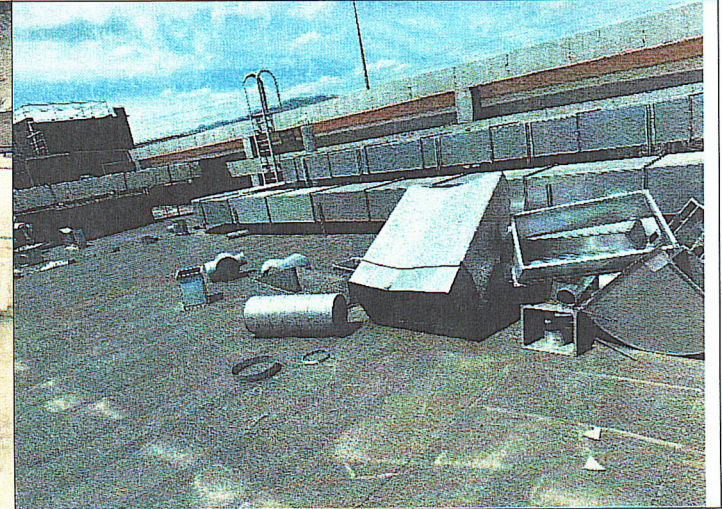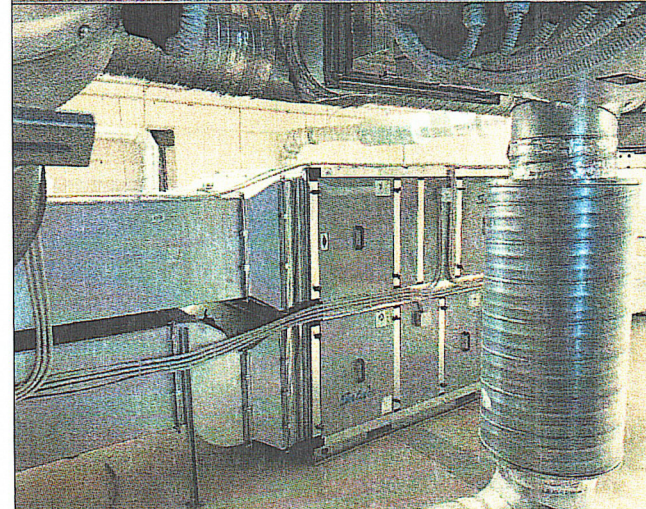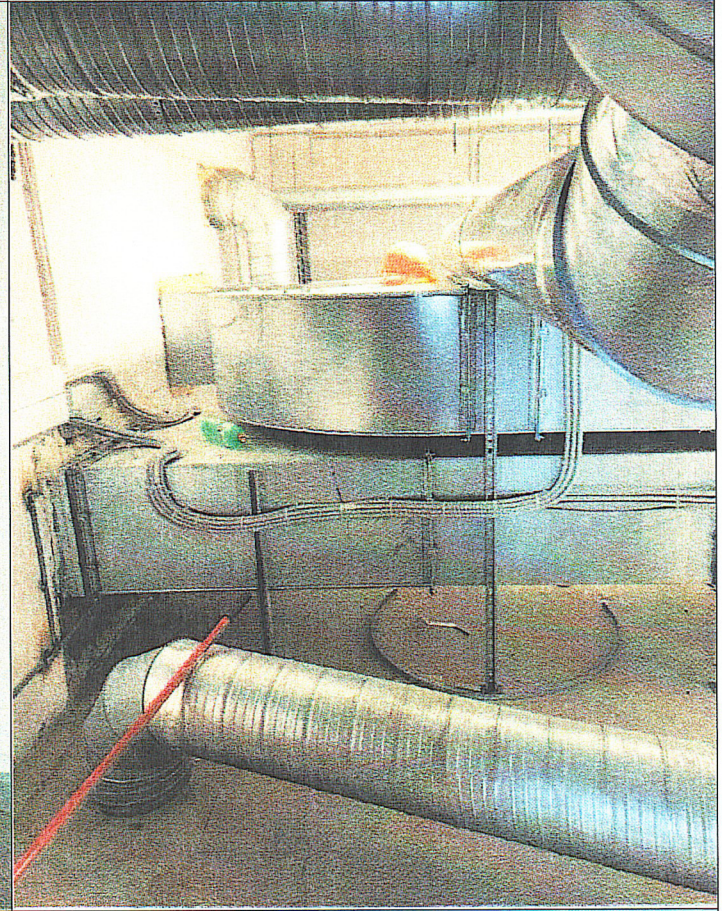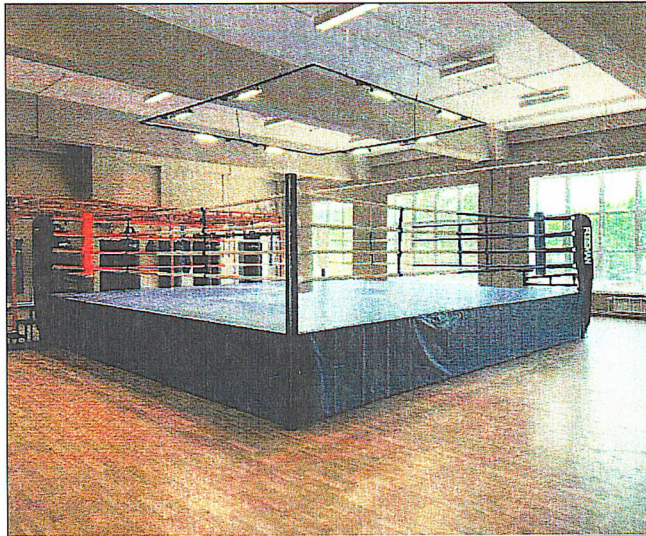

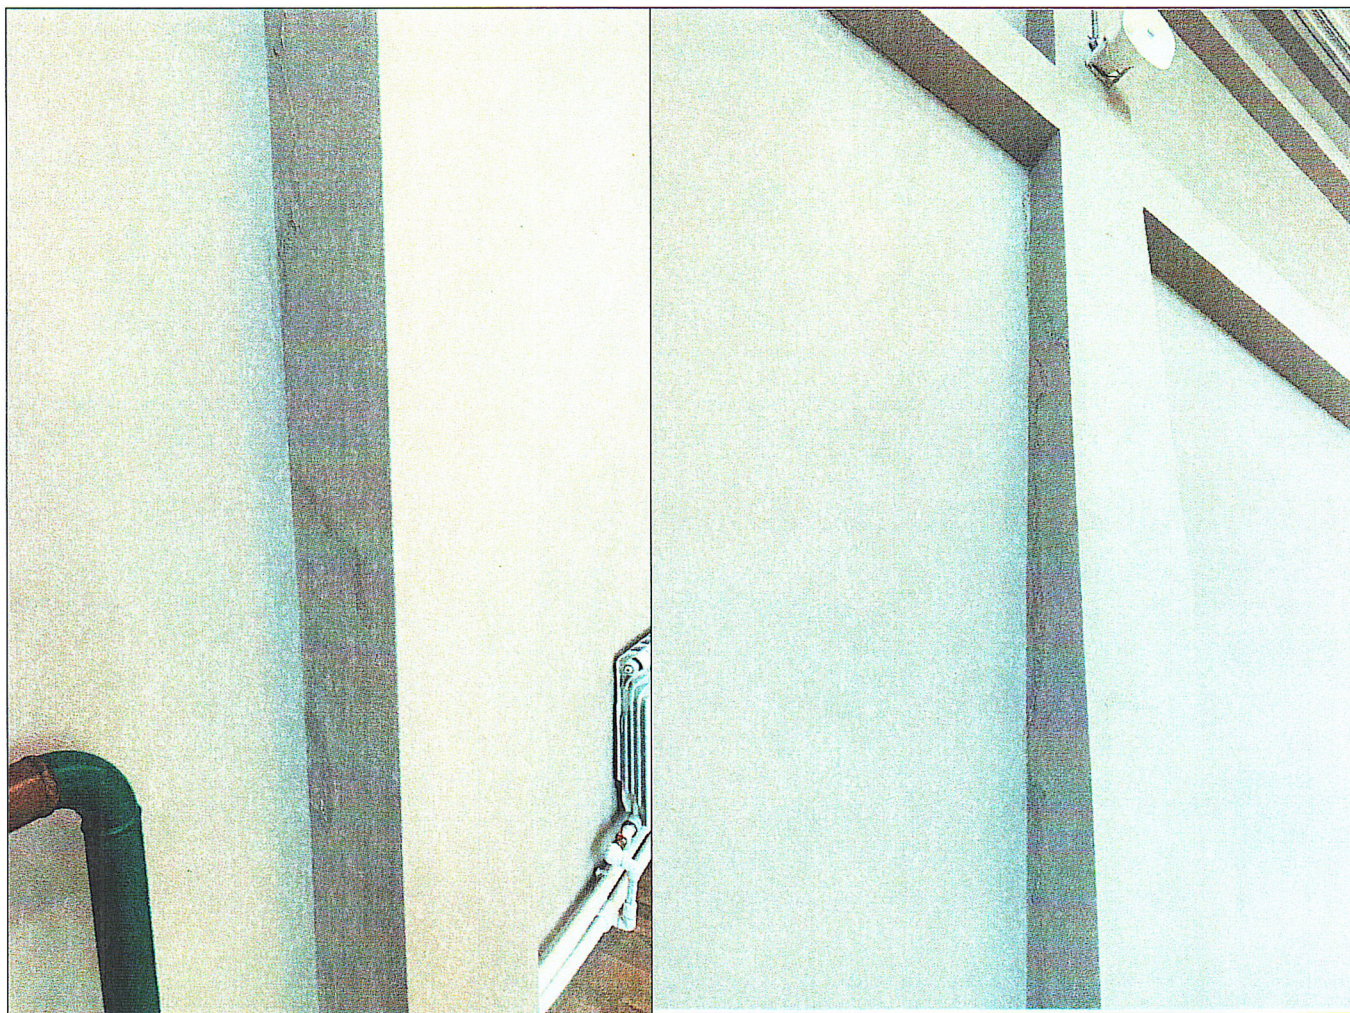

Территория объекта осмотра

Фото сделаны сотрудниками КСП ПК 18.05.2026

2. Крытый тренировочный каток в г. Находка расположен по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Комсомольская, 34а.

В комплексе предусмотрены помещения: ледовая арена для хоккея и керлинга с закрытыми тренировочными зонами, тренажерный зал, зона раздевалок с санузлами и душевыми, административные, технические и вспомогательные помещения, помещение буфета с зоной для зрителей.



Здание эксплуатируется, проводятся тренировки.

Приобретена ледозаливочная машина ENGO Ice Wolf Smart (1 единица).

При визуальном осмотре выявлено:

- образование конденсата в помещении ледовой арены (предположительно ввиду избыточной влажности воздуха и недостаточной мощности системы осушения),
- наличие повреждений плинтусов;
- раздевалки полностью укомплектованы.
- отсутствие информации на стенде по предоставляемым услугам для посетителей (в том числе для льготных категорий граждан),
- на территории, прилегающей к зданию, зафиксировано повсеместное разрушение бордюрного камня (сколы, трещины, утрата фрагментов).

В период проведения осмотра проведена фотосъемка проверяемого объекта. Состояние объекта представлено на фотографиях.

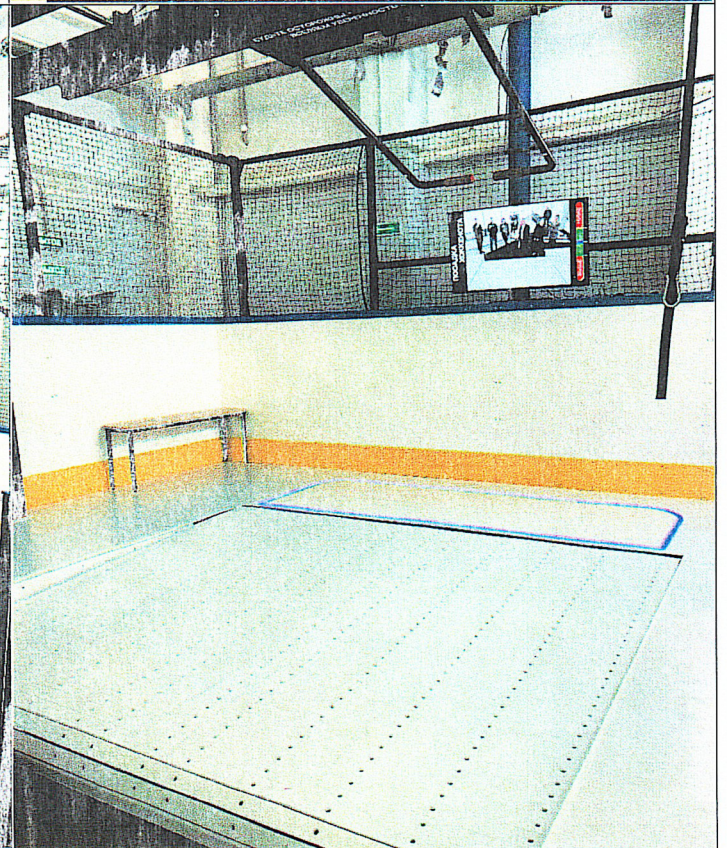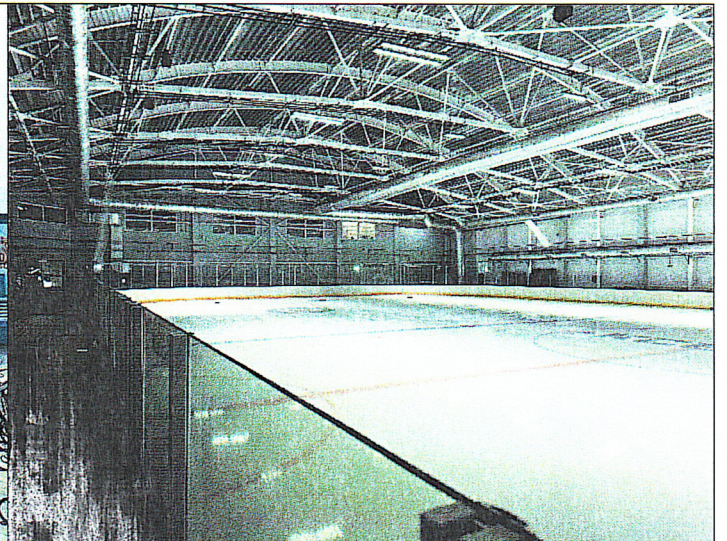





**3. Футбольный манеж в г. Владивостоке расположен по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Серова, 3:**

Ограждение и доступ на объект:

– по периметру земельного участка установлено ограждение комбинированного типа: частично – металлический забор (профлист), частично – сетка-рабица;

– объект находится под охраной (имеется пост охраны).

Состояние земельного участка:

– территория объекта покрыта густой растительностью;

– на участке размещены бетонные блоки и металлические строительные конструкции различного назначения (фермы, балки, стойки), не закрепленные и не укрытые от атмосферных воздействий.

Фундамент:

– выполнены работы по устройству свайного фундамента частично;

– на металлические элементы и оголовки свай имеются следы загрязнения и коррозии (ржавчины), что указывает на длительное нахождение конструкций под открытым небом без защитного покрытия и консервации.

Строительные конструкции и оборудование:

– на открытой площадке без укрытия и надлежащего крепления складированы металлические конструкции, предназначенные для возведения здания манежа, конструкции имеют признаки коррозии;

– отсутствуют какие-либо мероприятия по консервации объекта и защите конструкций от атмосферной коррозии (антикоррозионные составы, укрывные материалы, временные складские помещения).

В период проведения осмотра проведена фотосъемка проверяемого объекта. Состояние Объекта представлено на photographиях.







Территория объекта осмотра

Фото сделаны сотрудниками КСП ПК 18.05.2026

Подписи участников осмотра:

Заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты Приморского края

Ильиченко Е.В.

Главный инспектор аппарата
Контрольно-счетной палаты Приморского края

Якуш А.Е.

Главный инспектор аппарата
Контрольно-счетной палаты Приморского края

Балябина Е.Е.

Заместитель министра
строительства Приморского края

Ибрагимов Р.Д.

Директор КГКУ "Управление капитального
строительства Приморского края"

Тюрин А.В.

Главный консультант
отдела программно-целевого и инвестиционного
развития министерства физической культуры
и спорта Приморского края

Любас Е.В.

Анализ исполнения государственных/муниципальных контрактов (договоров), заключенных в 2023-2025 годах в рамках реализации регионального проекта "Спорт – норма жизни"																
тыс.рублей																
№ п/п	дата контракта и номер контракта	предмет контракта	НМЦК (начальная (максимальная) цена контракта)	Цена гос. Контракта	Снижение НМЦК на торгах по результатам конкурентных процедур	Сведения о поставщике (исполнителе)	Способ размещения заказа	Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта	Реквизиты документа о внесении изменений в контракт, о расторжении контракта	Содержание внесенных в контракт изменений	Срок исполнения контракта		Исполнение контракта (сумма)			
											по контракту	фактически	по контракту	Фактически получено (сумма, дата, № документа)	фактически оплачено заказчиком (сумма, дата, № документа)	Заказчик
2023 год																
Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)																
1	От 27.03.2023 № 14	Поставка и установка спортивно-технологического оборудования для оснащения спортивной инфраструктуры (площадка ГТО)	3 801,01	2 679,01	1 122,00	ООО «Миллениум-Спорт»	Электронный аукцион	Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 15.03.2023 №ИЭА1	-	-	31.07.23	25.09.23	2679,01	2679,01 тыс. рублей. Документ о приемке от 26.09.2023 № 132	Платежное поручение № 1717 от 12.10.2023 на сумму 2358,59 тыс. рублей; Платежное поручение № 1718 от 11.10.2023 на сумму 320,42 тыс. рублей	Администрация Красноармейского муниципального района
2	От 04.04.2023 № 0820600002 1230000080 001	Поставка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)	2 754,37	1 802,49	951,88	Общество с ограниченной ответственностью «Сила Стали»	Электронный аукцион	Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 24.03.2023 №ИЭА1	-	-	08.06.23	05.07.23	1 802,49	1802,49 тыс. рублей. Документ о приемке от 05.07.2023 № 96	Платежные поручения: от 07.07.2023 № 59658 на сумму 21,82 тыс. рублей, от 26.07.2023 № 207265 — 1780,6 тыс. рублей	Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры, спорта, туризма и молодёжной политики» Лазовского муниципального округа Приморского края
3	От 02.05.2023 № 0820600002 1230000090 001	Поставка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)	951,88	937,60	14,28	Общество с ограниченной ответственностью «Сила Стали»	Электронный аукцион	Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 20.04.2023 №ИЭА1	-	-	13.07.23	05.07.23	937,60	937,6 тыс. рублей. Документ о приемке от 05.07.2023 № 95	Платежные поручения: от 07.07.2023 № 59656 на сумму 376,43 тыс. рублей, от 07.07.2023 № 59657 на сумму 6,84 тыс. рублей, от 26.07.2023 № 207264 на сумму 554,33 тыс. рублей	Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры, спорта, туризма и молодёжной политики» Лазовского муниципального округа Приморского края
В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь																
1	От 13.02.2023 № 6/н	Поставка жилетов спасательных для ГАУ ДО ПК «КСШОР»	145,07	145,07	0,00	ИП Власов Олег Олегович	Закупка у единственного поставщика № 223-ФЗ	-	-	-	31.12.23	26.06.23	145,07	145,07 тыс. рублей. УПД от 26.06.2023 № 463	Платежное поручение от 17.02.2023 № 620726 на сумму 43,52 тыс. рублей; Платежное поручение от 21.02.2023 № 657230 на сумму 101,55 тыс. рублей;	

2	От 17.02.2023 № 02/13	Поставка ракеток для бадминтона для ГАУ ДО ПК «КСШОР»	222,55	222,55	0,00	ИП Андрейчук Евгений Дмитриевич	Закупка у единственно го поставщика № 223-ФЗ	-	-	-	31.12.23	26.06.23	222,55	222,55 тыс. рублей. Товарная накладная от 26.06.2023 № 25116	Платежное поручение № 863644 от 27.06.23 на сумму 66,77 тыс. рублей; Платежное поручение № 894551 от 30.06.23 на сумму 155,78 тыс. рублей
3	От 21.02.2023 № 6/н	Поставка тренажера для гребли для ГАУ ДО ПК «КСШОР»	629,00	629,00	0,00	ИП Усмаев Сергей Анатольевич	Закупка у единственно го поставщика № 223-ФЗ	-	Дополнительн ое соглашение от 10.04.2023	п. 4.2. дополнили текст за счет какой субсидии производит ся финансиров ание; в реквизиты Заказчика добавили л/с.	31.12.23	30.06.23	629,00	629,00 тыс. рублей. Товарная накладная от 21.06.2023 № 32	Платежное поручение № 792783 от 19.06.2023 на сумму 145,20 тыс. рублей; Платежное поручение № 882757 от 29.06.2023 на сумму 145,00 тыс. рублей; Платежное поручение № 894548 от 30.06.2023 на сумму 338,80 тыс. рублей
4	От 22.02.2023 № 22- 02/23П	Поставка товара - Копье тренировочное, Ядро, Барьер для ГАУ ДО ПК «КСШОР»	263,14	263,14	0,00	ООО "Спортивные конструкции"	Закупка у единственно го поставщика № 223-ФЗ	-	Дополнительн ое соглашение от 19.12.2023	Изменение спецификац ии, добавили мяч гимнастиче ский 1 к-т. Увеличение цены контракта на 21, 59 тыс. руб., добавили л/с Заказчика	31.12.23	27.12.23	263,14	263,14 тыс. рублей. УПД от 27.06.2023 № 122	Платежное поручение № 806550 от 20.06.2023 на сумму 72,46 тыс. рублей, Платежное поручение № 127108 от 17.07.2023 на сумму 169,09 тыс. рублей, Платежное поручение № 641602 от 27.12.2023 на сумму 21,59 тыс. рублей
5	От 27.02.2023 № 1- 27/02/2023	Поставка Товара - Лодка Каноэ для ГАУ ДО ПК «КСШОР»	1 240,00	1 240,00	0,00	ИП Дембиков Андрей Юрьевич	Закупка у единственно го поставщика № 223-ФЗ	-	Дополнительн ое соглашение от 05.06.2023	Изменение реквизитов	31.12.23	23.06.23	1 240,00	1240,00 тыс. рублей. Товарная накладная от 23.06.2023 № 107	Платежное поручение от 22.06.2023 № 834988 на сумму 372,00 тыс. рублей; Платежное поручение от 03.07.2023 № 9435 на сумму 861,08 тыс. рублей; Платежное поручение от 06.07.23 № 36524 на сумму 6,92 тыс. рублей
6	От 28.02.2023 № 6/н	Поставка Товара - Паруса для ГАУ ДО ПК «КСШОР»	772,00	772,00	0,00	ООО "Морские путешествия"	Закупка у единственно го поставщика № 223-ФЗ	-	-	-	01.06.23	20.06.23	772,00	772,00 тыс. рублей. Товарная накладная от 08.06.2023 № 1	Платежное поручение № 807864 от 20.06.2023 на сумму 772,00 тыс. рублей
7	От 20.02.2023 № 176655- 01	Поставка Тренажера для ГАУ ДО ПК «КСШОР»	163,15	163,15	0,00	ИП Степанов Илья Александрович	Закупка у единственно го поставщика № 223-ФЗ	-	Дополнительн ое соглашение от 28.02.2023	Внесение изменений в спецификац ию	31.12.23	11.07.23	163,15	163,15 тыс. рублей. Товарная накладная от 20.02.2023 № 192482927	Платежное поручение от 28.06.2023 № 873725 на сумму 163,15 тыс. рублей
8	От 03.03.2023 № 6/н	Поставка Товара - Спортивный парусный снаряд для ГАУ ДО ПК «КСШОР»	800,00	800,00	0,00	ООО "Реал Сервис"	Закупка у единственно го поставщика № 223-ФЗ	-	-	-	01.06.23	06.06.23	800,00	800,00 тыс. рублей. Товарная накладная от 06.06.2023 № PC-1	Платежное поручение от 06.04.2023 № 150638 на сумму 800,00 тыс. рублей

ГАУ ДО ПК «КСШОР»

9	От 02.03.2023 № 185/23	Поставка Товаров - Медбол, Гантель для ГАУ ДО ПК «КСШОР»	180,00	180,00	0,00	ООО ДВЭЦ "Атлант"	Закупка у единственно го поставщика № 223-ФЗ	-	Дополнительн ое соглашение от 10.04.2023	п. 2.1. дополнили текст за счет какой субсидии производит ся финансиров ание; в реквизиты Заказчика добавили л/с.	31.12.23	03.07.23	180,00	180,00 тыс. рублей. Товарная накладная от 18.04.2023 № УТ- 257	Платежное поручение № 894555 от 30.06.2023 на сумму 43,50 тыс. рублей, Платежное поручение № 9437 от 03.07.2023 на сумму 35,00 тыс. рублей, Платежное поручение № 9439 от 03.07.2023 на сумму 101,50 тыс. рублей	
Итого			4 414,91	4 414,91	0,00								4 414,91			
Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка																
1	От 21.07.2023 № 1618	Поставка спортивного оборудования для МАУ ДО СШ "Водник" НГО и МАУ ДО СШ "Приморец" НГО	125,34	125,34	0,00	Индивидуальный предпринимател ь Щербак Александр Анатольевич	Единственн ый поставщик п.4 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ	-	-	-	22.09.23	14.09.23	125,34	125,34 тыс. рублей. Товарная накладная от 01.09.2023 № 147	Платежное поручение от 14.09.2023 № 585045 на сумму 125,34 тыс. рублей	Администрация Находкинского городского округа
2	От 06.10.2023 № 1839	Поставка спортивного оборудования для МАУ ДО СШ "Водник" НГО и МАУ ДО СШ "Приморец" НГО	9,64	9,64	0,00	Индивидуальный предпринимател ь Щербак Александр Анатольевич	Единственн ый поставщик п.4 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ	-	-	-	29.11.23	25.10.23	9,64	9,64 тыс. рублей. Товарная накладная от 17.10.2023 № 176	Платежное поручение от 25.10.2023 № 31395 на сумму 9,64 тыс. рублей	
3	От 15.11.2023 № 188	Поставка инвентаря для тяжелой атлетики для нужд МБУ ДО СШОР «Богатырь» г. Арсеньев	124,37	124,37	0,00	ИП Щербак А.А.	Единственн ый поставщик п.5 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ	-	-	-	31.12.23	04.12.23	124,37	124,37 тыс. рублей. Товарная накладная от 15.11.2023 № 188	Платежное поручение № 611 от 04.12.2023 на сумму 3,73 тыс. рублей; Платежное поручение № 612 от 04.12.2023 на сумму 120,64 тыс. рублей	МБУ ДО СШОР «Богатырь»
4	От 29.11.2023 № 193	Поставка спортивной экипировки (трико) для нужд МБУ ДО «СШ «Восток» г. Арсеньев	36,88	36,88	0,00	ИП Щербак А.А.	Единственн ый поставщик п.4 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ	-	-	-	31.12.23	13.12.23	36,88	36,88 тыс. рублей. Товарная накладная от 29.11.2023 № 193	Платежное поручение № 716 от 13.12.2023 на сумму 1,11 тыс. рублей; Платежное поручение № 724 от 13.12.2023 на сумму 35,77 тыс. рублей	МБУ ДО «СШ «Восток» г. Арсеньев
5	От 13.10.2023 № 043	Поставка спортивного инвентаря (лыжный инвентарь) для нужд МБУ ДО «СШ «Полет» г. Арсеньев	95,95	95,95	0,00	ИП Петрова Ю.Н.	Единственн ый поставщик п.4 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ	-	-	-	31.12.23	14.11.23	95,95	95,95 тыс. рублей. Товарная накладная от 13.10.2023 № 43	Платежное поручение № 830 от 14.11.2023 на сумму 93,07 тыс. рублей; Платежное поручение № 831 от 14.11.2023 на сумму 2,88 тыс. рублей	МБУ ДО «СШ «Полет» г. Арсеньев
6	От 20.11.2023 № 055	Поставка спортивного инвентаря (лыжный инвентарь) для нужд МБУ ДО «СШ «Полет» г. Арсеньев	44,04	44,04	0,00	ИП Петрова Ю.Н.	Единственн ый поставщик п.4 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ	-	-	-	31.12.23	13.12.23	44,04	44,04 тыс. рублей. Товарная накладная от 20.11.2023 № 00055	Платежное поручение № 925 от 13.12.2023 на сумму 1,32 тыс. рублей; Платежное поручение № 926 от 13.12.2023 на сумму 42,72 тыс. рублей	МБУ ДО «СШ «Полет» г. Арсеньев
7	От 24.10.2023 № 6/н	Поставка спортивного инвентаря МБУ ДО СШ «Юность» г. Арсеньев	36,37	36,37	0,00	ООО "Спорттэйм"	Единственн ый поставщик п.4 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ	-	-	-	31.12.23	14.12.23	36,37	36,37 тыс. рублей. От 15.11.2023 УТ-9874	Платежное поручение № 894 от 14.12.2023 на сумму 1,09 тыс. рублей; Платежное поручение № 895 от 14.12.2023 на сумму 35,28 тыс. рублей	МБУ ДО СШ «Юность» г. Арсеньев
8	От 16.11.2023 № 644	Поставка спортивной экипировки в МБУ ДО СШ «Юность» г. Арсеньев	28,20	28,20	0,00	ООО "Экселленс"	Единственн ый поставщик п.5 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ	-	-	-	31.12.23	14.12.23	28,20	28,20 тыс. рублей. Товарная накладная от 16.11.2023 № 152	Платежное поручение № 896 от 14.12.2023 на сумму 0,85 тыс. рублей; Платежное поручение № 897 от 14.12.2023 на сумму 27,35 тыс. рублей	МБУ ДО СШ «Юность» г. Арсеньев

9	От 21.11.2023 № 32	Поставка спортивного оборудования и инвентаря в МБУ СШ «Гранит» г. Дальнегорск	389,16	389,16	0,00	ИП Перевозчиков А.А.	Единственн ый поставщик п.5 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ	-	-	-	30.12.23	23.11.23	389,16	389,16 тыс. рублей. Товарная накладная от 23.11.2023 № 166630	Платежное поручение от 07.12.2023 № 394675 на сумму 307,19 тыс. рублей; Платежное поручение от 07.12.2023 № 394676 на сумму 69,58 тыс. рублей; Платежное поручение от 07.12.2023 № 394677 на сумму 12,39 тыс. рублей;	МБУ ДО СШ «Гранит» г. Дальнегорск
10	От 10.11.2023 № 100/2023	Поставка товара в МБУ ДО «СШ «Лотос» г. Дальнегорск	396,12	396,12	0,00	ИП Перевозчиков А.А.	Единственн ый поставщик п.5 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ	-	-	-	30.11.23	15.11.23	396,12	396,12 тыс. рублей. Товарная накладная от 15.11.2023 № 166442	Платежное поручение от 01.12.2023 № 340712 на сумму 396,12 тыс. рублей;	МБУ ДО СШ «Лотос» г. Дальнегорска
11	От 04.05.2023 № 950/350- 25/23	Поставка спортивной экипировки для олимпийского спорта «Тхэквондо ВТФ» в МБУ СШ «Русич» города Владивостока	203,46	203,46	0,00	ООО "АйСиКо"	Единственн ый поставщик п.5 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ	-	-	-	18.06.23	16.06.23	203,46	203,46 тыс. рублей. Товарная накладная от 16.06.2023 № 492	Платежное поручение от 14.07.2023 № 326 на сумму 193,29 тыс. рублей Платежное поручение от 14.07.2023 № 327 на сумму 10,17 тыс. рублей	МБУ СШ «Русич» города Владивостока
12	От 20.02.2023 № 10	Поставка чучел борцовских в МКУ СШ «Атлетическая гимнастика» г. Артем	134,98	134,98	0,00	ИП Капленко Александр Юрьевич	Единственн ый поставщик п.5 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ	17.02.23	-	-	22.03.23	23.03.23	134,98	134,98 тыс. рублей. Товарная накладная от 03.03.2023 № 51	Платежное поручение от 28.04.2023 № 377384 на сумму 134,98 тыс. рублей	МКУ СШ «Атлетическая гимнастика» г. Артем
13	От 22.05.2023 № 714/23	Поставка Медболов, эспандеров в МКУ «СШ «Темп»	25,71	25,71	0,00	ООО ДВЭЦ "Атлант"	Единственн ый поставщик п.4 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ	-	-	-	10.04.23		25,71	25,71 тыс. рублей. Товарная накладная № УТ-402 от 05.07.2023	Платежное поручение от 01.08.2023 № 243233 на сумму 25,71 тыс. рублей	МКУ «СШ «Темп»
14	От 14.06.2023 № 927/23	Поставка спортивного оборудования и инвентаря в МБУ ДО «СШ «Атлант» ГО Спасск-Дальний	32,37	32,37	0,00	ООО Дальневосточны й экипировочный центр "Атлант"	Единственн ый поставщик п.4 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ	-	-	-	01.08.23	29.06.23	32,37	32,37 тыс. рублей. Товарная накладная от 14.06.2023 № УТ- 509	Платежное поручение № 888183 от 29.06.2023 на сумму 0,97 тыс. рублей; Платежное поручение № 888184 от 29.06.2023 на сумму 31,40 тыс. рублей	МБУ ДО «СШ «Атлант» ГО Спасск-Дальний
15	От 07.06.2023 № 08	Поставка спортивной экипировки в МБУ ДО «СШ «Атлант» ГО Спасск- Дальний	146,40	146,40	0,00	ИП Скляренко А.В.	Единственн ый поставщик п.4 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ	-	-	-	31.12.23	05.07.23	146,40	146,40 тыс. рублей. УПД от 07.06.2023 № 3	Платежное поручение от 05.07.2023 № 32502 на сумму 142,01 тыс. рублей; Платежное поручение от 05.07.2023 № 32503 на сумму 4,39 тыс. рублей;	МБУ ДО «СШ «Атлант» ГО Спасск-Дальний
16	От 06.06.2023 № 026	Поставка спортивного оборудования и инвентаря для нужд МБУ ДО «Лыжная СШ» ГО Спасск-Дальний	599,00	599,00	0,00	ИП Петрова Ю.Н.	Единственн ый поставщик п.4 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ	-	-	-	30.08.23	06.06.23	599,00	599,00 тыс. рублей. Акт приема-передачи от 08.06.2023 № 026	Платежное поручение № 888155 от 29.06.2023 на сумму 17,97 тыс. рублей; Платежное поручение № 888154 от 29.06.2023 на сумму 581,03 тыс. рублей	МБУ ДО «Лыжная СШ» ГО Спасск-Дальний
17	От 18.05.2023 № УТ-7	Поставка спортивного оборудования и инвентаря для МБУ ДО «СШ» ГО ЗАТО Фокино	134,10	134,10	0,00	ИП Кучумов Дмитрий Юрьевич	Единственн ый поставщик п.5 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ	-	-	-	31.12.23	18.05.23	134,10	134,10 тыс. рублей. Товарная накладная от 19.05.2023 № УТ- 922	Платежное поручение от 07.08.2023 № 281427 на сумму 134,10 тыс. рублей	МБУ ДО «СШ» ГО ЗАТО Фокино
18	От 06.06.2023 № 1100	Поставка спортивного оборудования и инвентаря для МБУ ДО «СШ «Орбита» ГО ЗАТО Фокино (п. Дунай)	90,00	90,00	0,00	ИП Рябцев Михаил Сергеевич	Единственн ый поставщик п.5 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ	-	-	-	31.12.23	08.06.23	90,00	90,00 тыс. рублей. Товарная накладная от 08.06.2023 № 24	Платежное поручение от 20.07.2023 № 176488 на сумму 90,00 тыс. рублей	МБУ ДО «СШ «Орбита» ГО ЗАТО Фокино (п. Дунай)

19	От 08.08.2023 № 1105	Поставка спортивного оборудования и инвентаря для МБУ ДО «СШ» ГО ЗАТО Фокино	2,63	2,63	0,00	ИП Шурупов Сергей Александрович	Единствен ный поставщик п.5 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ	-	-	-	31.12.23	22.08.23	2,63	2,63 тыс. рублей. Товарная накладная от 22.08.2023 № 588	Платежное поручение от 23.10.2023 № 15524 на сумму 2,63 тыс. рублей	МБУ ДО «СШ» ГО ЗАТО Фокино
20	От 19.07.2023 № 6	Поставка спортивного инвентаря в МБУ СШ «Сучан»	44,99	44,49	0,50	ИП Ворона Сергей Игоревич	Единствен ный поставщик п.4 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ	-	-	-	08.08.23	16.08.23	44,99	44,99 тыс. рублей. Товарная накладная от 16.08.2023 № ЦБ-6	Платежное поручение от 29.09.2023 № 707354 на сумму 15,35 тыс. рублей. Платежное поручение от 29.09.2023 № 707355 на сумму 29,64 тыс. рублей.	МБУ СШ «Сучан»
21	От 20.02.2023 № 20/02	Поставка электронного оборудования (спортивной экипировки) по виду спорта тхэквондо для нужд МАУ «СШ» Уссурийского ГО	545,60	545,60	0,00	ИП Ким А.А.	Единствен ный поставщик	-	-	-	22.02.23	27.02.23	545,6	545,60 тыс. рублей. УПД № 1 от 27.02.2023	Платежное поручение от 07.03.2023 № 779145 на сумму 410,62 тыс. рублей; Платежное поручение от 06.04.2023 № 156022 на сумму 134,98 тыс. рублей	МАУ «СШ» Уссурийского ГО
22	От 29.06.2023 № УТ-342	Поставка спортивной экипировки (шиповки) в МБУДО «Ольгинская» СШ	88,17	88,17	0,00	ООО «Школьная планета»	Единствен ный поставщик п.4 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ	-	-	-	27.09.23	29.06.23	88,17	88,17 тыс. рублей. Товарная накладная от 29.06.2023 № УТ- 342	Платежное поручение от 08.09.2023 № 543585 на сумму 87,29 тыс. рублей; Платежное поручение от 11.07.2023 № 83923 на сумму 0,89 тыс. рублей;	МБУДО «Ольгинская» СШ
23	От 30.01.2023 № 7/6	Услуги плавательного бассейна «Олимпиец» для лиц с ОВЗ и инвалидов	931,98	931,98	0,00	КГАУ «ЦСП ПК»	Единствен ный поставщик (от 18.07.2011 № 223-ФЗ)	Договор от 30.01.2023 № 7/6	Дополнительн ое соглашение от 18.12.2023 № 1	Изменение цены договора	31.12.23	31.12.23	931,98	Акт № 0000-000008 от 31.01.2023 на сумму 95,10 тыс. рублей; Акт № 0000-000054 от 28.02.2023 на сумму 76,08 тыс. рублей; Акт № 0000-000102 от 31.03.2023 на сумму 85,59 тыс. рублей; Акт № 0000-000150 от 28.04.2023 на сумму 95,10 тыс. рублей; Акт № 0000-000211 от 31.05.2023 на сумму 123,63 тыс. рублей; Акт № 0000-000251 от 30.06.2023 на сумму 95,10 тыс. рублей; Акт № 0000-000367	Платежное поручение от 11.04.2023 № 196580 на сумму 95,10 тыс. рублей; Платежное поручение от 11.04.2023 № 196579 на сумму 76,08 тыс. рублей; Платежное поручение от 11.04.2023 № 196578 на сумму 85,59 тыс. рублей; Платежное поручение от 09.06.2023 № 721645 на сумму 95,10 тыс. рублей; Платежное поручение от 09.06.2023 № 721644 на сумму 123,63 тыс. рублей; Платежное поручение от 18.07.2023 № 137834 на сумму 95,10 тыс. рублей; Платежное поручение от 05.12.2023 № 358192 на сумму 114,12 тыс. рублей; Платежное поручение от 05.12.2023 № 358203 на сумму 123,63 тыс. рублей; Платежное поручение от	КГАУ «Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Приморского края»
Итого			4 265,47	4 264,97	0,50							4 265,47				
2024																
В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь																
	От 15.02.2024 № 04/04	Поставка Товаров (воланы для бадминтона пластиковые) для ГАУ ДО ПК «КСШОР»	650,00	650,00	0,00	ИП Андрейчук Евгений Дмитриевич	Закупка у единственно го поставщика № 223-ФЗ	-	-	-	31.12.24	24.07.24	650,00	650 тыс. рублей. Товарная накладная от 17.04.2024 № 31351	Платежное поручение № 80402 от 19.02.2024 на сумму 195,00 тыс. рублей, Платежное поручение № 657883 от 24.07.2024 на сумму 455,00 тыс. рублей	

[illegible]

	От 30.01.2024 № 21	Поставка спортивной формы для МБУ ДО СШ «Надежда»	83,32	83,32	0,00	ИП Сивораक्षा Денис Алексеевич	Единственн ый поставщик п.5 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ	-	-	-	01.05.24	29.03.24	83,32	83,32 тыс. рублей. Товарная накладная от 29.03.2024 № 63)	83,32 тыс. рублей. Платежное поручение от 16.04.2024 № 566617	МБУ ДО СШ «Надежда» Надеждинского района
	От 19.11.2024 № 6/н	Поставка спортивного инвентаря в МБУ ДО СШОР «Богатырь» г. Арсеньев	63,79	63,79	0,00	ИП Петровская Елена Анатольевна	Единственн ый поставщик п.5 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ	-	-	-	31.12.24	09.12.24	63,79	63,79 тыс. рублей. Товарная накладная от 19.11.2024 № 35	Платежное поручение № 682 от 09.12.2024 на сумму 61,88 тыс. рублей; Платежное поручение № 681 от 09.12.2024 на сумму 1,91 тыс. рублей	МБУ ДО СШОР «Богатырь» г. Арсеньев
	От 02.04.2024 № 120	Поставка табло информационное световое электронное для МБУ ДО «СШ «Восток» Арсеньевского ГО	69,53	69,53	0,00	ИП Байрол М.А.	Единственн ый поставщик п.4 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ	-	-	-	31.12.24	17.04.24	69,53	69,53 тыс. рублей. УПД 20716 от 03.04.2024	Платежное поручение № 254 от 17.04.2024 на сумму 2,09 тыс. рублей; Платежное поручение № 255 от 17.04.2024 на сумму 67,44 тыс. рублей	МБУ ДО «СШ «Восток» Арсеньевского ГО
	От 13.11.2024 № 3	Поставка спортивной экипировки в МБУ ДО СШ «Восток» Арсеньевского ГО	191,16	191,16	0,00	ИП Шкляр А.В.	Единственн ый поставщик п.5 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ	-	-	-	31.12.24	29.11.24	191,16	191,16 тыс. рублей. Товарная накладная от 13.11.2024 № 3	Платежное поручение № 792 от 29.11.2024 на сумму 185,43 тыс. рублей; Платежное поручение № 791 от 29.11.2024 на сумму 5,73 тыс. рублей	МБУ ДО СШ «Восток» Арсеньевского ГО
	От 15.11.2024 № 145	Поставка спортивного инвентаря в МБУ ДО СШ «Юность» Арсеньевского ГО	0,87	0,87	0,00	ИП Щербак Александр Анатольевич	Единственн ый поставщик п.4 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ	-	-	-	31.12.24	29.11.24	0,87	0,87 тыс. рублей. Товарная накладная от 15.11.2024 № 145	Платежное поручение № 970 от 29.11.2024 на сумму 0,77 тыс. рублей; Платежное поручение № 968 от 29.11.2024 на сумму 0,03 тыс. рублей; Платежное поручение № 971 от 29.11.2024 на сумму 0,07 тыс. рублей	МБУ ДО СШ «Юность» Арсеньевского ГО
	От 31.10.2024 № 950/355- 25/24	Приобретение спортивной экипировки для спортсменов отделения легкой атлетики, входящих в состав сборной команды Приморского края в МБУ ДО «СШ «Бастин» г. Владивостока	138,87	138,87	0,00	ООО ДВЭЦ "Атлант"	Единственн ый поставщик п.5 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ	-	Дополнительн ое соглашение от 10.12.2024	Изложение в новой редакции пункта 3.6 контракта (изменение источника финансиров ания)	28.12.24	12.12.24	138,87	138,87 тыс. рублей. Товарная накладная от 10.12.2024 № УТ- 1072	Платежное поручение от 12.12.2024 № 385 на сумму 6,94 тыс. рублей Платежное поручение от 12.12.2024 № 387 на сумму 131,92 тыс. рублей Платежное поручение от 12.12.2024 № 386 на сумму 0,00069 тыс. рублей	МБУ ДО «СШ «Бастин» г. Владивостока
	От 06.06.2024 № 12/1	поставка спортивных товаров в МАУ ДО СШ "Ливадия" НГО	166,64	166,64	0,00	ИП Зуев Дмитрий Юрьевич	От 18.07.2011 № 223-ФЗ	-	Дополнительн ое соглашение от 28.06.2024	Срок поставки продлен на 40 дней	29.08.24	05.09.24	166,64	166,64 тыс. рублей. УПД от 07.08.2024 № ЦБ-207	Платежное поручение от 05.09.2024 № 785446 на сумму 17,24 тыс. рублей; Платежное поручение от 05.09.2024 № 785449 на сумму 149,40 тыс. рублей	МАУ ДО СШ "Водник" Находкинский ГО
	От 30.05.2024 № 30052024	поставка спортивных товаров в МАУ ДО СШ "Ливадия" НГО	55,55	55,55	0,00	ИП Щербак Александр Анатольевич	От 18.07.2011 № 223-ФЗ	-	-	-	06.08.24	17.06.24	55,55	55,55 тыс. рублей. Товарная накладная от 03.06.2024 №54	Платежное поручение от 17.06.2024 № 170975 на сумму 55,55 тыс. рублей	МАУ ДО СШ "Ливадия" Находкинский ГО
	От 05.04.2024 № 02042024	поставка товара для МАУ ДО СШ «Приморец» НГО	27,77	27,77	0,00	ИП Щербак Александр Анатольевич	От 18.07.2011 № 223-ФЗ	-	-	-	29.04.24	27.04.24	27,77	27,77 тыс. рублей. Товарная накладная от 10.04.2024 № 41	Платежное поручение от 27.04.2024 № 664172 на сумму 27,77 тыс. рублей	МАУ ДО СШ «Приморец» Находкинский ГО
	От 08.05.2024 №4	Поставка спортивного инвентаря в МБУ СШ «Сучан»	188,39	188,39	0,00	ИП Ворона Сергей Иванович	Единственн ый поставщик п.4 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ	-	-	-	07.06.24	13.06.24	188,39	188,39 тыс. рублей. Товарная накладная от 11.06.2024 № ЦБ-4	Платежное поручение от 19.07.2024 № 458543 на сумму 37,19 тыс. рублей; Платежное поручение от 19.07.2024 № 458542 на сумму 151,20 тыс. рублей	МБУ СШ «Сучан»

**Анализ исполнения государственных/муниципальных контрактов (договоров), заключенных в 2023-2025 годах в рамках реализации регионального проекта
"Спорт – норма жизни"**

													рублей										
№ п/п	Наименования с объекта	дата контракта и номер контракта	предмет контракта	НМЦК (начальная (максимальная) цена контракта	Цена гос. Контракта	Снижение НМЦК на торгах по результатам конкурентных процедур	Сведения о поставщике (исполнителе)	Способ размещения заказа	Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта	Реквизиты документа о внесении изменений в контракт, о расторжении контракта	Содержание внесенных в контракт изменений	Срок исполнения контракта		Исполнение контракта (сумма)									
												по контракту	фактически	по контракту	Фактически получено		фактически оплачено заказчиком						
															Сумма	дата, № документа	Дата	сумма	№ документа				
Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты спорта региональной (муниципальной) собственности																							
2023 год																							
Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске	775/П/31/ЭА от 11.04.2023г	Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске, в том числе проектно-изыскательские работы»	390 735 918,00	405 256 140,37	-14 520 222,37	ООО «Гамма-Технология» ИНН 2540104079	Электронный аукцион на проведение работ по строительству и, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ	Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 27.03.2023 №ИЭА1	ДС №1 от 28.04.2023	Присвоение идентификатора ГК, уточнение реквизитов	11.04.2023-30.09.2025						19.05.2023 г.	1 931 639,64	n/n 571312				
									ДС №2 от 10.05.2023	Приведение в соответствие графика оплаты вып. работ (тек.ошибка)							19.05.2023 г.	171 543,13	n/n 572302				
									ДС №3 от 05.10.2023	Цена контракта, цена этапов, срок исполнения этапов, выплата аванса							19.05.2023 г.	1 105 950,12	n/n 572301				
									ДС №4 от 25.12.2023	Цена контракта, цена этапов, срок исполнения этапов, выплата аванса							19.05.2023 г.	944 762,56	n/n 572303				
									ДС №5 от 29.03.2024	Цена контракта							19.05.2023 г.	7 619 449,40	n/n 572305				
									ДС №6 от 25.07.2024	Цена контракта, цена этапов, срок исполнения этапов							19.05.2023 г.	3 600 608,65	n/n 572306				
									ДС №7 от 13.12.2024	Цена контракта, срок выполнения работ							19.05.2023 г.	107 504,80	n/n 572304				
									ДС №8 от 16.01.2025	Цена контракта, срок выполнения работ							19.05.2023 г.	1 538 084,47	n/n 572308				
																	19.05.2023 г.	34 059 500,94	n/n 572310				
																	19.05.2023 г.	1 098 964,42	n/n 572307				
																	19.05.2023 г.	7 071 459,07	n/n 572314				
																	19.05.2023 г.	8 651 315,79	n/n 572309				
																	19.05.2023 г.	4 039 849,87	n/n 572311				
																	19.05.2023 г.	4 830 895,27	n/n 572313				
																	19.05.2023 г.	2 524 949,36	n/n 572316				
																	19.05.2023 г.	6 939 999,03	n/n 572315				
																	19.05.2023 г.	39 033 243,35	n/n 572312				
																	19.05.2023 г.	5 496 642,45	n/n 572318				
																	19.05.2023 г.	12 626 751,60	n/n 572317				
																	19.05.2023 г.	1 402 397,67	n/n 572319				
																	19.05.2023 г.	1 979 112,60	n/n 572320				
																	19.05.2023 г.	489 825,87	n/n 573824				
																	19.05.2023 г.	1 785 331,41	n/n 573823				
																	19.05.2023 г.	533 808,23	n/n 572299				
																	19.05.2023 г.	4 125 126,12	n/n 572298				
																	19.05.2023 г.	14 268 627,82	n/n 572297				
																	19.05.2023 г.	4 032 889,04	n/n 572300				
																	19.05.2023 г.	286 853,85	n/n 572295				
																	19.05.2023 г.	1 903 114,01	n/n 572296				
																	19.05.2023 г.	370 135,65	n/n 572292				
																	19.05.2023 г.	2 240 112,55	n/n 572293				
																	19.05.2023 г.	474 351,97	n/n 572294				
																	372 466,01	372 466,01	Акт выполненных работ 1 от 19.07.2023 г. (этап 2)	26.07.2023 г.	200 922,88	n/n 208988	
																		812 116,94	Корректировочный Акт выполненных работ №4 от 24.11.2023 г (5 этап)	в зачет авансового платежа			
																	16 543 880,08	4 896 182,80	Корректировочный Акт выполненных работ № 2от 24.11.2023 г (5 этап)	01.12.2023 05.12.2023	4 896 182,80	n/n № 342072 n/n № 366239	
																		10 088 506,44	Акт выполненных работ 3 от 19.07.2023 г. (этап 5)	09.10.2023	3 281 173,98	n/n № 778406	
																	2 401 316,06	1 372 093,28	Корректировочный Акт выполненных работ № 4-1,Акт 20.11.2023 г (этап 3)	06.12.2023	266 143,16	n/n № 378951	
																				23.10.2023 г.	1 677 483,67	n/n 12709	

[illegible]

3	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе	775/П/82/ЕП от 28.09.2023 г.	Поставка оборудования для оснащения строящегося объекта капитального строительства "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы" (стелаж, верстак, тиски)	X	44 361,00	X	ООО "А-Технологии" ИНН 2536266373	п.4 ч.1 ст.93	X	X	X	с 15.11.2023 г. по 15.11.2023 г.	02.11.2023г	44 361,00	44 361,00	ТН № BA23227 от 02.11.2023г	20.11.2023 г.	44 361,00	n/n 251093
		775/П/83/ЕП от 28.09.2023 г.	Поставка мезинишного оборудования для оснащения строящегося объекта капитального строительства "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы"	X	600 000,00	X	ООО "Мелтехника-Сервис" ИНН 2721177110	п.4 ч.1 ст.93	X	X	X	с 01.11.2023 г. по 15.11.2023 г.	02.11.2023г	600 000,00	600 000,00	ТН № 293 от 08.11.2023г	24.11.2023 г.	600 000,00	n/n 291163
		775/П/85/ЕП от 28.09.2023 г.	Поставка мебели для оснащения строящегося объекта капитального строительства "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы"	X	438 100,00	X	ООО "Мебельный комбинат ФОМА" ИНН 7901539930	п.4 ч.1 ст.93	X	X	X	с 01.11.2023 г. по 15.11.2023 г.	01.11.2023г	438 100,00	438 100,00	ТН № 907 от 01.11.2023г	21.12.2023 г.	438 100,00	n/n 563704
		775/П/84/ЕП от 28.09.2023 г.	Поставка мебели для оснащения строящегося объекта капитального строительства "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы"	X	193 620,00	X	ООО "Альфа ГАРАНТ" ИНН 9717038484	п.4 ч.1 ст.93	X	X	X	с 01.11.2023 г. по 15.11.2023 г.	31.10.2023г	193 620,00	193 620,00	ТН №14528 от 31.10.2023г	01.12.2023 г.	193 620,00	n/n 339823
		775/П/89/ЕП от 28.09.2023 г.	Поставка оборудования для оснащения строящегося объекта капитального строительства "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы" (холодильник, буфет, марихолодмаш капри)	X	300 000,00	X	ИП Ишечкин Т.А. ИНН 253605537322	п.4 ч.1 ст.93	X	X	X	до 15.11.2023 г.	17.11.2023г	300 000,00	300 000,00	ТН №606 от 17.11.2023г	19.10.2023 г.	90 000,00	n/n 888045
																	19.12.2023 г.	210 000,00	n/n 520625
		775/П/91/ЕП от 18.10.2023 г.	Поставка оборудования для оснащения строящегося объекта капитального строительства "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы" (весы, фен настенный,сексуомер, порционные весы)	X	210 400,00	X	ИП Соинн А.А. ИНН 251116843263	п.4 ч.1 ст.93	X	X	X	до 30.11.2023 г.	20.11.2023г	210 400,00	210 400,00	ТН № 551 от 20.11.2023г	26.10.2023 г.	63 120,00	n/n 40833
																	19.12.2023 г.	147 280,00	n/n 520626
		775/П/90/ЕП от 16.10.2023 г.	поставка офисной мебели для оснащения строящегося объекта капитального строительства - физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе (Стол)	722 470,56	501 600,00	220 870,56	ООО "ПримАФ-мебель" ИНН 2502033846	Запрос котировок в электронной форме	Протокол подведения итогов определения поставщика (подзрядчик).	ДС № 1 от 10.11.2023 г.	Изменение цены контракта	01.11.2023 г. по 28.12.2023 г.	11.12.2023г	501 600,00	501 600,00	ТН № 1 от 11.12.2023г	29.12.2023 г.	501 600,00	n/n 690862
ИТОГО по ГК	Строительство крытого	775/П/94/ЕП от 24.10.2023 г.	поставка металлической мебели для оснащения строящегося объекта капитального строительства - физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе	2 758 653,81	1 459 000,00	1 299 653,81	ООО "ПРОФМЕТТРУ ПП" ИНН 7838109320	Запрос котировок в электронной форме	Протокол подведения итогов определения поставщика (подзрядчик).	X	X	01.11.2023 г. по 28.12.2023 г.	15.01.2024г	1 459 000,00	1 459 000,00	Акц№ 4 от 15.01.2024г	11.03.2024	1 459 000,00	n/n № 246001
		775/5/104/ЕП от 10.11.2023 г.	Поставка мебели для оснащения строящегося объекта капитального строительства "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы"	X	29 400,00	X	ООО "ПримАФ-мебель" ИНН 2502033846	п.4 ч.1 ст.93	X	X	X	27.11.2023 г. по 20.12.2023 г.	11.12.2023г	29 400,00	29 400,00	ТН № 910 от 11.12.2023г	26.12.2023 г.	29 400,00	n/n 623841
		ИТОГО по ГК			4 442 481,00	1 520 524,37								4 442 481,00	4 442 481,00			3 580 241,00	
		775/Р/33/ЕП от 11.04.2023г	Корректировка проектной документации разделов	561 884,40	594 320,40	-32 436,00	ООО "СМУ-125" ИНН 2536323279	п.4 ч.1 ст.93	X	ДС №1 от 20.07.20233 ДС№2 от 04.08.2023 ДС №3 от18.08.2023 ДС №4 от 20.07.20233	ДС №1-Цена контракта ДС №2-ТЗ на корректировку ПД ДС №3-ТЗ на корректировку ПД ДС №4-ТЗ на	от 11.04.2023 в течение 30 дней (не включая времени прохождения гос. экспертизы)	Обязательства а по контракту подрядчиком не исполнены, срок действия контракта истек, в связи с этим оплата не произведена.	594 320,40	Обязательства по контракту подрядчиком не исполнены, срок действия контракта истек, в связи с этим оплата не произведена.				
				565 060,80	594 740,40	-29 679,60	ООО "СМУ-125" ИНН 2536323279	п.4 ч.1 ст.93	X	ДС №1 от 20.07.20233 ДС№2 от 28.07.2023 ДС №3 от18.08.2023 ДС №4 от	ДС №1-Цена контракта ДС №2-особые требования с ПД ДС №3-ТЗ на корректировку ПД ДС №4-ТЗ на	от 11.04.2023 в течение 30 дней (не включая времени прохождения гос. экспертизы)		594 740,40					

4	тренировочного катка в г. Находка	775/Р/30/ЕП от 10.04.2023г	Подрядные работы по подготовке ПД по объекту капитального строительства: "Строительство крытого тренировочного катка в г. Находка, софинансируемого за счет федерального бюджета"	X	271 206,00	X	ООО "ЛОТОС-ТУР-проект" ИНН 2508078378	п.4 ч.1 ст.93	X	X	X	от 10.04.2023 (35 раб.дн.) до 31.05.2023 г.	01.06.2023 г.	271 206,00	271 206,00	ТН № 1 от 01.06.2023	п/п 830196	271 206,00	21.06.2023 г.
		18/23 эк 775/У/41/ЕП от 02.05.2023	Проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения в соответствии с ч.3.11 ст.49 Гражданского РФ в отношении объекта капитального строительства "Строительство крытого тренировочного катка в г. Находка, в том числе проектно-изыскательские работы"	X	192 757,38	X	КГАУ "Примгосэксперт иза" ИНН 2540185328	п.4 ч.1 ст.93	X	X	X	от 16.05.2023- один календ.год (247 раб.дн)	15.05.2024г	192 757,38	192757,38	0000-002425 от 28.12.23	п/п 504857	192 757,38	15.05.2023 г.
ИТОГО по ГК					1 653 024,18									1 653 024,18	463 963,38			463 963,38	
5	Строительство ледового катка в пгт. Кавалерово	775/Р/34/ЕП от 11.04.2023	Корректировка проектной документации по объекту: "Ледовый каток с размером поля 60*30м в пгт. Кавалерово, Кавалеровского района Приморского края" в рамках реализации мероприятия "Строительство ледового катка в пгт. Кавалерово"	X	575 137,20	X	ООО "СМУ-125" ИНН 2536323279	п.4 ч.1 ст.93	X	Односторонний отказ Заказчика от исполнения ГК от 24.05.2024 №01-03-04/1368	Нарушение сроков выполнения работ Подрядником	РД 45 дней с момента заключения ГК ПД 25 дней с момента утв.ПД		575 137,20	Односторонний отказ Заказчика от исполнения ГК от 24.05.2024 №01-03-04/1368				
		19/23 эк 775/У/42/ЕП от 02.05.2023г	Проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения в соответствии с ч.3.11 ст.49 Гражданского РФ в отношении объекта капитального строительства: "Ледовый каток с размером поля 60*30м в пгт. Кавалерово, Кавалеровского района Приморского края"	X	264 231,01	X	КГАУ "Примгосэксперт иза" ИНН 2540185328	п.4 ч.1 ст.93	X	Соглашение о расторжении от 13.05.2024г	X	Начало: раб. день следующий за оплатой 100% ав. платежа- один календ.год (247 раб.дн)		264 231,01	Соглашение о расторжении от 13.05.2024г				
ИТОГО по ГК					839 368,21									0,00	0,00			0,00	
2024																			
6	Строительство ледового катка в пгт. Кавалерово	775/П/14/ЭА/2024 от 18.03.2024 г	Поставка и монтаж комплекта хоккейного борта для строящегося объекта капитального строительства – ледового катка в пгт. Кавалерово	12 632 666,67	8 148 070,21	4 484 596,46	ИП Азбу Валерий Васильевич ИНН 312315256702	Электронный аукцион	Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 05.03.2024 №ИЭА1	X	X	с 18.03.2024 до 15.07.2024 г							
7	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе	775/П/52/ЕП/2024 от 10.07.2024	Поставка витрины кондитерской для оснащения строящегося объекта капитального строительства "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы"	X	185 200,00	X	ИП Иличкин Т.А. ИНН 253605537322	п.4 ч.1 ст.93	X	ДС №1 от 18.07.2024	Уточнение ИКЗ	с 10.07.2024 в течение 60 календарных дней	24.09.2024г	185 200,00	185 200,00	ТН № 1175 от 24.09.2024	01.10.2024	185 200,00	п/п № 86722
ИТОГО по ГК					8 333 270,21	4 484 596,46								185 200,00	185 200,00			185 200,00	

Информация по объекту капитального строительства: "Строительство крытого футбольного манежа в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы" ГК № 775/Р/29/ЭА от 07.04.2023 г. с ООО "Техпроматлант"															
Наименование	2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		Итого		Примечание
	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	
ФБ+КБ	X	X	X	X	360 027 142,98	0,00	1 307 654,37	4 517 900,70	X	X	X	X	361 334 797,35	4 517 900,70	11.11.2024 в адрес учреждения произведена оплата по требованию об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии в размере 21 102 305,86 руб. (и/л №785518). Заказчик 22.01.2025 г. обратился в Арбитражный суд Приморского края с иском о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами, а также, взыскание процентов за период с 22 января 2025 г. Решением АС ПК от 18.08.2025 г. исковые требования Учреждения удовлетворены в полном объеме, а именно: взыскать с ООО «ТехПромАтлант» в пользу КГКУ «УКС Приморского края» неосновательное обогащение в размере 335 814 590,79 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 05.08.2025 г. в размере 54 099 883,92 руб. 19.09.2025 Учреждением получен исполнительный лист, 25.11.2025 направлен в Управление ФССП по Приморскому краю. 26.11.2025 г. возбуждено исполнительное производство. Субъектом ПК 07.10.2025г. осуществлен возврат средств в федеральный бюджет в размере 354 108 101,28 руб.
ФБ	X	X	X	X	352 826 600,00		1 281 501,28		X	X	X	X	354 108 101,28		
КБ	X	X	X	X	7 200 542,98		26 153,09		X	X	X	X	7 226 696,07		
КБ	X	X	X	X	0,00		0,00		X	X	X	X	0,00		
Итого	X	X	X	X	360 027 142,98	0,00	1 307 654,37	4 517 900,70	X	X	X	X	361 334 797,35	4 517 900,70	
Информация по объекту капитального строительства: "Строительство ледового катка в г. Находка" ГК № 21/П-07-2021-ГК от 02.08.2021 г. с ООО "Техпроматлант"															
Наименование	2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		Итого		Примечание
	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	
ФБ+КБ	100 143 207,37	2 254 011,60	281 107 088,82	70 585 476,41	13 518 319,04	229 877 019,22	565 102,04	239 764 573,31	X	X	X	X	395 333 717,27	395 333 717,27	Согласно п.5.10 контракта оплата за фактические работы СМР производится Заказчиком, уменьшением пропорционально стоимости выплаченного авансового платежа на 3 %, формирующий запас средств окончательного расчета. Вместе с тем в соответствии с п. 8.15 контракта установлена обязанность подрядчика предоставить обеспечение исполнения гарантийных обязательств. Данное обеспечение подрядчиком не предоставлено. Таким образом обязательства подрядчиком в части предоставления гарантийных обязательств не выполнены. Ввиду невыполненного окончательный расчет не произведен.
ФБ	98 140 343,22		275 484 947,04		13 247 952,66		553 800,00		X	X	X	X	387 427 042,92	387 427 042,92	
КБ	2 002 864,15		5 622 141,78		270 366,38		11 302,04		X	X	X	X	7 906 674,35	7 906 674,35	
КБ	0,00		0,00		0,00		143 859 595,95		X	X	X	X	143 859 595,95	147 147 363,27	
Итого	100 143 207,37	2 254 011,60	281 107 088,82	70 585 476,41	13 518 319,04	229 877 019,22	144 424 697,99	239 764 573,31	X	X	X	X	539 193 313,22	542 481 080,54	
Информация по объекту капитального строительства: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы, софинансируемые за счет средств федерального бюджета" ГК № 28/Р-06-2022-ГК от 28.03.2022 г. с ООО ДВСК "СТРОЙГРАД"															
Наименование	2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		Итого		Примечание
	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	
ФБ+КБ	X	X	226 704 183,67	129 014 989,08	67 952 225,91	128 189 498,87	20 190 761,41	108 881 799,36	509 518,07	72 056 594,73	0,00	0,00	315 356 689,06	315 356 689,06	Финансирование соответствует стоимости ГК
ФБ	X	X	222 170 100,00		66 593 181,39		19 786 946,17		422 900,00		0,00		308 973 127,56	308 973 127,57	
КБ	X	X	4 534 083,67		1 359 044,52		403 815,24		86 618,07		0,00		6 383 561,50	6 383 561,49	
КБ	X	X	69 300 520,41		0,00		13 670 419,55		29 164 655,89		10 650 597,13		122 786 192,98	122 786 192,98	
Итого	X	X	296 004 704,08	129 014 989,08	67 952 225,91	128 189 498,87	33 861 180,96	108 881 799,36	29 674 173,96	72 056 594,73	10 650 597,13	0,00	438 142 882,04	438 142 882,04	
Информация по объекту капитального строительства: "Строительство ледового катка в пгт Кавалерово"															
ГК № 09/Р-07-2021-ГК 30.06.2021 с ООО "Техпроматлант"															
Наименование	2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		Итого		Примечание
	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	
ФБ+КБ	65 096 257,59	4 824 094,01	301 816 327,00	52 206 530,37	0,00	61 187 355,68	0,00		X	X	X	X	366 912 584,59	118 217 980,06	23.12.2024 КГКУ «УКС Приморского края» подано исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. 03.04.2025г. Арбитражным судом Приморского края удовлетворено исковое заявление КГКУ «УСК ПК» к ООО «ТехПромАтлант» о взыскании неосновательного обогащения в размере 287 626 135,94 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 27 012 893,32 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами начисленными на сумму долга за период с 04.04.2025г. по день фактического исполнения обязательства размере (Дело №А51-24220/2024). Постановлением пятого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2025г. Решение арбитражного суда Приморского края оставлено в силе. 25.11.2025г. Исполнительный лист номер 051212064 направлен в Главное межрегиональное (специализированное) управление Федеральной службы судебных приставов СОСП по Приморскому краю ГМУ ФССП России. 26.11.2025 судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства №493550/25/98025-ИП. В настоящее время на запросы КГКУ «УКС Приморского края» поступают отчеты от судебных приставов об отсутствии у должника какого либо имущества и счетов, никаких поступлений в адрес КГКУ «УКС Приморского края» «не поступало
ФБ	63 794 332,44		295 780 000,00		0,00		0,00		X	X	X	X	359 574 332,44	115 853 620,46	
КБ	1 301 925,15		6 036 327,00		0,00		0,00		X	X	X	X	7 338 252,15	2 364 359,60	
КБ	0,00		23 643 197,70		15 288 333,71				X	X	X	X	38931531,41	0	
Итого	65 096 257,59	0,00	325 459 524,70	0,00	15 288 333,71	61 187 355,68	0,00	0,00	X	X	X	X	405 844 116,00	118 217 980,06	
ГК № 775/Р/48/ЭА/2025 от 24.04.2025 г. с ООО "СУ 117"															
Наименование	2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		Итого		Примечание
	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	
ФБ+КБ	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	70 117 337,90	0,00		0,00		
ФБ	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00		0,00		0,00		
КБ	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00		0,00		0,00		
КБ	X	X	X	X	X	X	X	X	58 410 616,41		11 760 696,85		70 171 313,26	70 117 337,90	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	58 410 616,41	70 117 337,90	11 760 696,85	0,00	70 171 313,26	70 117 337,90	

Информация по объекту капитального строительства: "Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнеморске, в том числе проектно-изыскательские работы" ГК № 775/Р/31/ЭА от 11.04.2023 г. с ООО "Гамма-Технология"															
Наименование	2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		Итого		Примечание
	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	Финансирование	Принятое выполнение	
ФБ+КБ	X	X	X	X	0,00	17 541 365,47	0,00	153 478 787,21	0,00	18 961 763,79	0,00	0,00	0,00		В настоящее время проводятся мероприятия по подготовке дополнительного соглашения на основании распоряжения ПК, в связи с увеличением стоимости ГК и увеличению сроков выполнения работ
ФБ	X	X	X	X	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
КБ	X	X	X	X	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
КБ	X	X	X	X	193 441 222,83		66 705 315,09		15 517 127,96		0,00		275 663 665,88	189 981 916,47	
Итого	X	X	X	X	193 441 222,83	17 541 365,47	66 705 315,09	153 478 787,21	15 517 127,96	18 961 763,79	0,00	0,00	275 663 665,88	189 981 916,47	
